


**“Realizzazione di un’attrezzatura di interesse comune destinata a polo multifunzionale di eccellenza per l’alta formazione specialistica, i servizi al lavoro e le iniziative per i giovani” nel complesso immobiliare denominato Istituto *San Giovanni Battista De La Salle***

Via San Giovanni Battista de la Salle n°1

Sezione AVV, foglio 7, particella 247, zona censuaria 7B, categoria B/1, classe U

Quartiere Materdei, Napoli

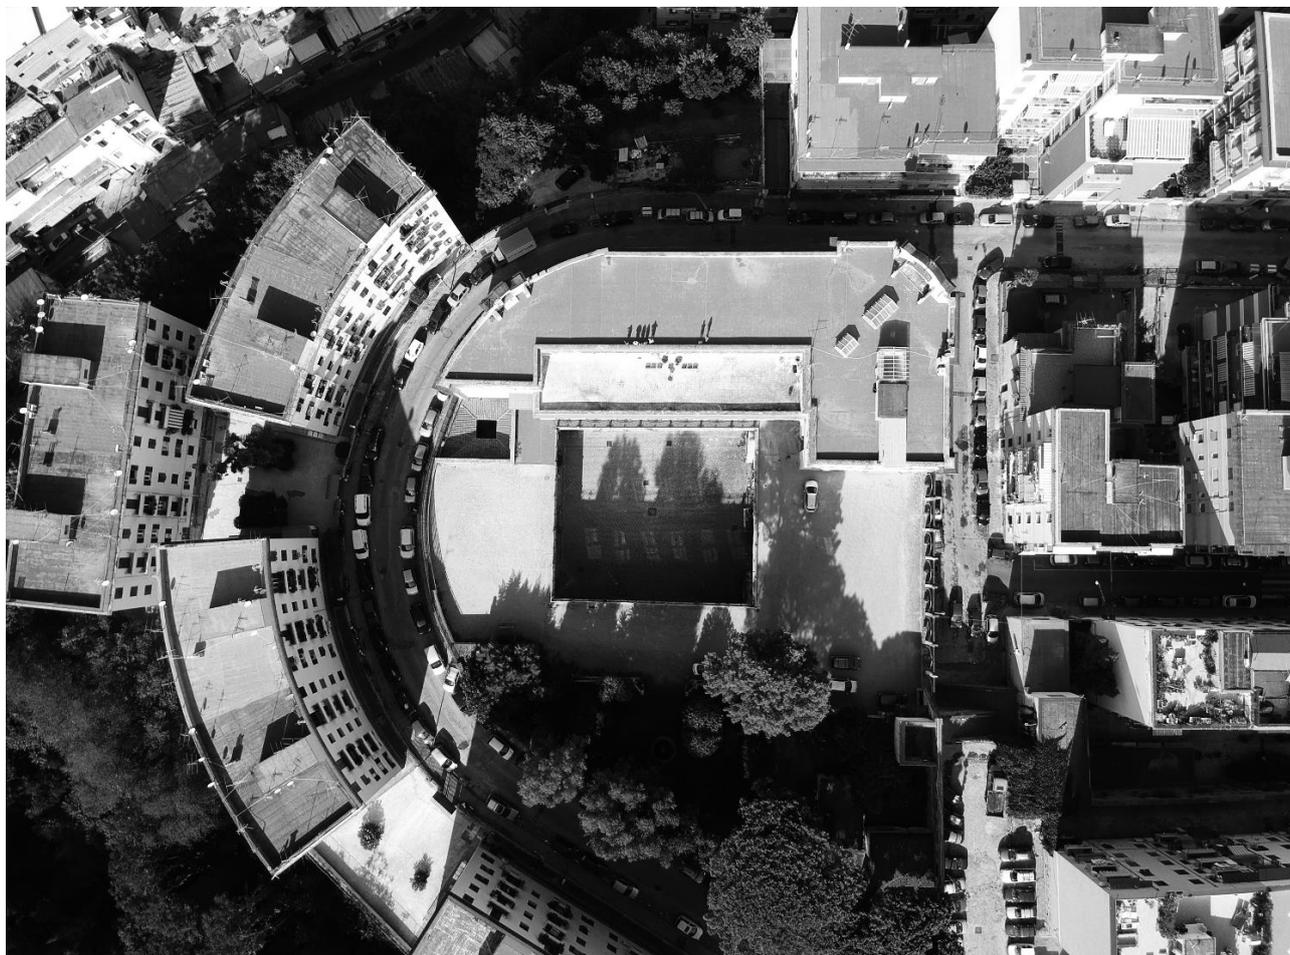

**[DLS\_E\_SIC\_TP\_004]\_ TABELLA DI PIANIFICAZIONE PSC**

**REV 01 – Riscontro verbale intermedio di verifica**

Progetto esecutivo

**Ing. Antonio Salza**



**Committente**

**Generazione Vincente S.p.A.**

*Agenzia per il lavoro*

Centro Direzionale di Napoli Isola

E7 80143 Napoli

**Progettazione e Coordinamento delle attività specialistiche**

**Architetto Giuseppe Vele**

Collaboratori:

Ludovica Reed, Cecilia Polcari, Antonella Guerriero Via

Giulio Cesare 101 - Napoli

Via Pironti 1/A - Avellino

## 15. Durata delle lavorazioni e calcolo dell'entità presunta del cantiere

FASE LAVORATIVA	DAL GIORNO	DURATA GG.	NUM. GG. LAV.	NUM. UOMINI	TOT. UOMINI
Opere provvisionali	1	12	10	15	150
Demolizioni, rimozioni, trasporti e smaltimento	11	43	31	15	465
Interventi strutturali locali	25	39	27	8	216
Partizione interne	40	33	23	10	230
Impianto idrico sanitario e di scarico	44	14	10	10	100
Impianto elettrico	50	57	40	10	400
Impianto termico	60	85	60	10	600
Impianto antincendio	60	85	60	10	600
Impianto ascensore	260	28	20	10	200
Impianto di videosorveglianza	110	26	20	10	200
Impianti dati ced	110	26	20	10	200
Opere in ferro	45	7	5	8	40
Massetti e pavimenti	180	157	110	10	1100
Intonaci	180	157	110	10	1100
Controsoffitti	320	43	30	10	300
Infissi esterni	330	18	12	10	120
Tinteggiature	330	22	15	10	150
Infissi interni	340	29	20	10	200
Opere a verde	358	2	2	10	20
Impianto idrico sanitario e di scarico	290	71	50	10	500
Impianto elettrico	290	71	50	10	500
Impianto termico	290	71	50	10	500
Impianto antincendio	290	71	50	10	500
Impianto ascensore	290	71	50	10	500
Impianto di videosorveglianza	290	71	50	10	500
Impianti dati ced	290	71	50	10	500
<b>TOTALE UOMINI-GIORNI:</b>			<b>975</b>		<b>9891</b>

### CANTIERE

FASE LAVORATIVA	DAL GIORNO	DURATA GG.	NUM. GG. LAV.	NUM. UOMINI	TOT. UOMINI
Opere provvisionali	1	12	10	15	150
Demolizioni, rimozioni, trasporti e smaltimento	11	43	31	15	465
Interventi strutturali locali	25	39	27	8	216
Partizione interne	40	33	23	10	230
Impianto idrico sanitario e di scarico	44	14	10	10	100
Impianto elettrico	50	57	40	10	400
Impianto termico	60	85	60	10	600
Impianto antincendio	60	85	60	10	600
Impianto ascensore	260	28	20	10	200
Impianto di videosorveglianza	110	26	20	10	200

## 15. Durata delle lavorazioni e calcolo dell'entità presunta del cant... (segue)

FASE LAVORATIVA	DAL GIORNO	DURATA GG.	NUM. GG. LAV.	NUM. UOMINI	TOT. UOMINI
Impianti dati ced	110	26	20	10	200
Opere in ferro	45	7	5	8	40
Massetti e pavimenti	180	157	110	10	1100
Intonaci	180	157	110	10	1100
Controsoffitti	320	43	30	10	300
Infissi esterni	330	18	12	10	120
Tinteggiature	330	22	15	10	150
Infissi interni	340	29	20	10	200
Opere a verde	358	2	2	10	20
Impianto idrico sanitario e di scarico	290	71	50	10	500
Impianto elettrico	290	71	50	10	500
Impianto termico	290	71	50	10	500
Impianto antincendio	290	71	50	10	500
Impianto ascensore	290	71	50	10	500
Impianto di videosorveglianza	290	71	50	10	500
Impianti dati ced	290	71	50	10	500
TOTALE UOMINI-GIORNI:			975		9891
