




LINEA 6 – METROPOLITANA DI NAPOLI

				(PRIMA EMISSIONE) OTTOBRE 2017	OTT-17		
Albinati	De Risi	Manferlotti	Di Luccio				
REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	AUTORIZZATO	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV	

Ansaldo STS A Hitachi Group Company CONCESSIONARIA				 COMUNE DI NAPOLI CONCEDENTE				<table border="1"> <tr> <td colspan="2">PROG</td><td colspan="2">IMP</td><td colspan="4">NUMERO</td></tr> <tr> <td>L</td><td>M</td><td>6</td><td>7</td><td>F</td><td>X</td><td>2</td><td>D</td><td>E</td><td>7</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="4">CODICE PRODOTTO</td><td colspan="2">AREA</td><td colspan="2">TIPO</td><td colspan="3">FASE</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>D</td><td></td><td></td><td>E</td><td>S</td></tr> </table>				PROG		IMP		NUMERO				L	M	6	7	F	X	2	D	E	7	0	CODICE PRODOTTO				AREA		TIPO		FASE								2	D			E	S
PROG		IMP		NUMERO																																																
L	M	6	7	F	X	2	D	E	7	0																																										
CODICE PRODOTTO				AREA		TIPO		FASE																																												
					2	D			E	S																																										

A termini di legge è rigorosamente vietato riprodurre e comunicare a terzi il contenuto del presente documento	TITOLO DOCUMENTO: LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI PROGETTO ESECUTIVO OPERE CIVILI – MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO REPORT DELLE MISURE – STAZIONE MUNICIPIO									
	EMITTENTE  METROPOLITANA DI NAPOLI S.p.A. RESPONSABILE PROGETTAZIONE OPERE CIVILI					CODICE ENTE 				
						Monitoraggio delle gallerie e prove di laboratorio per la qualifica dei materiali e loro controllo Monitoraggio opere civili e monitoraggio ambientale				
						FORMATO A4		SCALA /		FOGLIO 1 DI 53

INDICE

1.PREMESSA	3
2.DATI GENERALI	4
3.STRUMENTAZIONE ESTERNA INSTALLATA	5
4.PLANIMETRIA STRUMENTAZIONE MONITORAGGIO	6
5. PLANIMETRIA E SEZIONI ANDAMENTO TETTO DEL TUFO	8
6.FASI LAVORATIVE	10
7.MISURE GEOTECNICHE-ESTENSIMETRICHE	12
8.MISURE GEOTECNICHE-INCLINOMETRICHE	20
9. MISURE GEOTECNICHE-PIEZOMETRICHE	31
10. MISURE TOPOGRAFICHE-CAPISALDI	48
ALLEGATO 1 – MANUTENZIONE	51

Ansaldo STS A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO <i>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</i> <i>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE MUNICIPIO</i>	LM6 7FX 2D E 70 Data: 27/10/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	--	---

1. PREMESSA

Nell'ambito della realizzazione della nuova Metropolitana di Napoli (**Linea 6, tratta Mergellina - Municipio**) è prevista una rete di monitoraggio e controllo finalizzata alla periodica registrazione delle grandezze fisiche di maggiore interesse e agli effetti legati alle attività di cantiere.

In generale, per le stazioni il sistema di monitoraggio prevede i seguenti strumenti:

- Capisaldi di livellazione, posti sul terreno e sui marciapiedi degli edifici adiacenti il pozzo di stazione;
- Staffe livellometriche, poste sugli edifici adiacenti il pozzo di stazione;
- Piezometri Casagrande o a tubo aperto, realizzati in prossimità delle paratie del pozzo di stazione;
- Piezometri elettrici, realizzati all'interno del pozzo di stazione;
- Inclinatori ed estenso-inclinatori, realizzati in prossimità delle paratie del pozzo di stazione;
- Inclinatori, realizzati nelle paratie perimetrali del pozzo di stazione;
- Mire ottiche, poste sulle paratie all'interno del pozzo di stazione
- Celle di carico, disposte sui puntoni metallici di contrasto;
- Barrette estensimetriche, disposte sui puntoni metallici di contrasto e/o all'interno delle paratie perimetrali del pozzo di stazione.

Ansaldo STS A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO <i>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</i> <i>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE MUNICIPIO</i>	LM6 7FX 2D E 70 Data: 27/10/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	--	---

L'installazione di tale strumentazione impiegata lungo le aree di cantiere (stazione Chiaia, S. Pasquale, Arco Mirelli e Municipio) risulta completa all'interno ed all'esterno dei pozzi di stazione; diversamente, quella relativa alla Galleria di linea è ad oggi in fase d'installazione.

Di seguito saranno restituiti i grafici frutto delle letture svolte nel cantiere, relativi alla sola strumentazione esterna:

- Inclinatori, Estensimetri, Piezometri, acquisizione elaborazione restituzione dati competenza Tre Esse.
- Staffe di livellazione, Capialdi acquisizione competenza ATI, elaborazione restituzione dati competenza Tre Esse.

2. DATI GENERALI

Commessa: Linea 6 – Metropolitana Di Napoli

Impresa esecutrice: Metrotec S.c.a.r.l.

Monitoraggio: Tre Esse Engineering S.r.l.

Ansaldo STS A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO <i>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</i> <i>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE MUNICIPIO</i>	LM6 7FX 2D E 70 Data: 27/10/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	--	---

3. STRUMENTAZIONE ESTERNA INSTALLATA

La nomenclatura della strumentazione di monitoraggio ha subito una variazione, necessaria per rendere uniforme ed univoco il nome di ogni strumento installato lungo tutta la tratta.

Esempio:

MU_ES2; **MU_STL01_1**

la prima serie di simboli identifica la stazione di monitoraggio in questo caso Municipio,

la seconda è identificativa dello strumento,

la terza solo per staffe e capisaldi corrisponde al numero civico del fabbricato presso cui sono stati installati.

Elenco strumentazione installata e funzionante.

- n°4 Estenso-inclinometri MU_ES1, MU_ES2, MU_ES3, MU_ES4
- n°4 Inclinometri MU_EI1, MU_EI2, MU_EI3, MU_EI4
- n°6 Piezometri MU_PZ1, MU_PZ2, MU_PZ3, MU_PZ4,
MU_PZ5, MU_PZ6
- n°28 Capisaldi MU_CS01-28

Ansaldo STS A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO <i>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</i> <i>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE MUNICIPIO</i>	LM6 7FX 2D E 70 Data: 27/10/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	--	---

4. PLANIMETRIA STRUMENTAZIONE MONITORAGGIO

Nella figura successiva viene rappresentata la planimetria del cantiere e la disposizione degli strumenti previsti per il monitoraggio topografico e geotecnico, installati esternamente al pozzo stazione.

Inoltre vengono indicati i nuovi nomi degli strumenti, la nuova nomenclatura risulta necessaria per poter uniformare l'intera Linea 6. Di seguito nelle tabelle riepilogative strumentazione verranno messi a confronto vecchi e nuovi nomi, per rendere più semplice l'adozione del nuovo sistema.

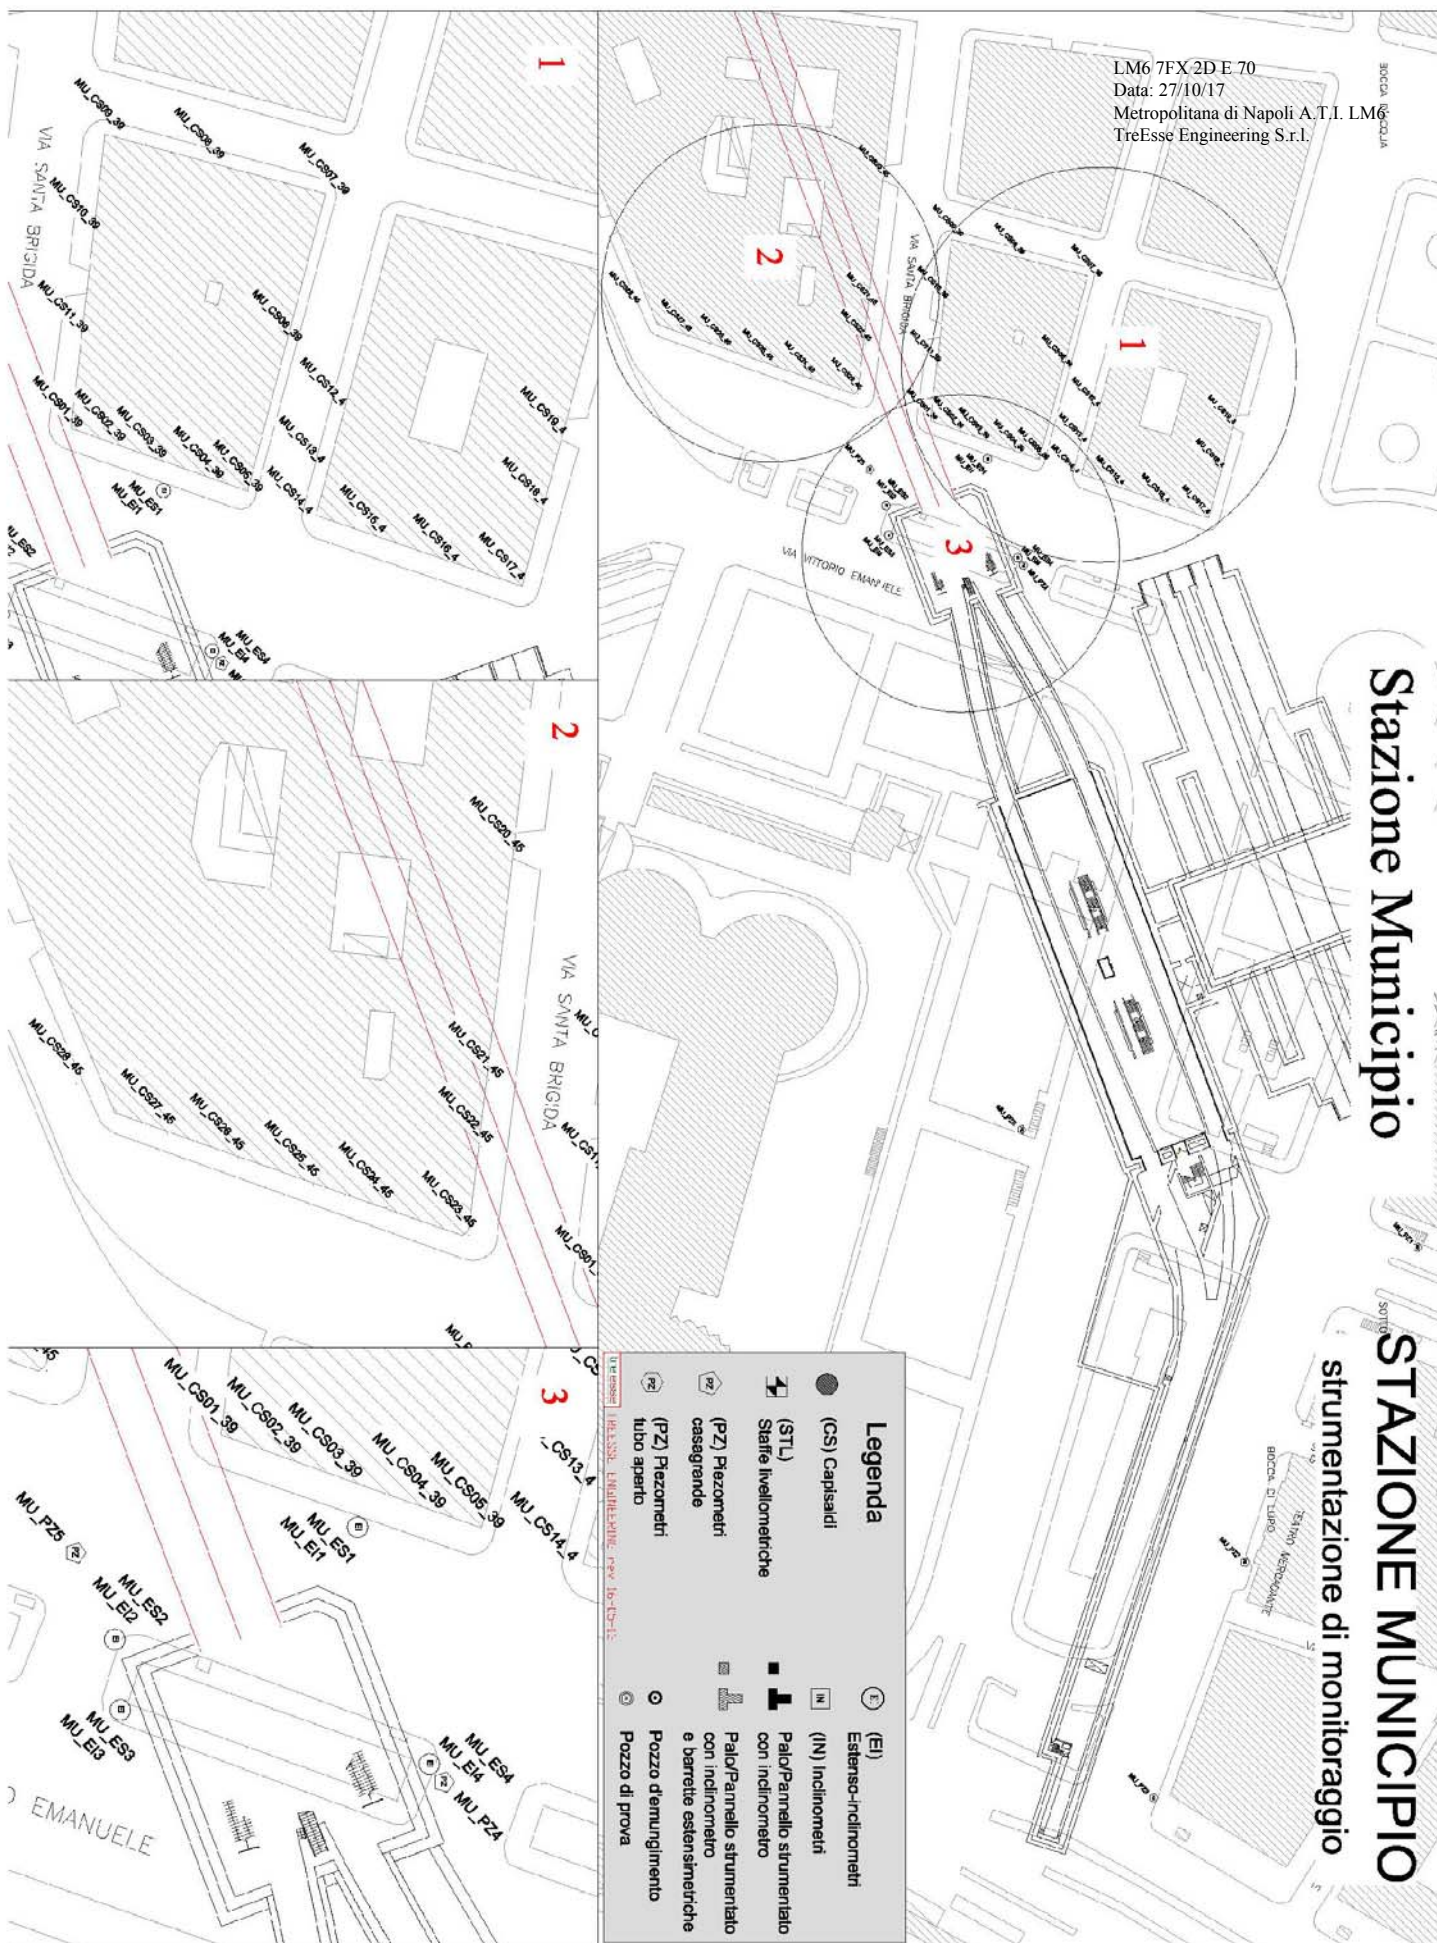


Figura 4.1.: Planimetria pozzo stazione, raffigurante la disposizione della strumentazione di monitoraggio topografico e geotecnico esterna.

Ansaldo STS A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO <i>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</i> <i>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE MUNICIPIO</i>	LM6 7FX 2D E 70 Data: 27/10/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	--	---

5. PLANIMETRIA E SEZIONI ANDAMENTO TETTO DEL TUFO

Nella figura 5.1 viene rappresentato l'andamento del tetto del Tufo con uno stralcio tratto dalla Relazione Geologica Progetto Esecutivo (cod. doc.:LM67FX00014_01 – ANNO 2010).

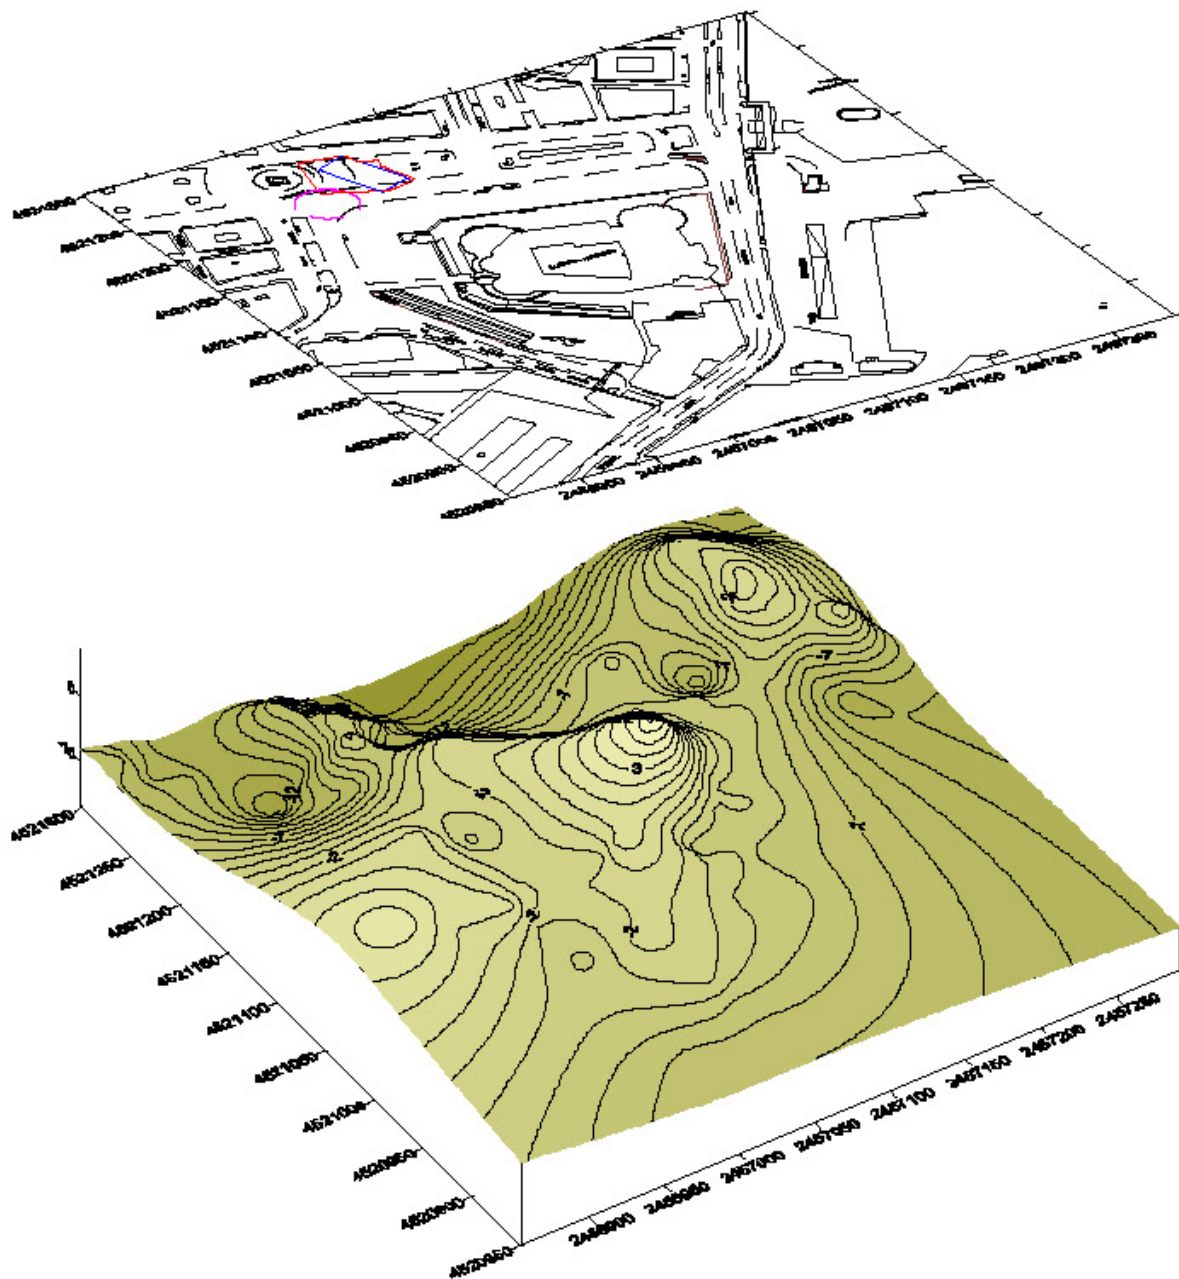


Figura 5.1.: Andamento del tetto del Tufo - Stralcio della Relazione Geologica Progetto Esecutivo (cod. doc.: LM67FX200014 – ANNO 2010).

Ansaldo STS A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO <i>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</i> <i>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE MUNICIPIO</i>	LM6 7FX 2D E 70 Data: 27/10/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	--	---

6.FASI LAVORATIVE

Nel presente capitolo vengono esposte le principali lavorazioni in svolgimento nel cantiere di Municipio (Metropolitana di Napoli - Linea 6).

Le indicazioni riportate, aggiornate al periodo di riferimento del presente report, sono frutto sia delle osservazioni in sito dei tecnici Tre Esse sia delle informazioni comunicateci dall'Impresa Esecutrice.

Nella planimetria realizzata dalla Scrivente, di seguito riportata, è stata individuata e stimata qualitativamente l'area interessata dalle lavorazioni ritenute significative ai fini del monitoraggio.

La strumentazione geotecnica presente in cantiere come mostrato in planimetria è la seguente:

- tubi estenso-inclinometrici MU_EI1/ES1, MU_EI2/ES2, MU_EI3/ES3, MU_EI4/ES, tubi piezometrici (a tubo aperto) MU_PZ1, MU_PZ2, MU_PZ3, MU_PZ4.

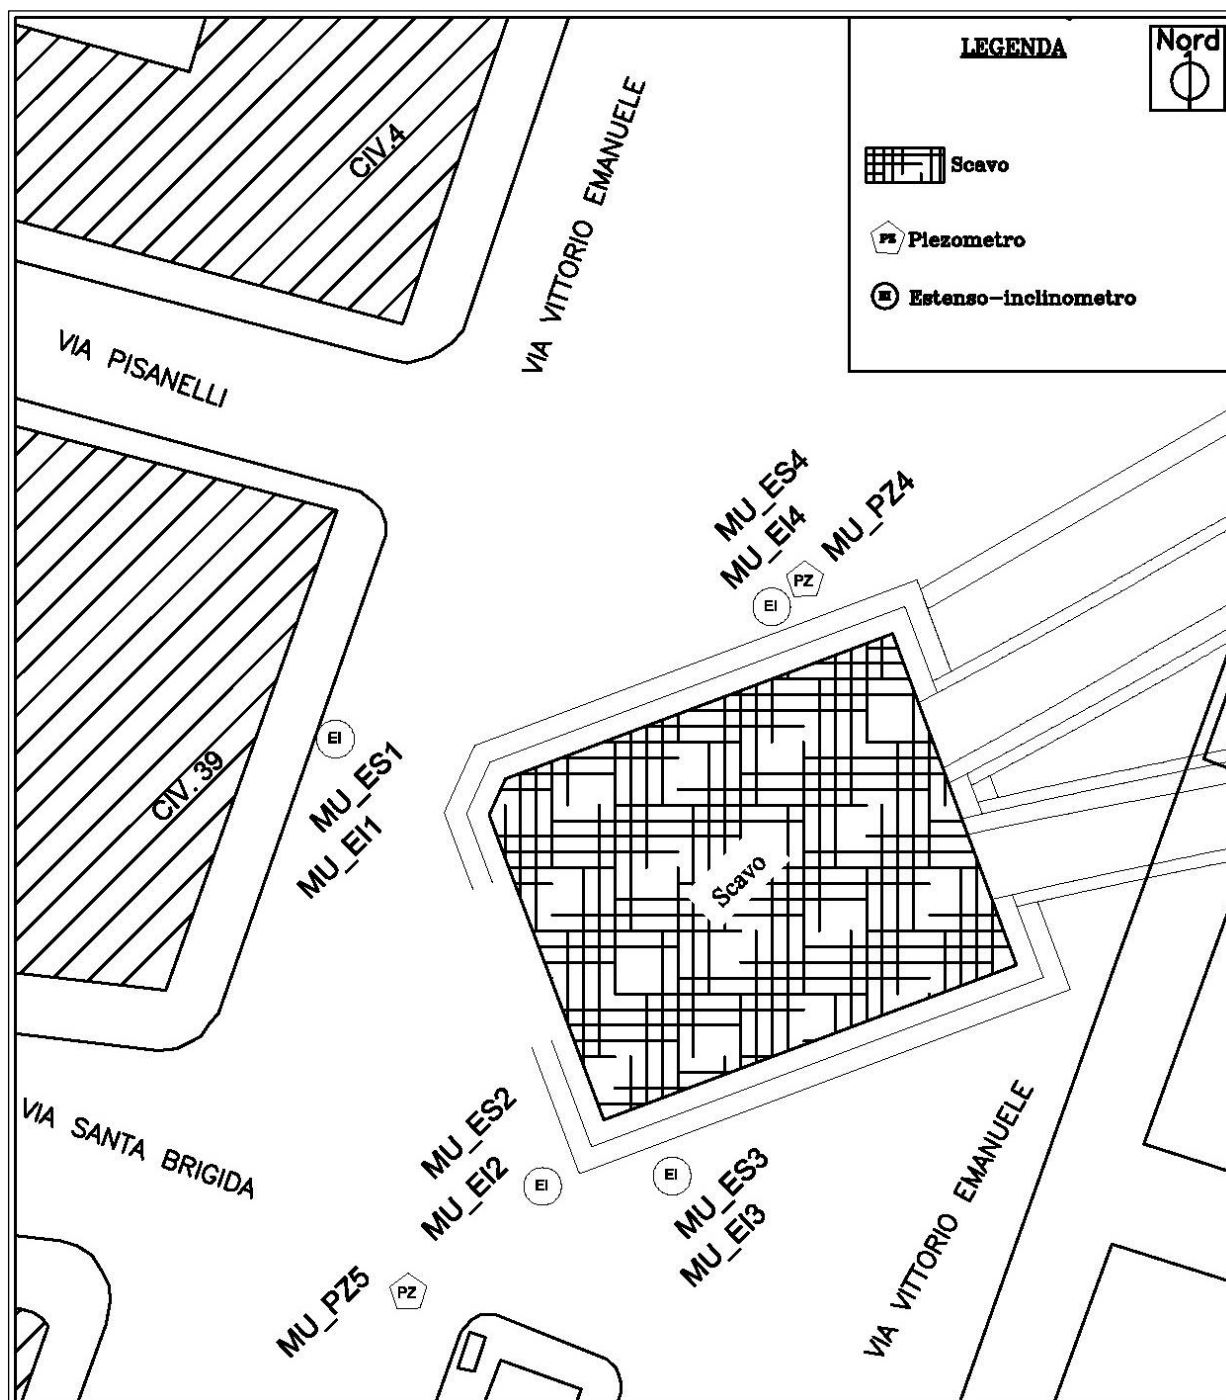


Figura 6.1.: Planimetria pozzo estrazione TBM.

Ansaldo STS A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO <i>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</i> <i>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE MUNICIPIO</i>	LM6 7FX 2D E 70 Data: 27/10/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	---	---

7.MISURE GEOTECNICHE – ESTENSIMETRICHE

Gli estensimetri consentono di misurare i movimenti dell'ammasso lungo l'asse z. La misura si effettua rilevando la distanza fra anelli magnetici montati originariamente ad 1m di distanza l'uno dall'altro, su tubi "tipo inclinometrico", la variazione della loro distanza verrà registrata tramite un sistema composto da sonda e centralina estensimetrica.


Tabella riepilogativa per gli estensimetri installati in cantiere

NOME NUOVO	TIPOLOGIA STRUMENTO	DATA INSTALLAZIONE	DISPONIBILITA' LETTURA			NOTE
			DATA LETTURA DI ZERO	PERIODO INTERRUZIONE	DATA FINE ATTIVITA'	
MU_ES1	ESTENSIMETRO	24/03/11	07/04/11			
MU_ES2	ESTENSIMETRO	15/03/11	07/04/11	21/05/15		(*)
MU_ES3	ESTENSIMETRO	17/03/11	07/04/11	21/05/15		(*)
MU_ES4	ESTENSIMETRO	12/03/11	07/04/11	21/05/15		(*)

(*) Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure disponibili da consegnare.

Estenso-inclinometro

MU_ES1

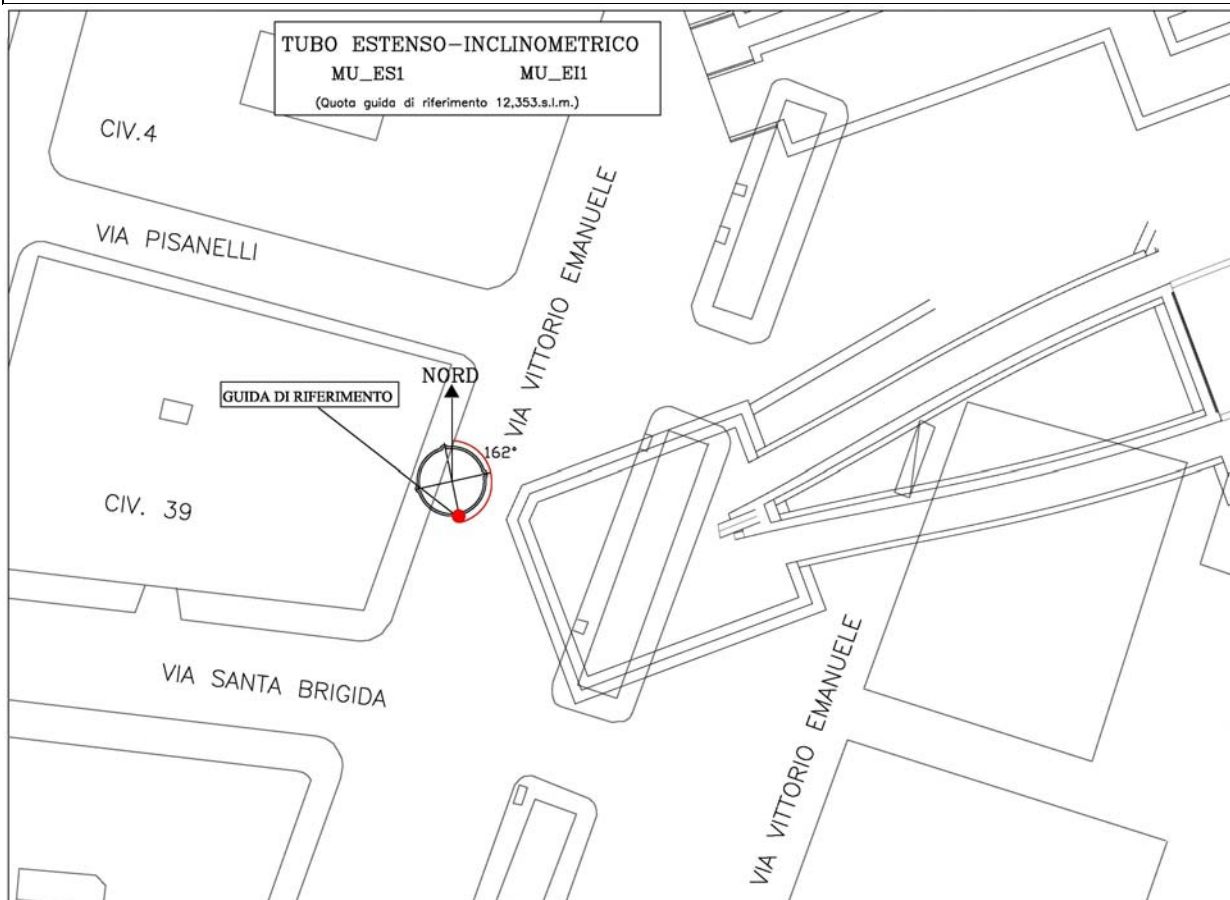

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X

Congruenza progettuale

C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza

NOTE

Ansaldo STS A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO REPORT DELLE MISURE STAZIONE MUNICIPIO	LM6 7FX 2D E 70 Data: 27/10/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	--	---



Ubicazione	STAZIONE MUNICIPIO		
Opera	Tubo estensimetrico	Ultima misura	In data
Nome tubo	MU_ES1	126	10/10/17 12.30
Data posa in opera	24/03/2011		
Data lettura di zero	07/04/2011		

TABULATI (I)

QUOTA ASSOLUTA (m)	Spostamenti differenziali locali (mm/m)					Spostamenti differenziali integrali (mm)				
	N. LETTURA					N. LETTURA				
	117	118	119	120	121	117	118	119	120	121
	16/5/17 10.00	16/6/17 12.00	22/6/17 10.30	27/6/17 10.00	4/7/17 12.00	16/5/17 10.00	16/6/17 12.00	22/6/17 10.30	27/6/17 10.00	4/7/17 12.00
10,9	0,483	0,473	0,459	0,435	0,431	7,642	7,663	6,614	5,572	5,614
9,9	0,314	0,325	0,289	0,263	0,272	7,159	7,190	6,155	5,137	5,183
8,9	0,287	0,276	0,240	0,192	0,185	6,845	6,865	5,866	4,874	4,911
7,9	0,129	0,132	0,074	0,020	0,028	6,558	6,589	5,626	4,682	4,726
6,9	0,260	0,266	0,184	0,108	0,114	6,429	6,457	5,552	4,662	4,698
5,9	0,274	0,279	0,209	0,144	0,140	6,169	6,191	5,368	4,554	4,584
4,9	0,224	0,220	0,165	0,106	0,115	5,895	5,912	5,159	4,410	4,444
3,9	0,062	0,071	0,010	-0,042	-0,049	5,671	5,692	4,994	4,304	4,329
2,9	0,327	0,320	0,270	0,212	0,220	5,609	5,621	4,984	4,346	4,378
1,9	-0,005	0,003	-0,111	-0,218	-0,215	5,282	5,301	4,714	4,134	4,158
0,9	0,057	0,063	-0,010	-0,077	-0,081	5,287	5,298	4,825	4,352	4,373
-0,1	0,412	0,408	0,421	0,430	0,439	5,230	5,235	4,835	4,429	4,454
-1,1	0,435	0,444	0,450	0,465	0,470	4,818	4,827	4,414	3,999	4,015
-2,1	0,205	0,198	0,178	0,151	0,140	4,383	4,383	3,964	3,534	3,545
-3,1	0,088	0,096	0,053	0,017	0,014	4,178	4,185	3,786	3,383	3,405
-4,1	0,144	0,147	0,109	0,074	0,083	4,090	4,089	3,733	3,366	3,391
-5,1	0,109	0,105	0,088	0,066	0,069	3,946	3,942	3,624	3,292	3,308
-6,1	0,218	0,227	0,198	0,178	0,175	3,837	3,837	3,536	3,226	3,239
-7,1	0,232	0,237	0,213	0,195	0,191	3,619	3,610	3,338	3,048	3,064
-8,1	0,191	0,180	0,167	0,143	0,149	3,387	3,373	3,125	2,853	2,873
-9,1	0,097	0,094	0,075	0,052	0,061	3,196	3,193	2,958	2,710	2,724
-10,1	0,306	0,315	0,276	0,246	0,235	3,099	3,099	2,883	2,658	2,663
-11,1	0,196	0,199	0,173	0,149	0,146	2,793	2,784	2,607	2,412	2,428
-12,1	0,264	0,261	0,250	0,235	0,228	2,597	2,585	2,434	2,263	2,282
-13,1	0,218	0,214	0,202	0,186	0,189	2,333	2,324	2,184	2,028	2,054
-14,1	0,111	0,117	0,101	0,090	0,094	2,115	2,110	1,982	1,842	1,865
-15,1	0,351	0,360	0,319	0,287	0,276	2,004	1,993	1,881	1,752	1,771
-16,1	0,095	0,084	0,090	0,085	0,090	1,653	1,633	1,562	1,465	1,495
-17,1	0,079	0,076	0,061	0,043	0,049	1,558	1,549	1,472	1,380	1,405
-18,1	0,180	0,173	0,165	0,150	0,154	1,479	1,473	1,411	1,337	1,356
-19,1	0,180	0,183	0,165	0,151	0,147	1,299	1,300	1,246	1,187	1,202
-20,1	0,177	0,181	0,164	0,151	0,160	1,119	1,117	1,081	1,036	1,055
-21,1	0,291	0,280	0,283	0,268	0,272	0,942	0,936	0,917	0,885	0,895
-22,1	0,651	0,656	0,634	0,617	0,623	0,651	0,656	0,634	0,617	0,623

Ansaldo STS A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO REPORT DELLE MISURE STAZIONE MUNICIPIO	LM6 7FX 2D E 70 Data: 27/10/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	--	---



Ubicazione	STAZIONE MUNICIPIO	
Opera	Tubo estensimetrico	
Nome tubo	MU_ES1	<div>Ultima misura</div> <div>126</div>
Data posa in opera	24/03/2011	
Data lettura di zero	07/04/2011	<div>In data</div> <div>10/10/17 12.30</div>

TABULATI (II)

QUOTA ASSOLUTA (m)	Spostamenti differenziali locali (mm/m)					Spostamenti differenziali integrali (mm)				
	N. LETTURA					N. LETTURA				
	122	123	124	125	126	122	123	124	125	126
	18/7/17 11.00	7/9/17 11.30	19/9/17 11.00	26/9/17 12.00	10/10/17 12.30	18/7/17 11.00	7/9/17 11.30	19/9/17 11.00	26/9/17 12.00	10/10/17 12.30
10,9	0,434	0,442	0,450	0,456	0,459	5,626	5,727	5,828	5,902	5,877
9,9	0,276	0,285	0,294	0,289	0,292	5,192	5,285	5,378	5,446	5,418
8,9	0,174	0,179	0,184	0,191	0,181	4,916	5,000	5,084	5,157	5,126
7,9	0,033	0,037	0,041	0,036	0,041	4,742	4,821	4,900	4,966	4,945
6,9	0,120	0,129	0,138	0,135	0,139	4,709	4,784	4,859	4,930	4,904
5,9	0,144	0,141	0,138	0,142	0,151	4,589	4,655	4,721	4,795	4,765
4,9	0,111	0,100	0,089	0,095	0,088	4,445	4,514	4,583	4,653	4,614
3,9	-0,040	-0,035	-0,030	-0,024	-0,020	4,334	4,414	4,494	4,558	4,526
2,9	0,224	0,217	0,210	0,219	0,228	4,374	4,449	4,524	4,582	4,546
1,9	-0,209	-0,200	-0,191	-0,184	-0,180	4,150	4,232	4,314	4,363	4,318
0,9	-0,077	-0,080	-0,083	-0,079	-0,082	4,359	4,432	4,505	4,547	4,498
-0,1	0,444	0,447	0,450	0,445	0,434	4,436	4,512	4,588	4,626	4,580
-1,1	0,473	0,480	0,487	0,495	0,485	3,992	4,065	4,138	4,181	4,146
-2,1	0,130	0,134	0,138	0,136	0,144	3,519	3,585	3,651	3,686	3,661
-3,1	0,023	0,029	0,035	0,042	0,038	3,389	3,451	3,513	3,550	3,517
-4,1	0,086	0,083	0,080	0,087	0,077	3,366	3,422	3,478	3,508	3,479
-5,1	0,066	0,070	0,074	0,078	0,084	3,280	3,339	3,398	3,421	3,402
-6,1	0,168	0,176	0,184	0,179	0,169	3,214	3,269	3,324	3,343	3,318
-7,1	0,187	0,184	0,181	0,179	0,175	3,046	3,093	3,140	3,164	3,149
-8,1	0,138	0,145	0,152	0,158	0,147	2,859	2,909	2,959	2,985	2,974
-9,1	0,051	0,059	0,067	0,064	0,069	2,721	2,764	2,807	2,827	2,827
-10,1	0,241	0,248	0,255	0,259	0,249	2,670	2,705	2,740	2,763	2,758
-11,1	0,150	0,156	0,162	0,157	0,166	2,429	2,457	2,485	2,504	2,509
-12,1	0,233	0,237	0,241	0,250	0,239	2,279	2,301	2,323	2,347	2,343
-13,1	0,186	0,190	0,194	0,203	0,193	2,046	2,064	2,082	2,097	2,104
-14,1	0,083	0,081	0,079	0,076	0,072	1,860	1,874	1,888	1,894	1,911
-15,1	0,266	0,263	0,260	0,255	0,252	1,777	1,793	1,809	1,818	1,839
-16,1	0,099	0,108	0,117	0,123	0,116	1,511	1,530	1,549	1,563	1,587
-17,1	0,039	0,043	0,047	0,044	0,053	1,412	1,422	1,432	1,440	1,471
-18,1	0,157	0,152	0,147	0,142	0,146	1,373	1,379	1,385	1,396	1,418
-19,1	0,152	0,161	0,170	0,178	0,174	1,216	1,227	1,238	1,254	1,272
-20,1	0,156	0,163	0,170	0,165	0,173	1,064	1,066	1,068	1,076	1,098
-21,1	0,281	0,278	0,275	0,279	0,288	0,908	0,903	0,898	0,911	0,925
-22,1	0,627	0,625	0,623	0,632	0,637	0,627	0,625	0,623	0,632	0,637




Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO
Opera Tubo estensimetrico
Nome tubo MU_ES1
Data posa in opera 24/03/2011
Data lettura di zero 07/04/2011


Ultima misura	In data
126	10/10/17 12.30

GRAFICI

spostamenti differenziali locali

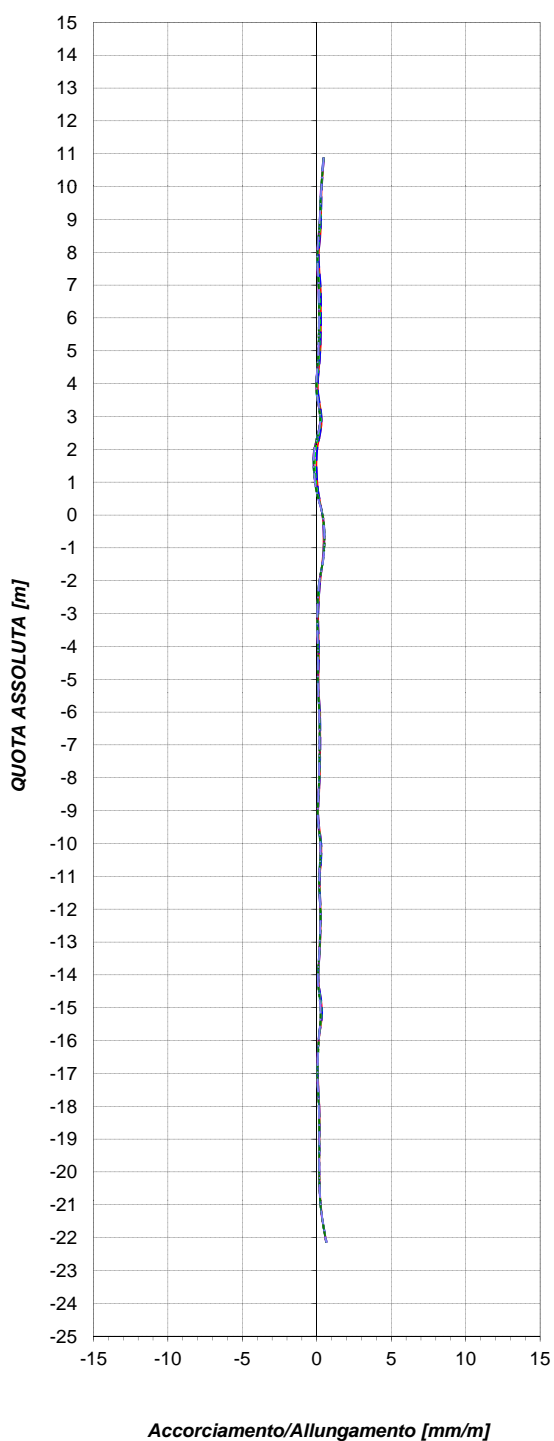


spostamenti differenziali integrali

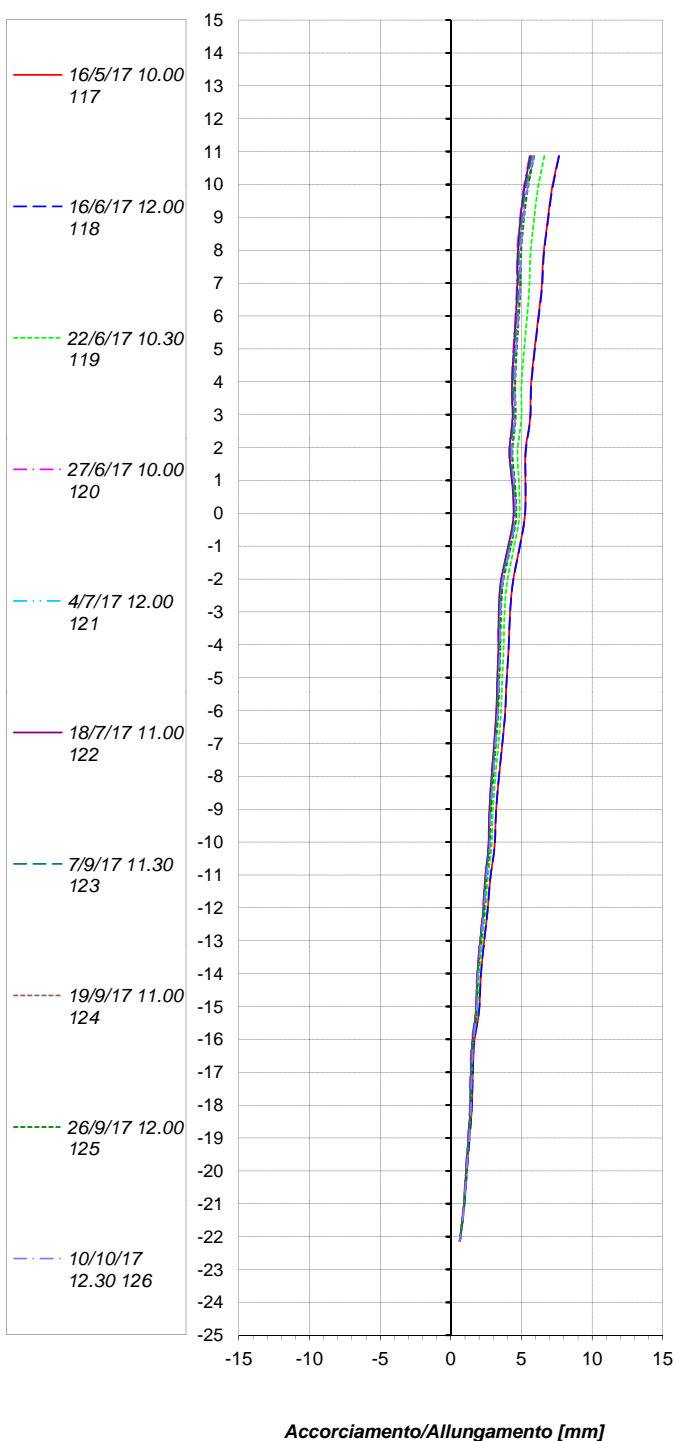

Estenso-inclinometro

MU_ES2

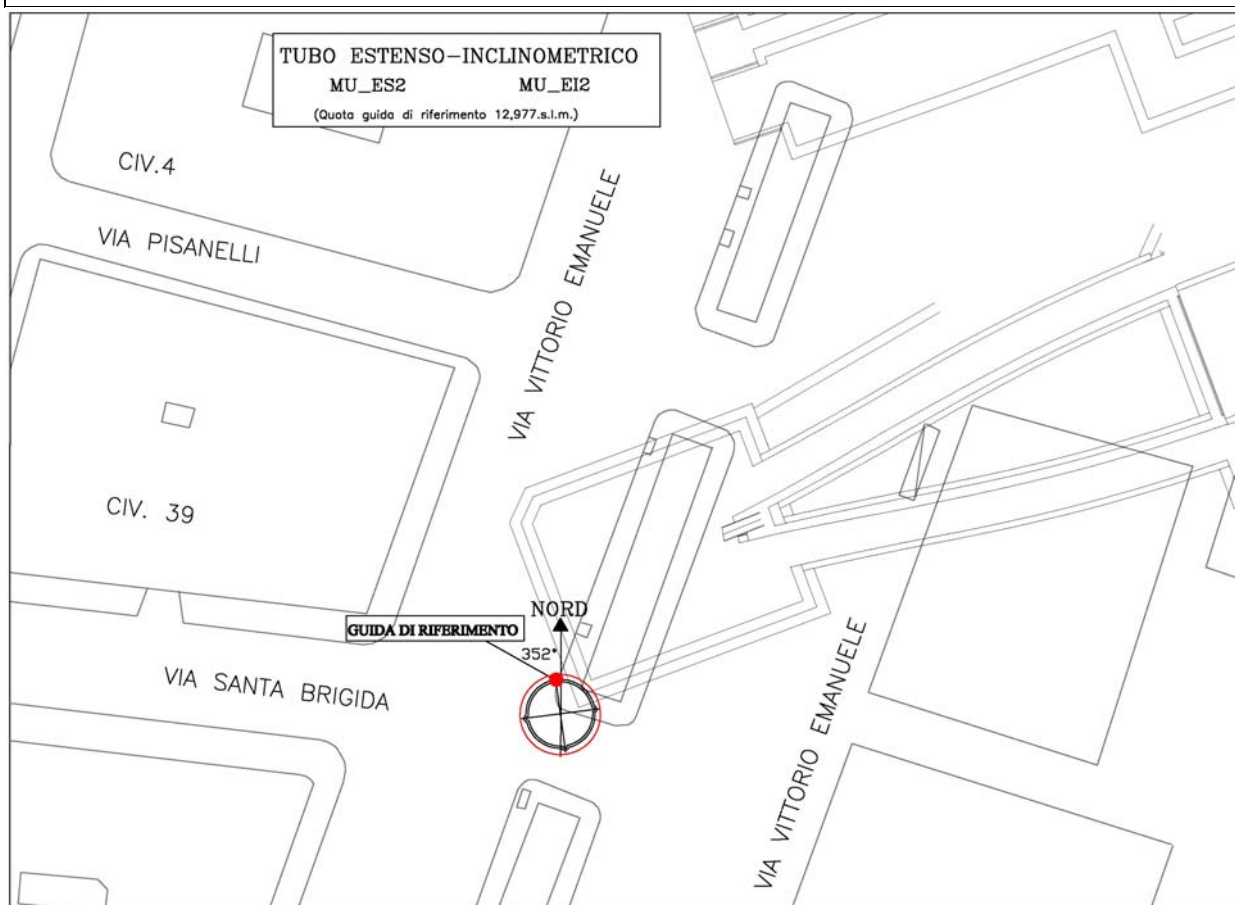

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X

Congruenza progettuale

C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza


NOTE

Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure disponibili da consegnare.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report MAG 2015 con codifica: LM6 7FX 2D E42

Estenso-inclinometro

MU_ES3

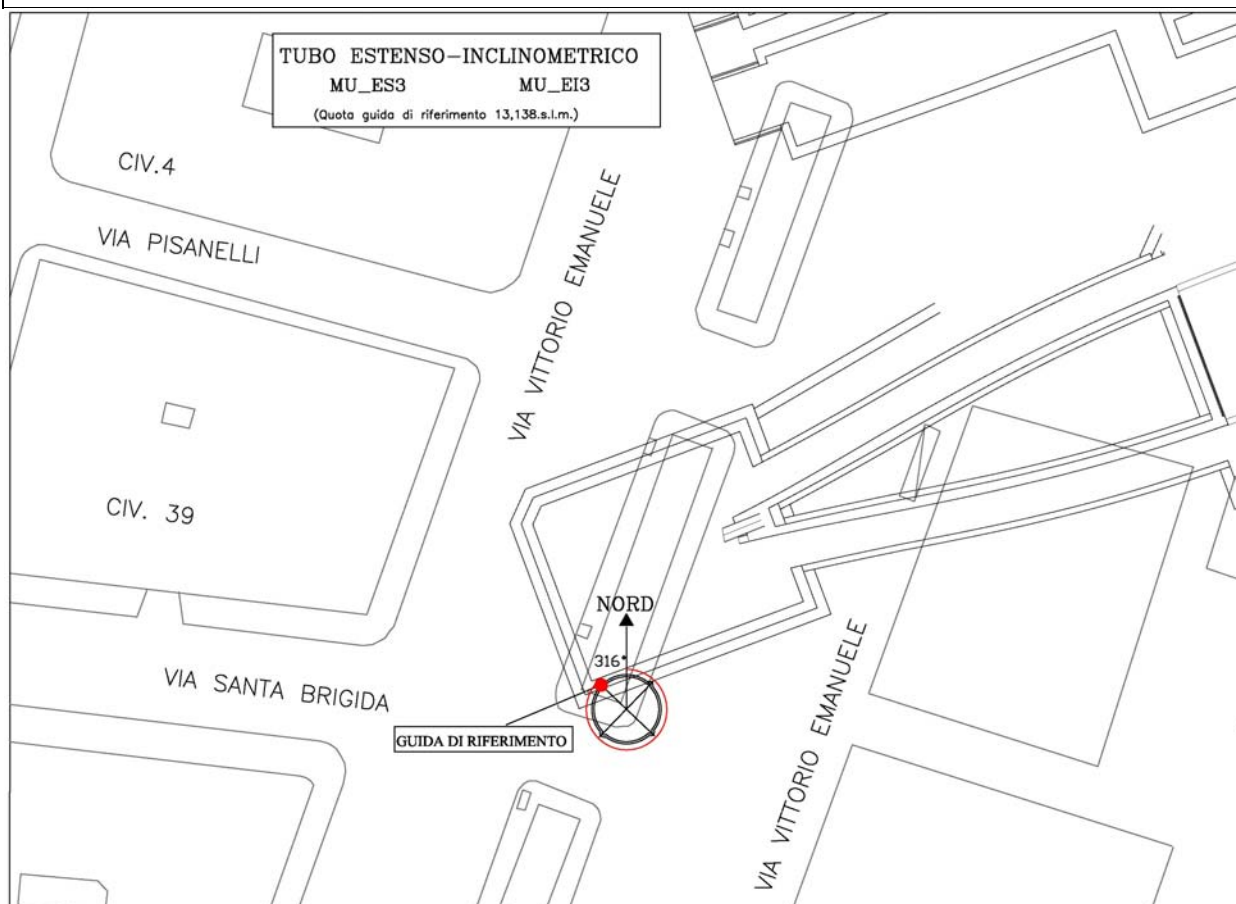

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X

Congruenza progettuale
C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza


NOTE

Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure disponibili da consegnare.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report MAG 2015 con codifica: LM6 7FX 2D E42

Estenso-inclinometro

MU_ES4

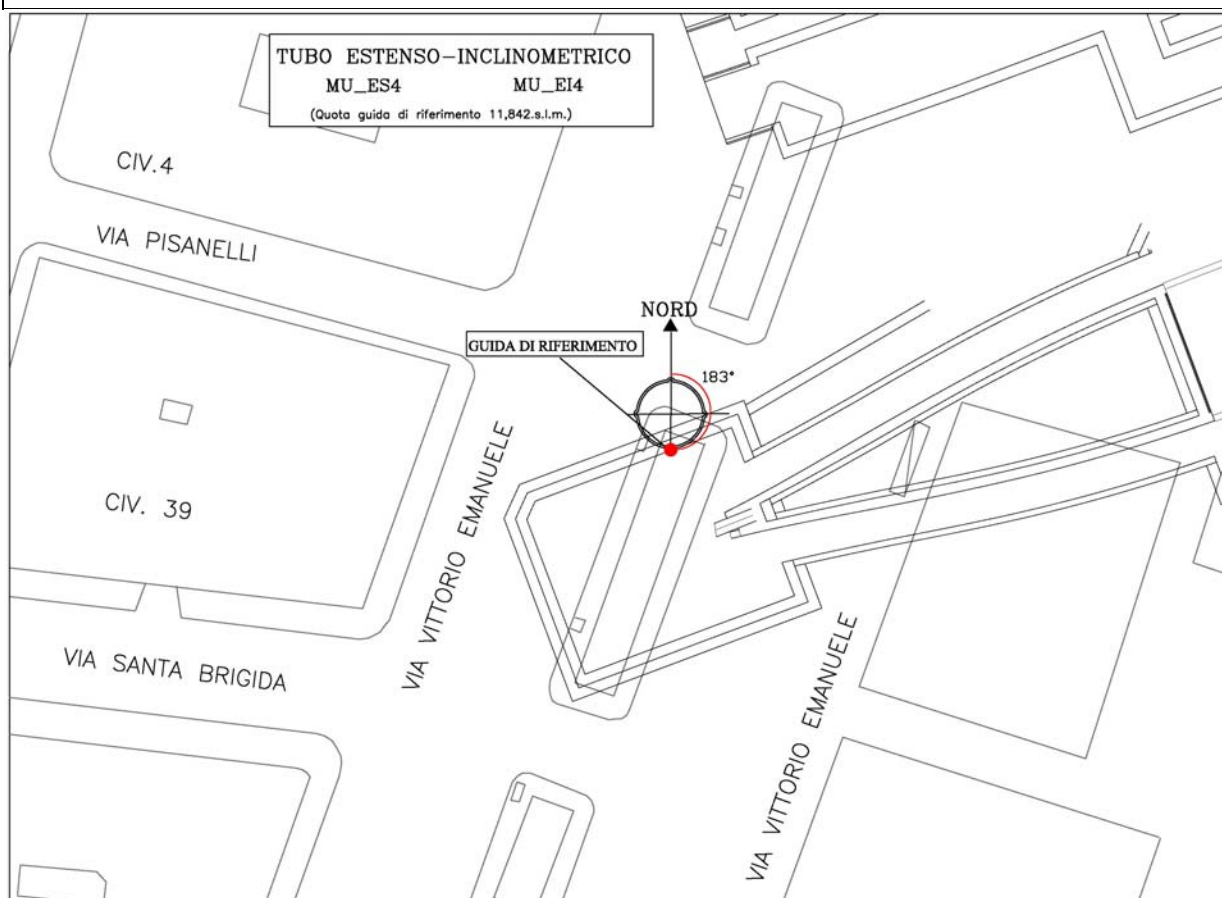

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X

Congruenza progettuale
C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza

NOTE

Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure disponibili da consegnare.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report MAG 2015 con codifica: LM6 7FX 2D E42

Ansaldo STS A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO <i>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</i> <i>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE MUNICIPIO</i>	LM6 7FX 2D E 70 Data: 27/10/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	---	---

8.MISURE GEOTECNICHE – INCLINOMETRICHE

Gli inclinometri sono strumenti di controllo dei movimenti e delle deformazioni dei terreni nonché delle variazioni di assetto delle strutture. I rilievi consistono nella misura della variazione delle inclinazioni rispetto alla verticale di punti significativi, dall'inclinazione, mediante integrazione numerica si risale agli spostamenti sul piano x-y. La strumentazione di base è composta da tubo inclinometrico a sezione circolare provvisto di scanalature con funzione di guida per la sonda, sonda inclinometrica, cavo e centralina di misura.


Tabella riepilogativa per gli inclinometri installati in cantiere

NOME	TIPOLOGIA STRUMENTO	DATA INSTALLAZIONE	DISPONIBILITA' LETTURA			NOTE
			DATA LETTURA DI ZERO	PERIODO INTERRUZIONE	DATA FINE ATTIVITA'	
MU_EI1	INCLINOMETRO	24/03/11	06/04/11			
MU_EI2	INCLINOMETRO	15/03/11	06/04/11	21/05/15		(*)
MU_EI3	INCLINOMETRO	17/03/11	06/04/11	21/05/15		(*)
MU_EI4	INCLINOMETRO	12/03/11	06/04/11	21/05/15		(*)

(*) Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure disponibili da consegnare.

Inclinometro

MU_EI1

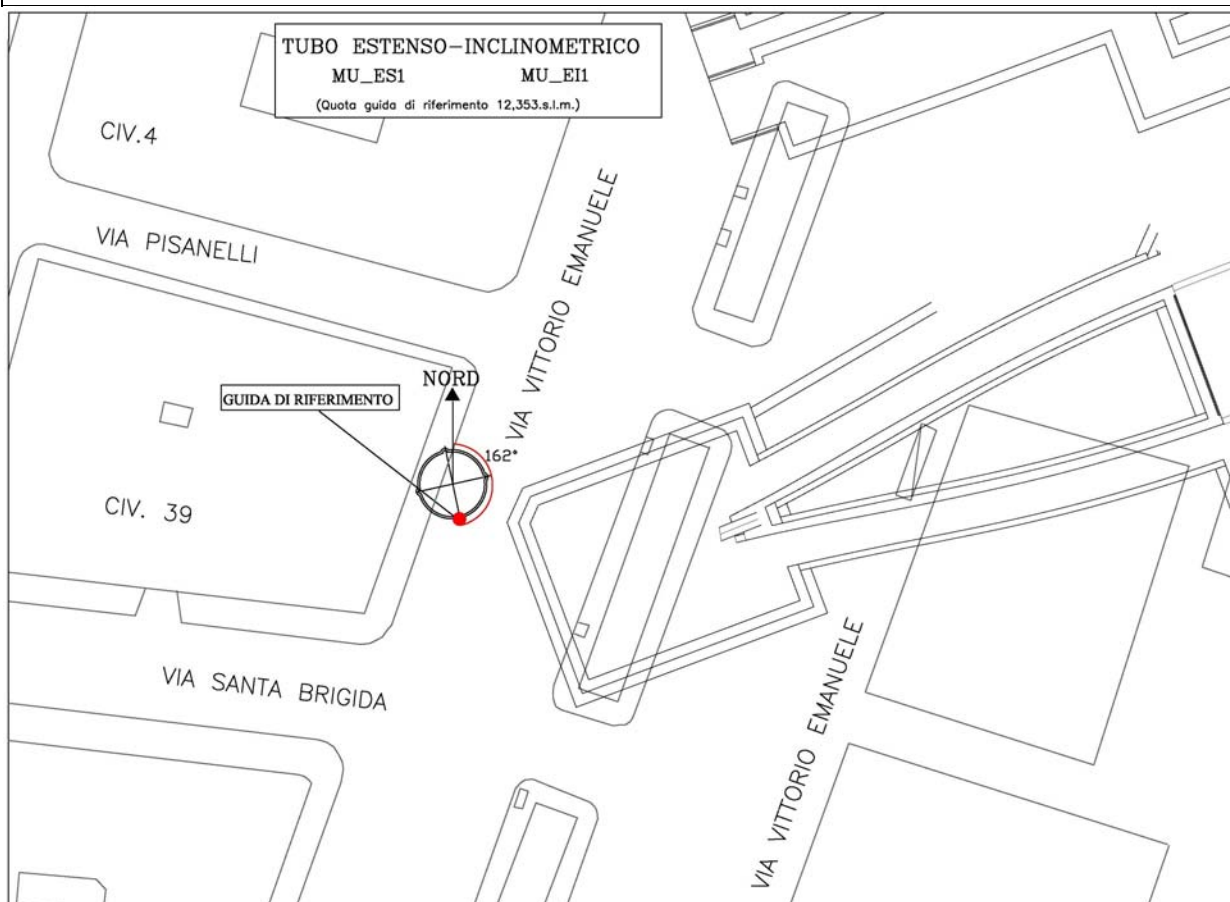

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X

Congruenza progettuale
C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza

NOTE

Ansaldo STS A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO REPORT DELLE MISURE - STAZIONE MUNICIPIO	LM6 7FX 2D E 70 Data: 27/10/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	---	---



MISURE INCLINOMETRICHE
ELABORAZIONE DA FONDO FORO
-TABULATI-

Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO
Tipo Strumento Tubo inclinometrico
Nome tubo MU_EI1
Azimut di riferimento 162
Quota guida rif. (m.s.l.m.) 12,353
Data lettura di zero 06/04/2011
Data posa in opera 24/03/2011

Misura 134 **in data** 10/10/2017 11.54

SPOSTAMENTI LOCALI (mm)				
PROFONDITA (m.s.l.m.)	EST	NORD	RISULTANTE	AZIMUT
11,9	0,501	-0,211	0,544	112,803
10,9	-0,312	-0,339	0,461	222,615
9,9	0,262	0,420	0,495	31,994
8,9	0,500	0,108	0,511	77,784
7,9	0,157	-0,051	0,165	107,881
6,9	0,140	-0,087	0,165	121,886
5,9	-0,093	0,091	0,130	314,508
4,9	0,322	0,096	0,336	73,417
3,9	-0,076	0,358	0,366	348,029
2,9	-0,014	0,218	0,218	356,235
1,9	-0,343	0,125	0,365	289,990
0,9	0,062	0,257	0,265	13,661
-0,1	-0,597	0,210	0,633	289,412
-1,1	-0,278	0,116	0,301	292,545
-2,1	-0,742	0,356	0,823	295,662
-3,1	-0,587	0,149	0,606	284,273
-4,1	-0,257	0,396	0,473	327,014
-5,1	-0,860	0,058	0,862	273,869
-6,1	-0,855	-0,145	0,867	260,397
-7,1	-0,758	0,538	0,929	305,355
-8,1	-0,276	0,230	0,359	309,865
-9,1	-0,467	0,065	0,471	277,984
-10,1	-0,266	-0,164	0,312	238,295
-11,1	0,030	0,965	0,966	1,751
-12,1	-0,187	-0,608	0,636	197,069
-13,1	-0,977	0,945	1,359	314,052
-14,1	0,462	1,689	1,751	15,286
-15,1	0,150	-0,784	0,799	169,154
-16,1	-1,604	-2,680	3,124	210,900
-17,1	0,034	0,545	0,546	3,598
-18,1	-0,077	0,416	0,423	349,456
-19,1	-0,044	-0,146	0,153	196,842
-20,1	0,324	0,552	0,640	30,385
-21,1	0,323	0,117	0,343	70,091
-22,1	0,016	0,331	0,332	2,681

SPOSTAMENTI INTEGRALI (mm)				
PROFONDITA (m.s.l.m.)	EST	NORD	RISULTANTE	AZIMUT
11,9	-6,389	4,137	7,611	302,923
10,9	-6,890	4,347	8,147	302,251
9,9	-6,578	4,687	8,077	305,470
8,9	-6,840	4,267	8,062	301,956
7,9	-7,340	4,159	8,436	299,536
6,9	-7,497	4,209	8,598	299,314
5,9	-7,637	4,296	8,762	299,362
4,9	-7,544	4,205	8,637	299,137
3,9	-7,866	4,110	8,875	297,585
2,9	-7,790	3,751	8,646	295,714
1,9	-7,776	3,534	8,541	294,441
0,9	-7,433	3,409	8,177	294,639
-0,1	-7,495	3,152	8,131	292,809
-1,1	-6,898	2,942	7,499	293,096
-2,1	-6,620	2,826	7,198	293,119
-3,1	-5,878	2,470	6,376	292,791
-4,1	-5,291	2,320	5,778	293,680
-5,1	-5,034	1,924	5,389	290,918
-6,1	-4,173	1,866	4,571	294,088
-7,1	-3,318	2,010	3,880	301,209
-8,1	-2,560	1,473	2,954	299,905
-9,1	-2,285	1,242	2,601	298,536
-10,1	-1,818	1,177	2,166	302,919
-11,1	-1,552	1,341	2,051	310,831
-12,1	-1,582	0,376	1,626	283,369
-13,1	-1,395	0,984	1,707	305,206
-14,1	-0,418	0,039	0,420	275,319
-15,1	-0,879	-1,651	1,870	208,050
-16,1	-1,030	-0,866	1,346	229,932
-17,1	0,574	1,814	1,903	17,568
-18,1	0,540	1,270	1,380	23,047
-19,1	0,618	0,854	1,054	35,879
-20,1	0,662	1,000	1,199	33,494
-21,1	0,338	0,448	0,561	37,039
-22,1	0,016	0,331	0,332	2,681




MISURE INCLINOMETRICHE
ELABORAZIONE DA FONDO FORO
-GRAFICI-1/5


Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO
Tipo Strumento Tubo inclinometrico
Nome tubo MU_EI1
Azimut di riferimento 162
Quota guida rif. (m.s.l.m.) 12,353
Data lettura di zero 06/04/2011
Data posa in opera 24/03/2011

Ultima Misura 134 in data 10/10/2017 11.54

Spostamenti Differenziali Locali
OVEST- (valori negativi) / EST + (valori positivi)

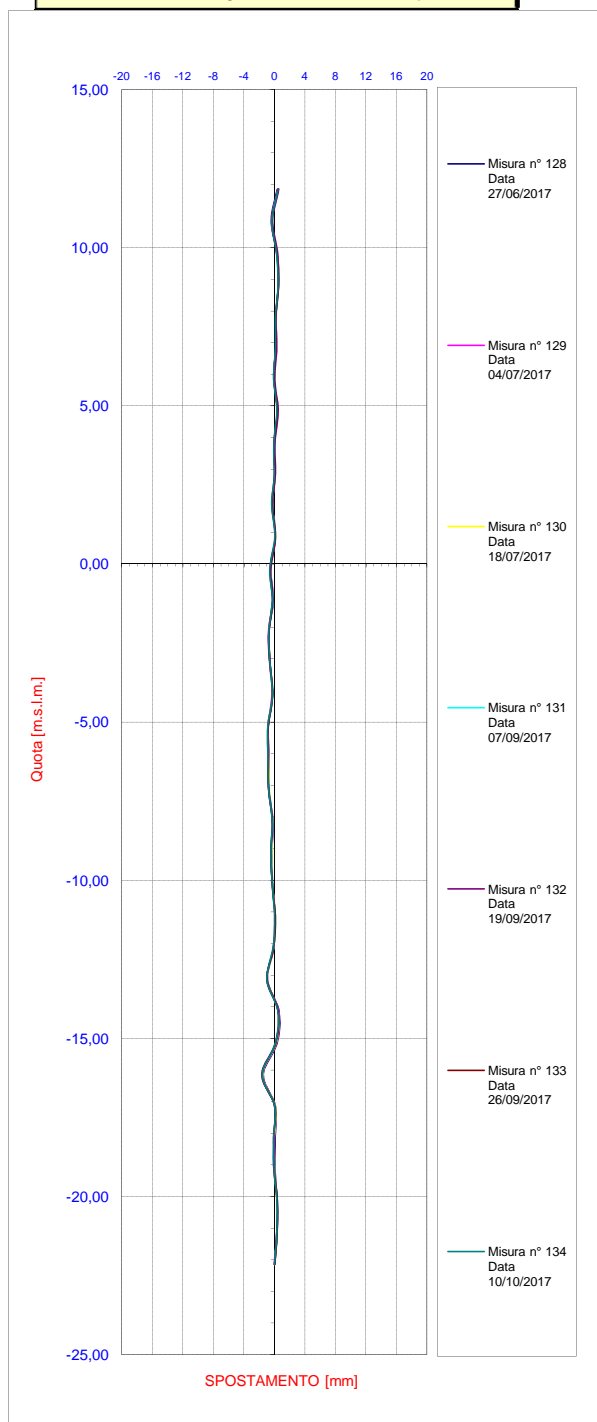


Spostamenti Differenziali Locali
SUD - (valori negativi) / NORD + (valori positivi)

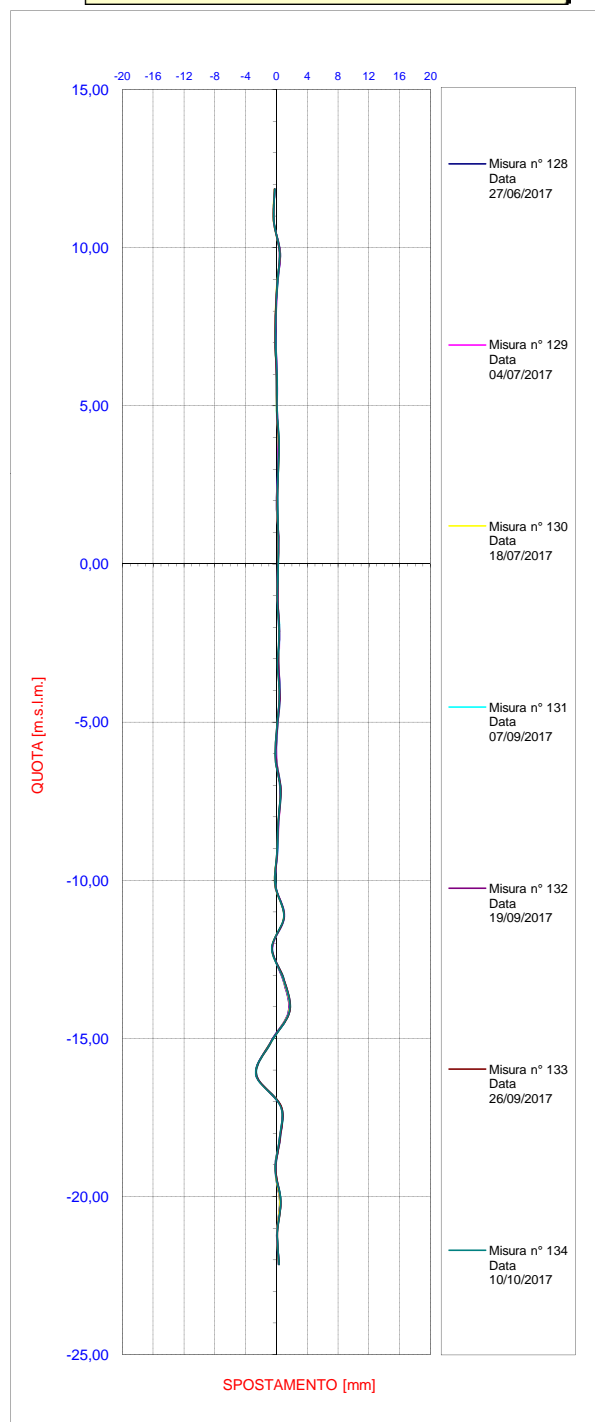


Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO
Tipo Strumento Tubo inclinometrico
Nome tubo MU_EI1
Azimut di riferimento 162
Quota guida rif. (m.s.l.m.) 12,353
Data lettura di zero 06/04/2011
Data posa in opera 24/03/2011

Ultima Misura 134 in data 10/10/2017 11.54

Spostamenti Differenziali Locali
Risultante

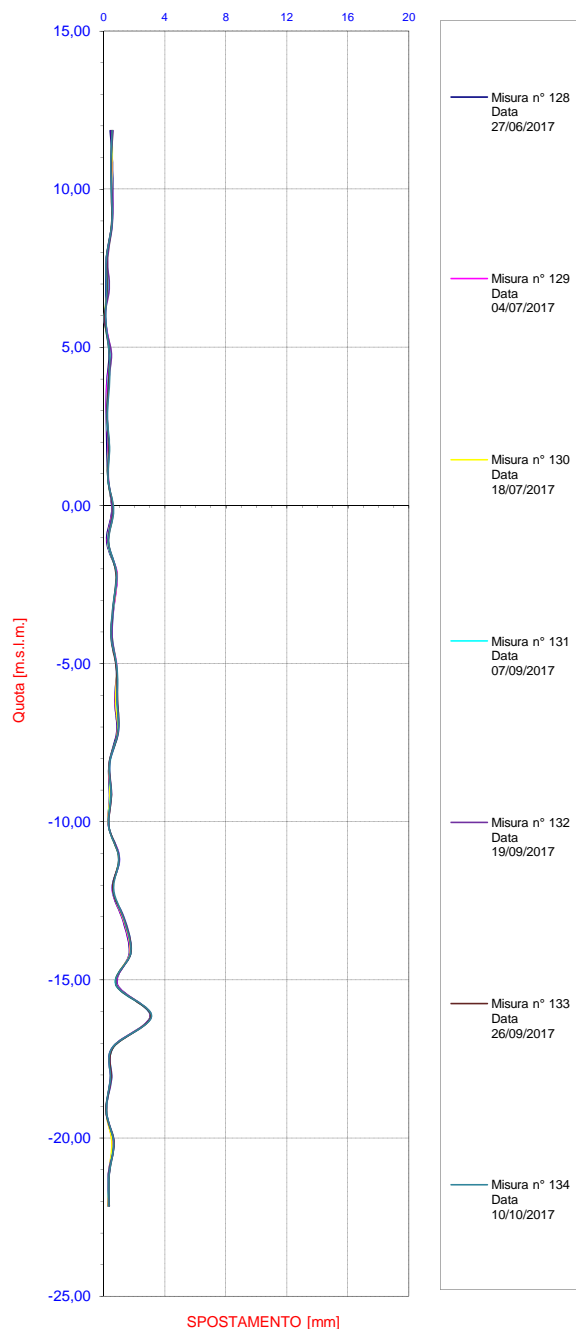


Spostamenti Differenziali Locali
Azimut

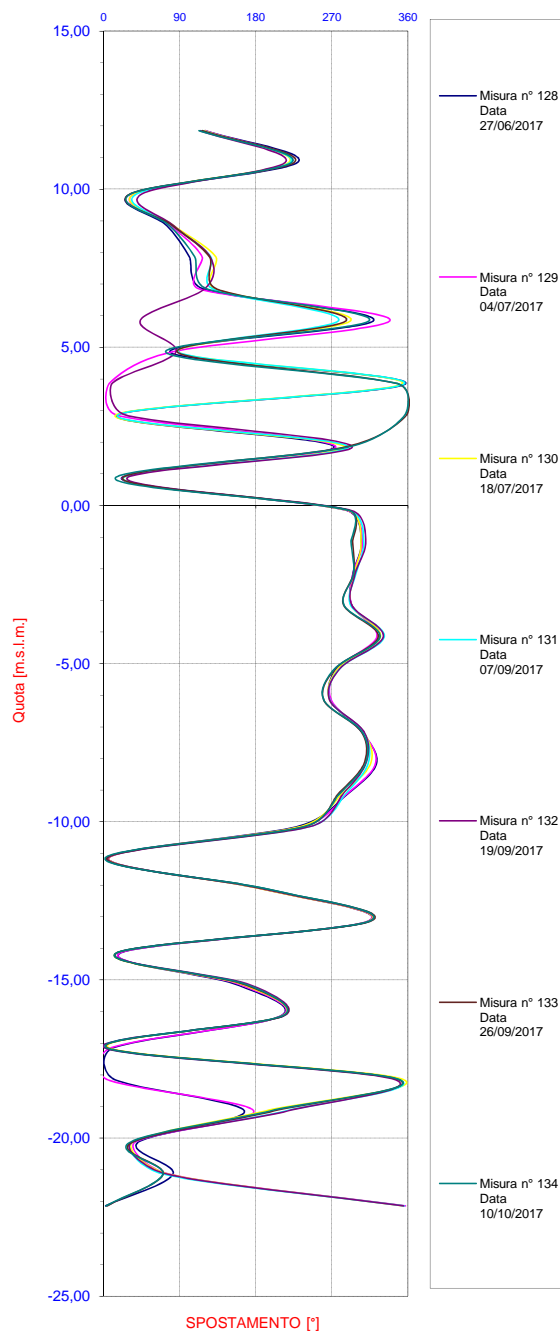


Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO
Tipo Strumento Tubo inclinometrico
Nome tubo MU_EI1
Azimut di riferimento 162
Quota guida rif. (m.s.l.m.) 12,353
Data lettura di zero 06/04/2011
Data posa in opera 24/03/2011

Ultima Misura 134 in data 10/10/2017 11.54

Spostamenti Differenziali Integrali
OVEST- (valori negativi) / EST + (valori positivi)

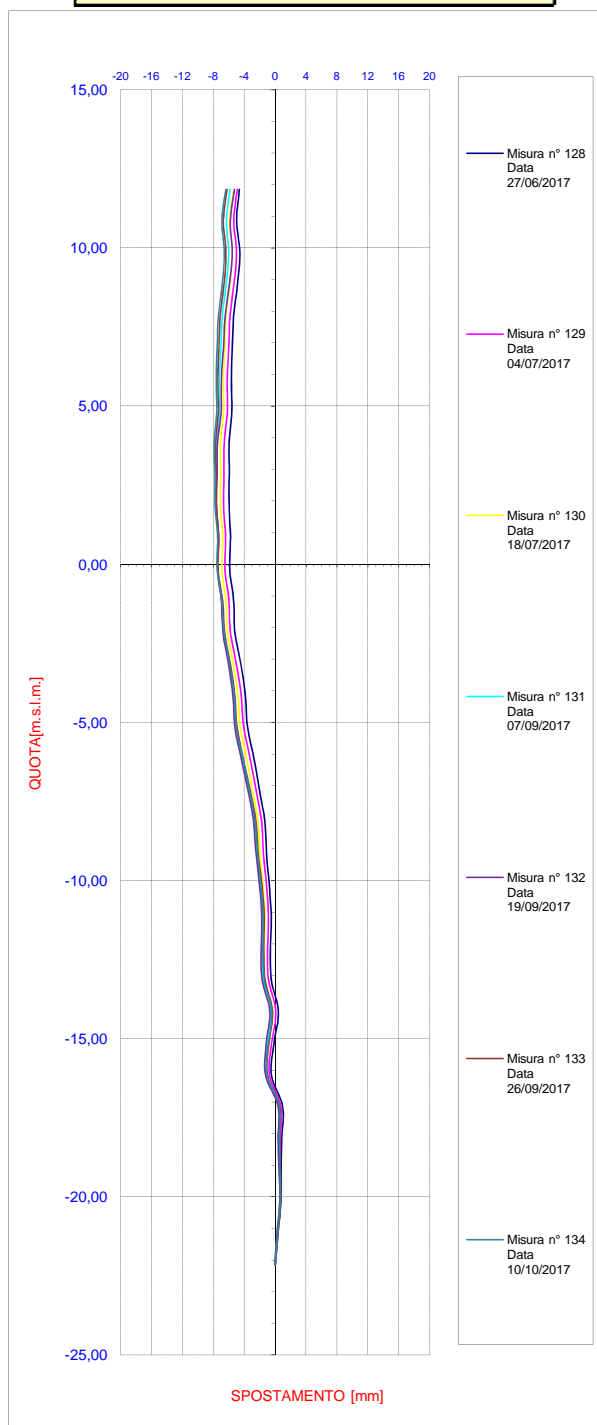


Spostamenti Differenziali Integrali
SUD - (valori negativi) / NORD + (valori positivi)

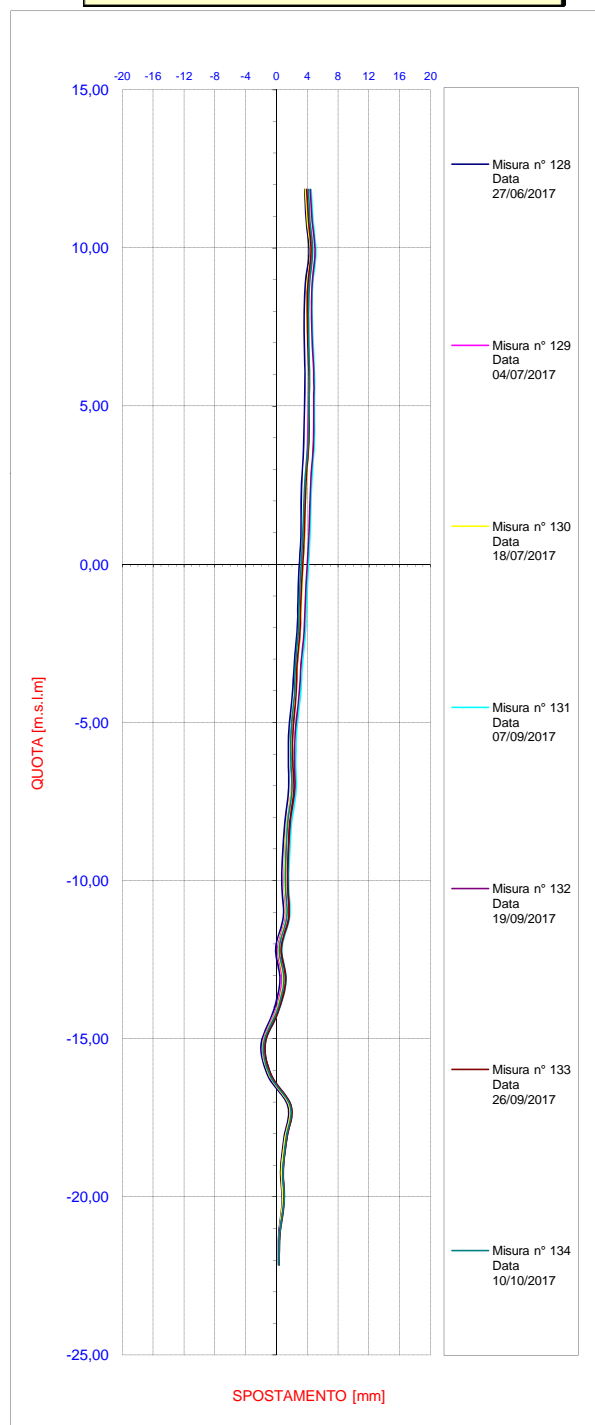


Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO
Tipo Strumento Tubo inclinometrico
Nome tubo MU_EI1
Azimut di riferimento 162
Quota guida rif. (m.s.l.m.) 12,353
Data lettura di zero 06/04/2011
Data posa in opera 24/03/2011

Ultima Misura 134 in data 10/10/2017 11.54

Spostamenti Differenziali Integrali
Risultante

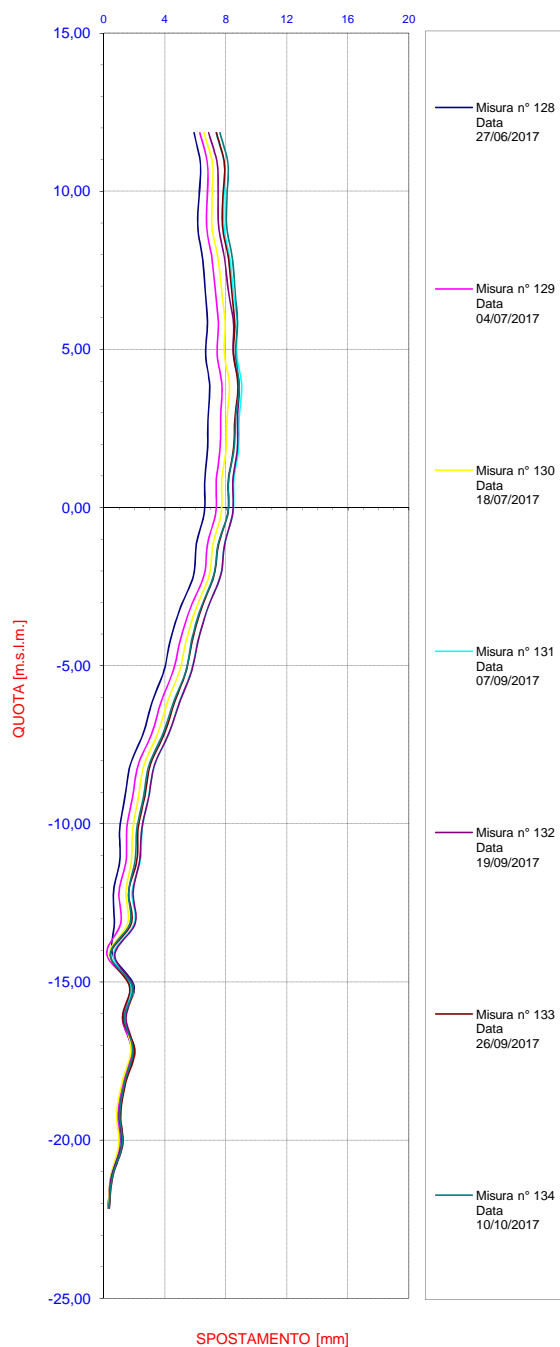


Spostamenti Differenziali Integrali
Azimut

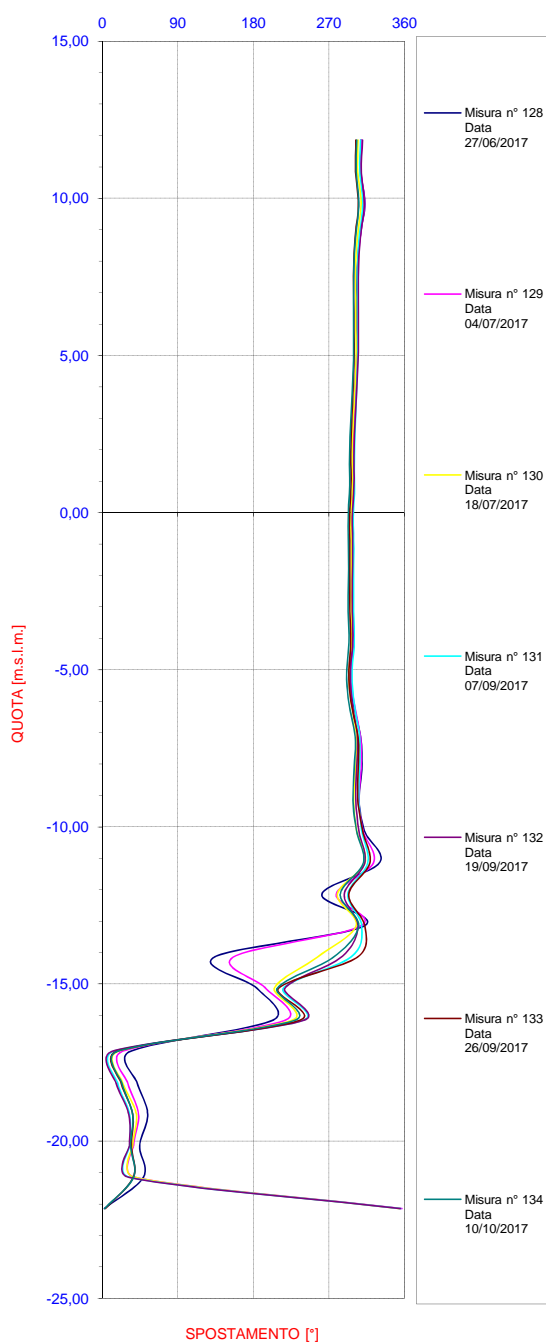

Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO
Tipo Strumento Tubo inclinometrico
Nome tubo MU_EI1
Azimut di riferimento 162
Quota guida rif. (m.s.l.m.) 12,353
Data lettura di zero 06/04/2011
Data posa in opera 24/03/2011


Ultima Misura 134 in data 10/10/2017 11.54

Spostamenti Differenziali Integrali
Diagramma polare

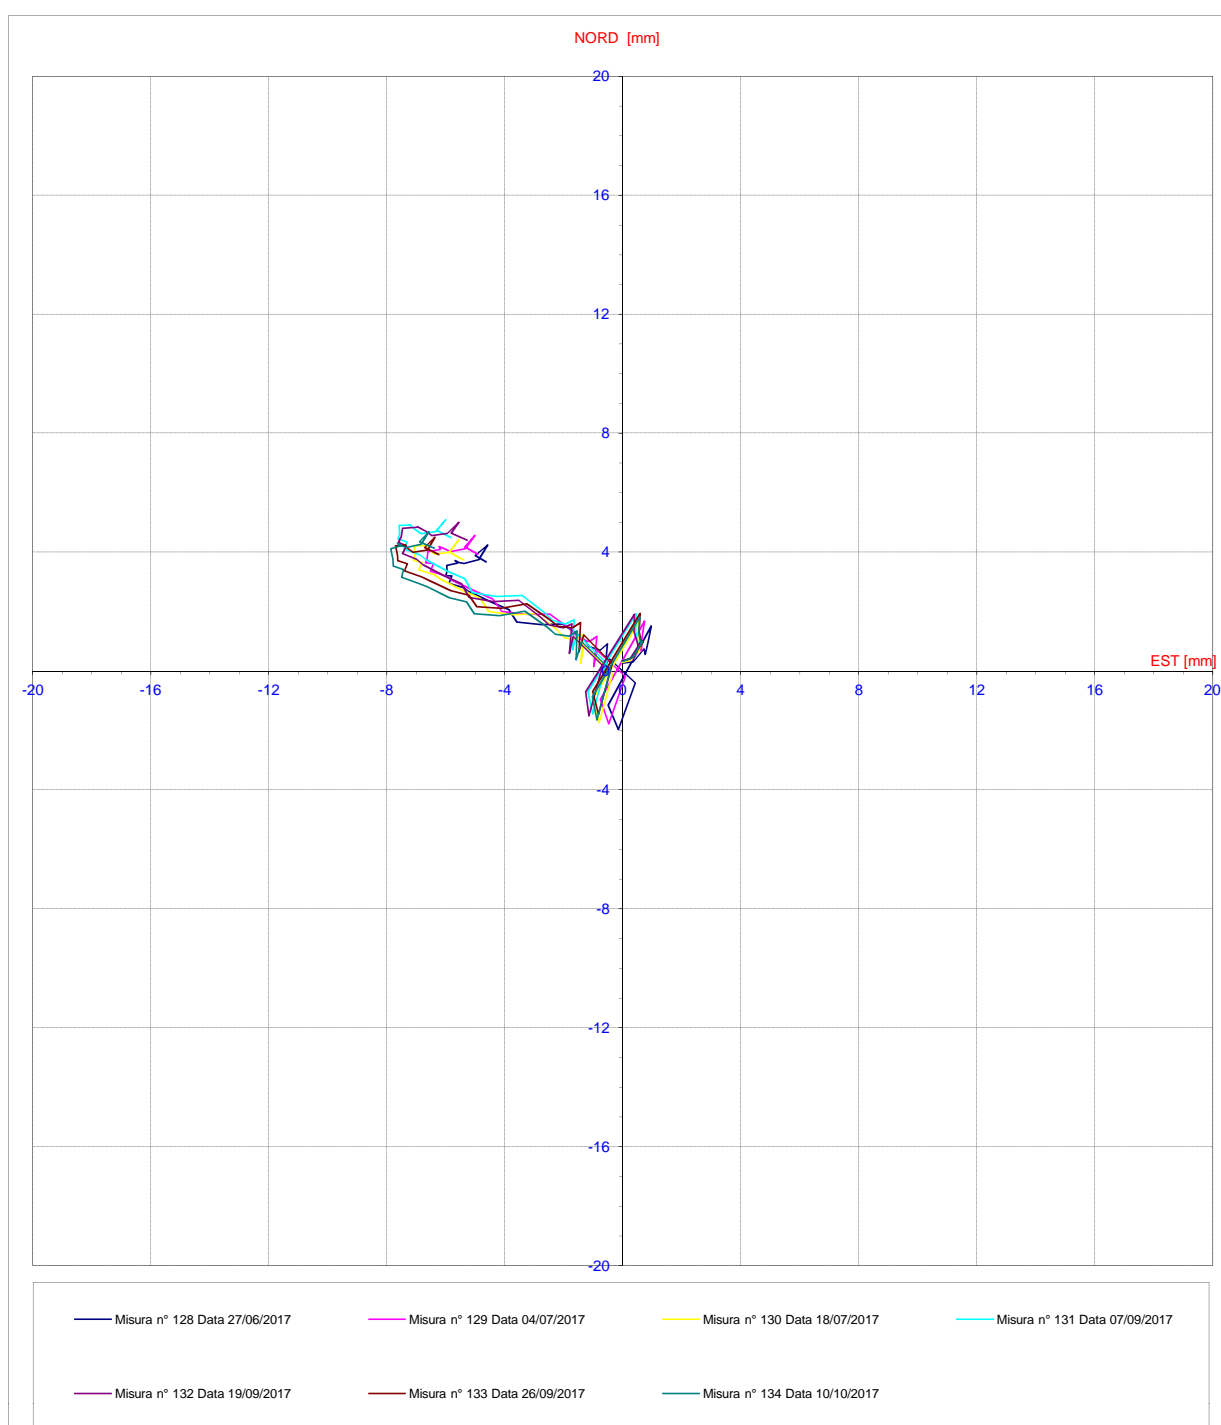

Inclinometro

MU_EI2

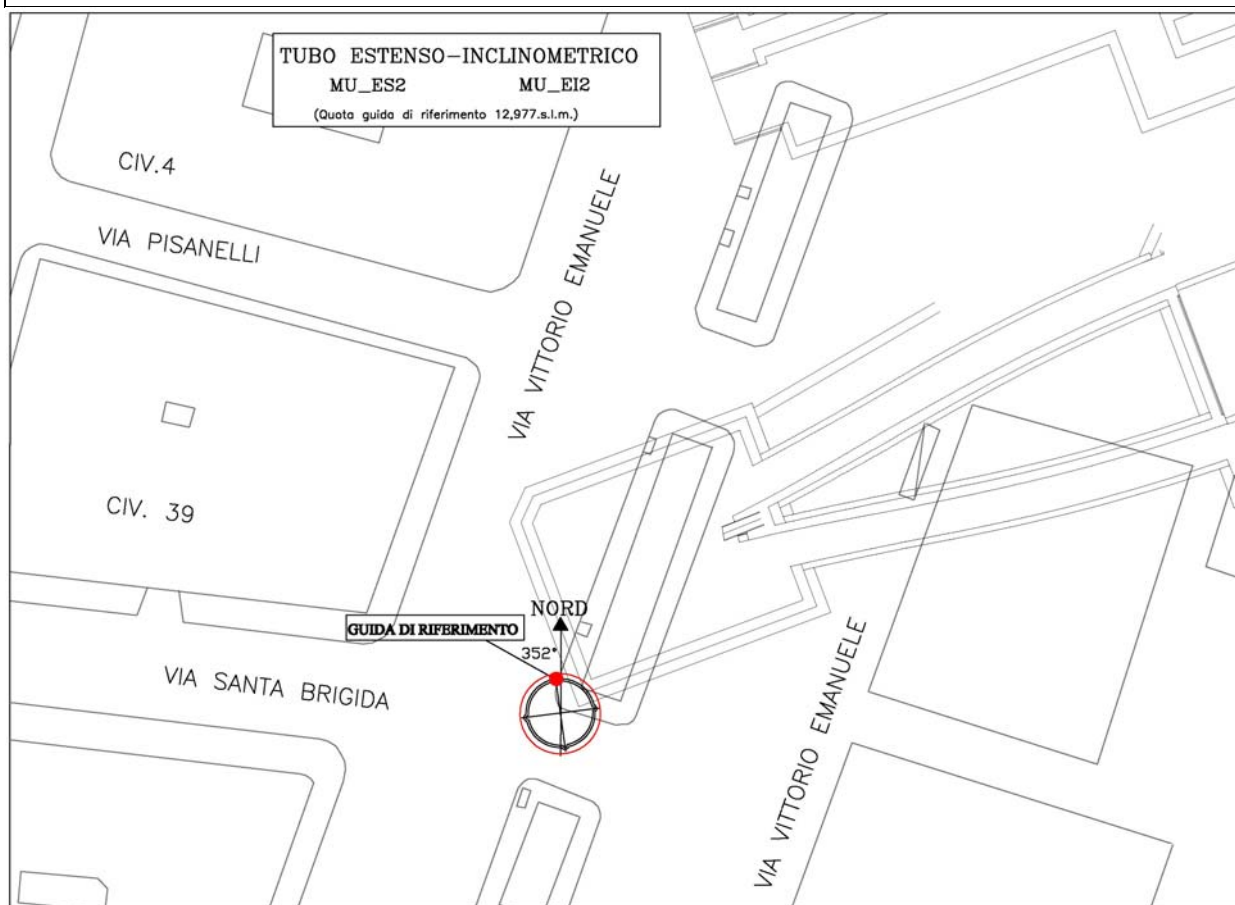

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X

Congruenza progettuale
C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza


NOTE

Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure disponibili da consegnare.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report MAG 2015 con codifica: LM6 7FX 2D E42

Inclinometro

MU_EI3

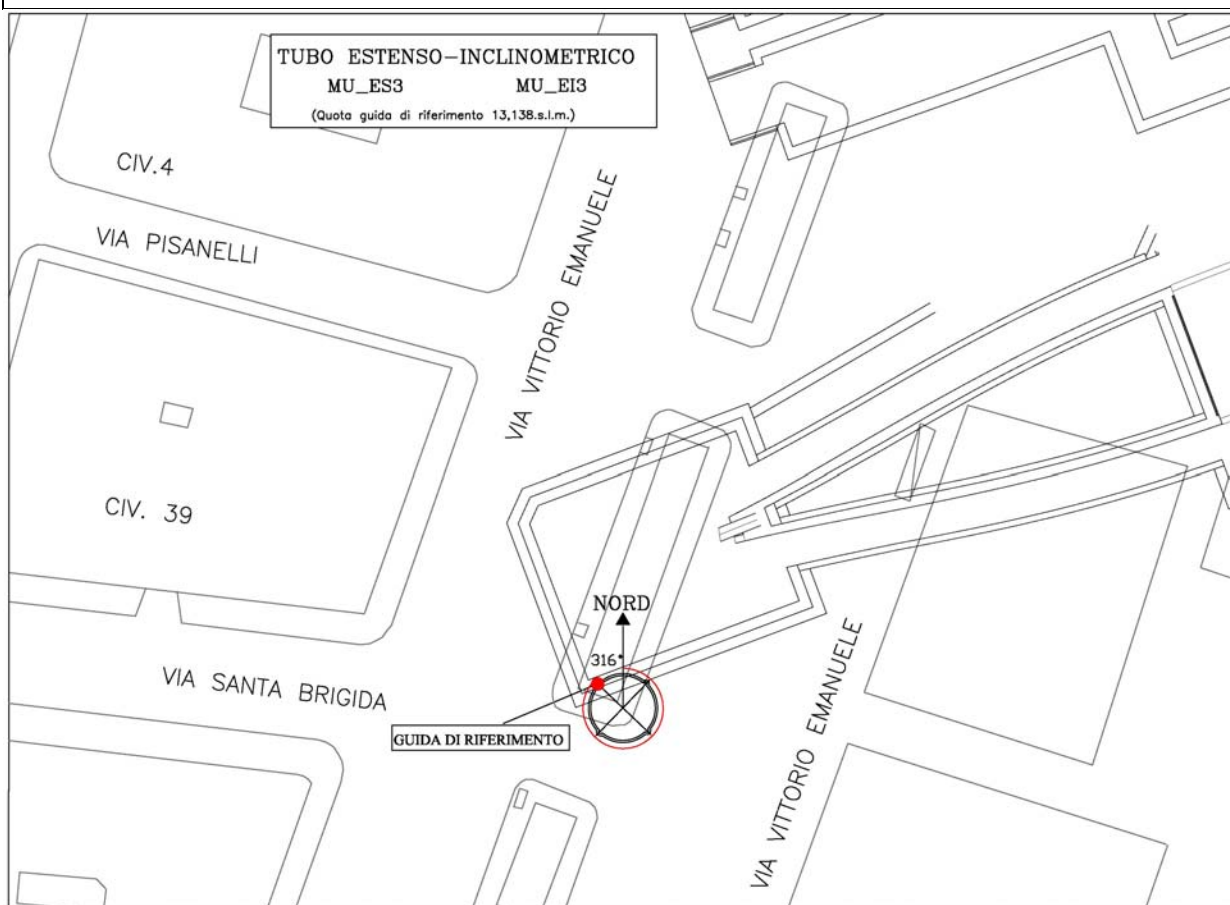

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X

Congruenza progettuale

C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza


NOTE

Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure disponibili da consegnare.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report MAG 2015 con codifica: LM6 7FX 2D E42

Inclinometro

MU_EI4

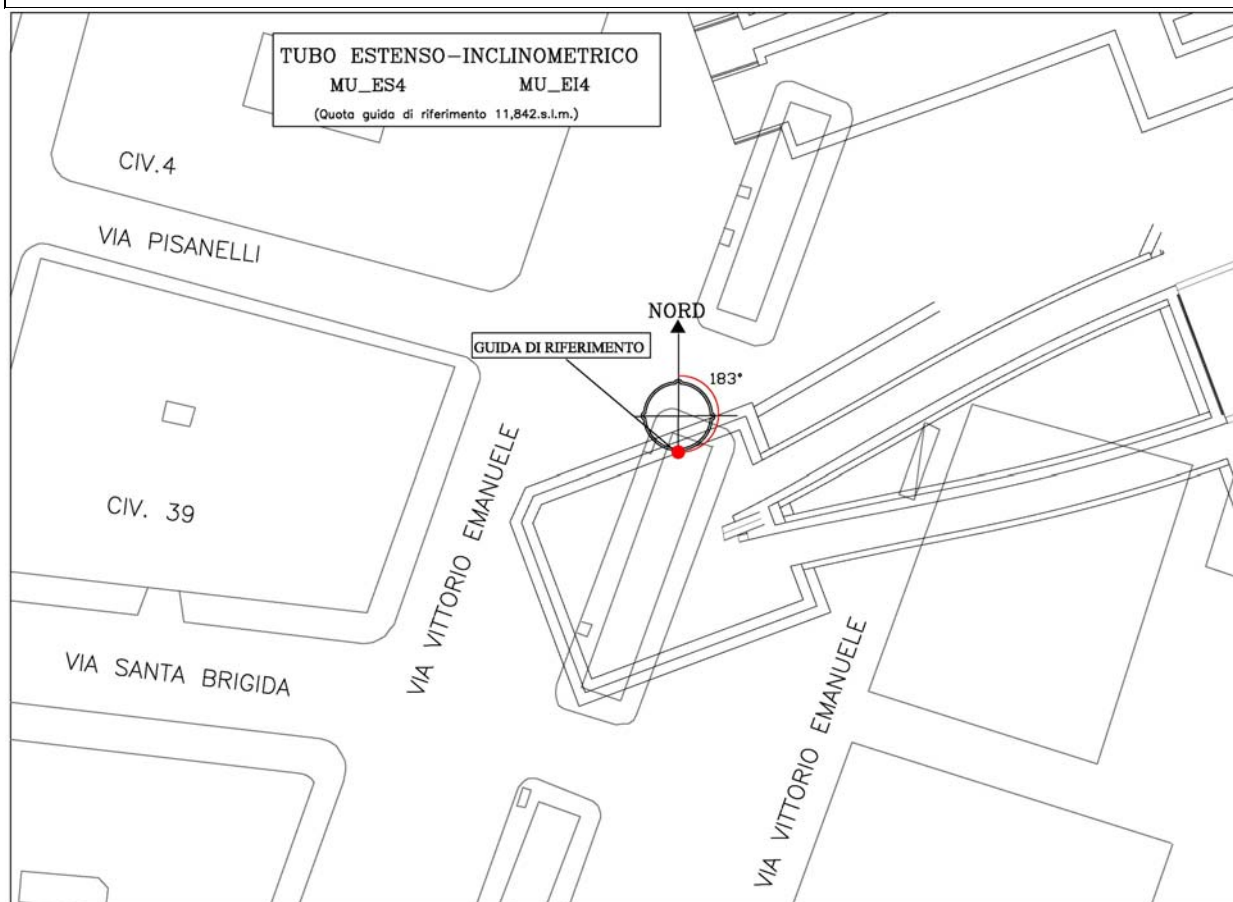

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X

Congruenza progettuale
C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza

NOTE

Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure disponibili da consegnare.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report MAG 2015 con codifica: LM6 7FX 2D E42

9. MISURE GEOTECNICHE – PIEZOMETRICHE


I piezometri sono strumenti per il controllo delle variazioni di quota della falda. Ciò è reso possibile tramite l'utilizzo di tubi che raggiungono l'acquifero, possono essere di tipo aperto o fornite di cella di Casagrande. I primi terminano in fondo con un tratto fenestrato, gli altri con una cella porosa, entrambe permettono l'ingresso al loro interno dell'acqua di falda. La misura si effettua mediante freatimetro elettrico, che restituisce la profondità del livello di falda in metri da boccaforo, successivamente trasformata in quota assoluta.

Tabella riepilogativa per i piezometri installati in cantiere

NOME	TIPO STRUM.	DATA INSTALLAZIONE	DISPONIBILITA' LETTURA			NOTE
			DATA LETTURA DI ZERO	PERIODO INTERRUZIONE	DATA FINE ATTIVITA'	
MU_PZ1	PIEZ TA	02/03/11	21/03/11	21/07/15		(*)
MU_PZ2	PIEZ TA	07/03/11	21/03/11			
MU_PZ3	PIEZ TA	08/03/11	21/03/11			
MU_PZ4	PIEZ TA	09/03/11	21/03/11			
MU_PZ5	PIEZ TA	10/03/11	21/03/11			
MU_PZ6	PIEZ TA	11/03/11	24/03/11			

(*) Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure disponibili da consegnare.

Piezometro MU_PZ1

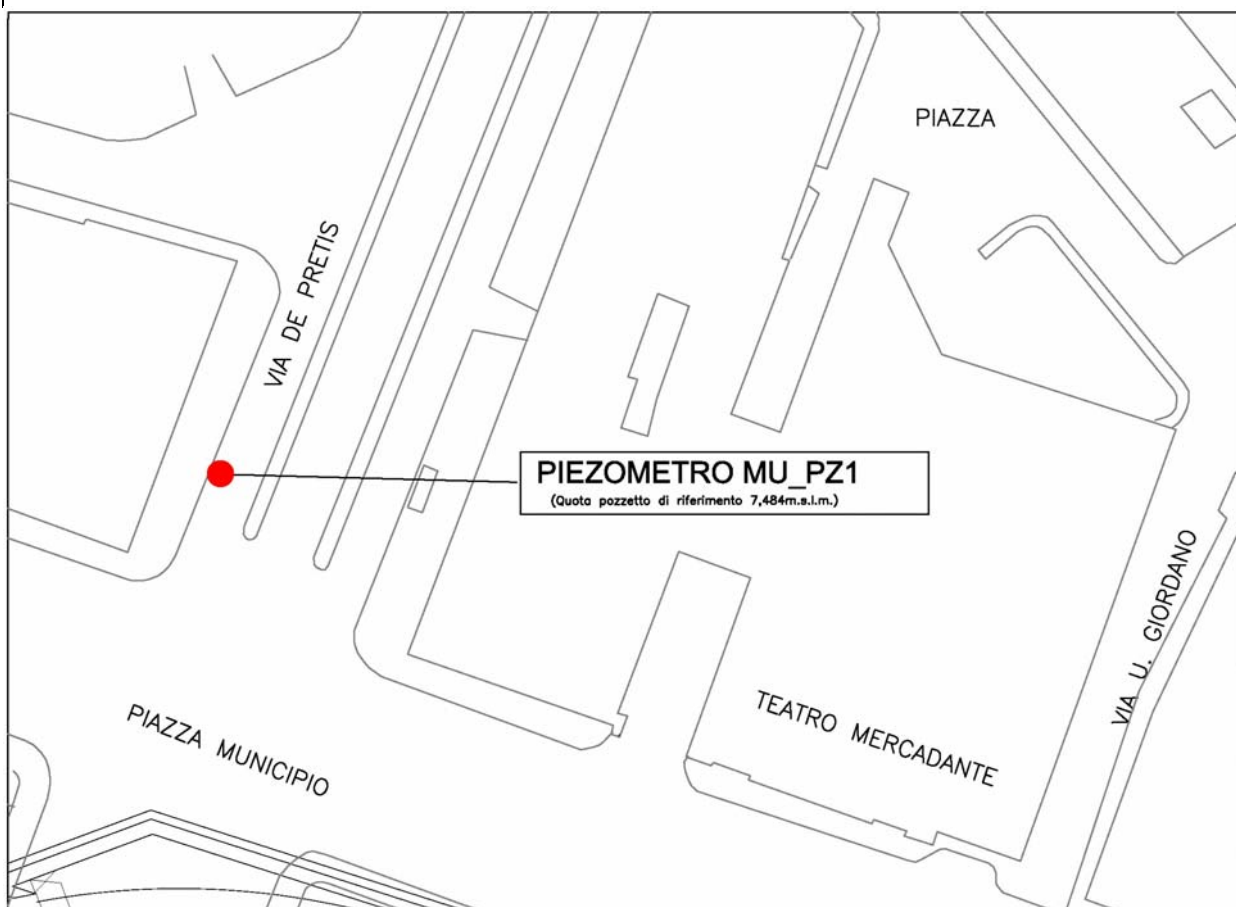

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X

Congruenza progettuale

C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio


congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza

NOTE

Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure disponibili da consegnare

Lo strumento è in attesa di ripristino da parte dell'ATI

Piezometro MU_PZ2

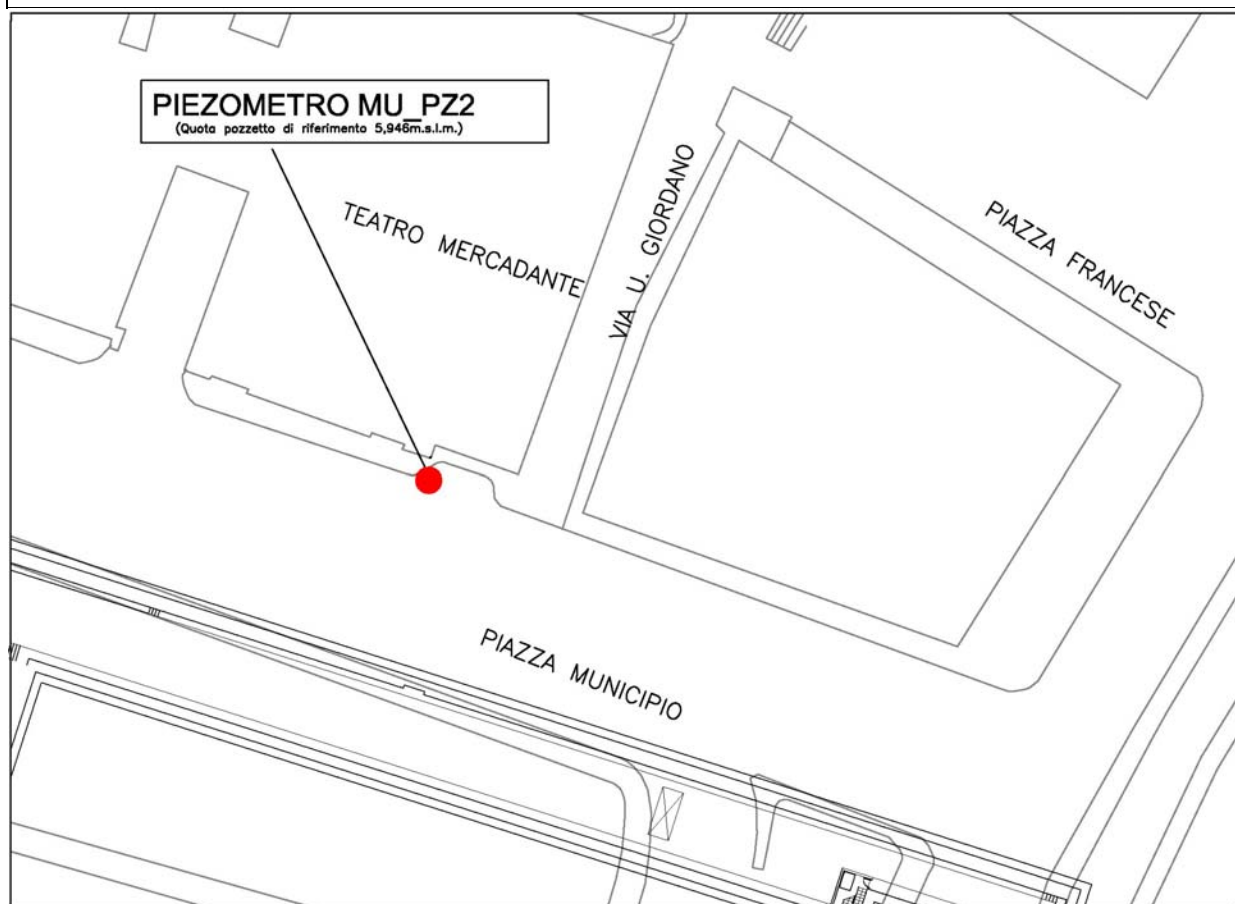

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X


Congruenza progettuale

C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza

NOTE

Le elaborazioni di seguito riportate includono lo storico delle misure.

	<p>LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</p> <p>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE MUNICIPIO</p>	<p>LM6 7FX 2D E 70</p> <p>Data: 27/10/17</p> <p>Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6</p> <p>TreEsse Engineering S.r.l.</p>
---	---	--



TABULATI

<p>Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO</p> <p>Tipo Strumento Piezometro a Tubo Aperto</p> <p>Nome Tubo Piezometrico \ \ MU_PZ2</p> <p>Data posa in opera 07/03/2011</p> <p>Data lettura di zero 21/03/2011</p>	<p>Ultima misura 290 in data 26/10/2017</p>
--	---

Letture n°	DATA	MU_PZ2	
		Boccaf. [m s.l.m.]	Cella [m s.l.m.]
		5,946	-19,554
		Quota [m.s.l.m.]	Spostam. [mm]
238	03/10/2016 9.00	1,14	-260,00
239	14/10/2016 10.00	1,13	-270,00
240	19/10/2016 10.00	1,15	-250,00
241	08/11/2016 10.00	1,15	-250,00
242	16/11/2016 11.30	1,12	-280,00
243	21/11/2016 12.30	1,14	-260,00
244	30/11/2016 12.30	1,13	-270,00
245	07/12/2016 12.00	1,15	-250,00
246	14/12/2016 12.00	1,16	-240,00
247	21/12/2016 12.00	1,18	-220,00
248	05/01/2017 10.00	1,20	-200,00
249	09/01/2017 11.30	1,19	-210,00
250	19/01/2017 12.00	1,17	-230,00
251	26/01/2017 11.00	1,30	-100,00
252	30/01/2017 11.00	1,35	-50,00
253	03/02/2017 10.00	1,39	-10,00
254	08/02/2017 10.00	1,45	50,00
255	16/02/2017 10.00	1,49	90,00
256	23/02/2017 10.00	1,50	100,00
257	02/03/2017 10.00	1,30	-100,00
258	06/03/2017 10.00	1,22	-180,00
259	13/03/2017 10.00	1,02	-380,00
260	20/03/2017 10.00	0,94	-460,00
261	31/03/2017 10.00	0,74	-660,00
262	04/04/2017 10.00	0,69	-710,00
263	07/04/2017 10.00	0,66	-740,00
264	12/04/2017 10.00	0,64	-760,00
265	26/04/2017 10.00	0,33	-1070,00
266	02/05/2017 10.00	0,30	-1100,00
267	08/05/2017 11.00	0,28	-1120,00
268	16/05/2017 11.00	0,25	-1150,00
269	23/05/2017 11.00	0,27	-1130,00
270	01/06/2017 11.00	0,26	-1140,00
271	09/06/2017 11.00	0,24	-1160,00
272	16/06/2017 11.00	0,25	-1150,00
273	22/06/2017 11.00	0,29	-1110,00
274	27/06/2017 9.30	0,27	-1130,00
275	04/07/2017 9.30	0,28	-1120,00
276	11/07/2017 10.00	0,29	-1110,00
277	18/07/2017 10.00	0,31	-1090,00
278	25/07/2017 11.00	0,29	-1110,00
279	03/08/2017 11.00	0,30	-1100,00
280	08/08/2017 10.00	0,26	-1140,00
281	24/08/2017 10.00	0,33	-1070,00
282	30/08/2017 9.30	0,32	-1080,00
283	07/09/2017 10.30	0,35	-1050,00
284	14/09/2017 10.30	0,37	-1030,00
285	19/09/2017 10.30	0,40	-1000,00
286	26/09/2017 10.30	0,39	-1010,00
287	03/10/2017 10.30	0,41	-990,00
288	10/10/2017 10.30	0,38	-1020,00
289	19/10/2017 11.30	0,35	-1050,00
290	26/10/2017 12.30	0,33	-1070,00



SCHEMA UBICAZIONE


STAZIONE MUNICIPIO



\\ MU_PZ2



Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO
Tipo Strumento Piezometro a Tubo Aperto
Nome Tubo Piezometrico \\ \\ MU_PZ2
Data posa in opera 07/03/2011
Data lettura di zero 21/03/2011

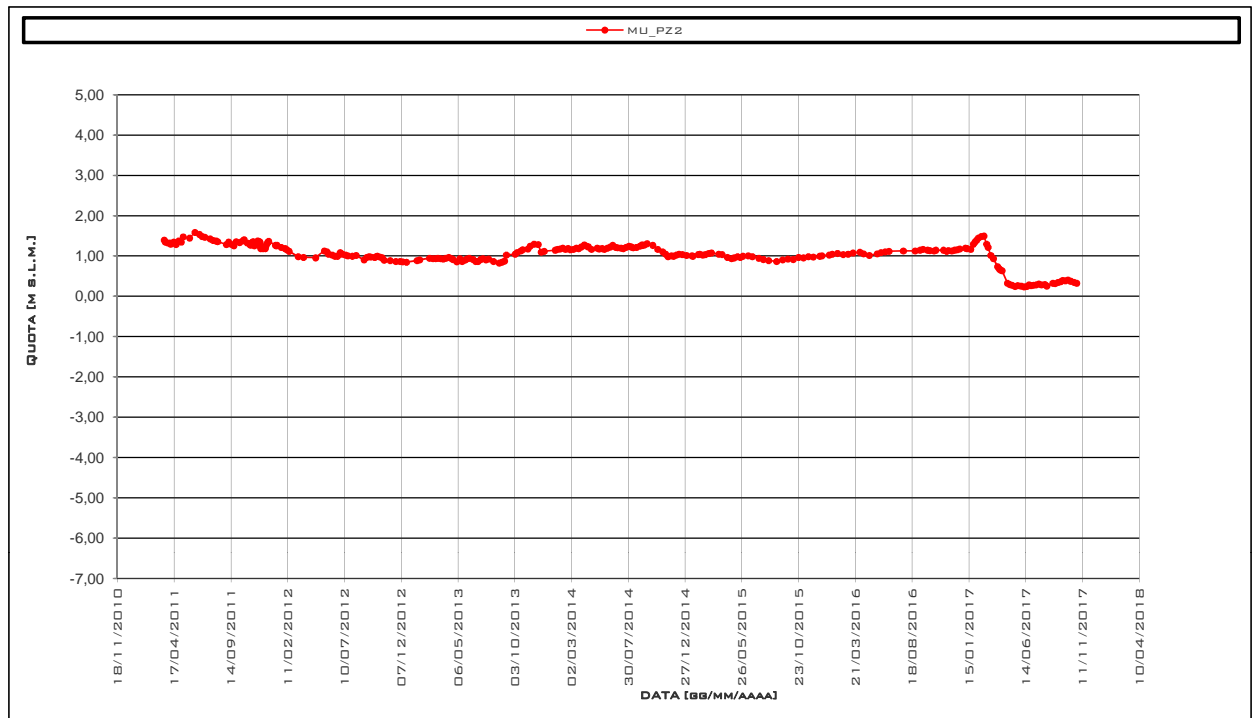

Piezometro MU_PZ3



Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X


Congruenza progettuale

C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza

NOTE

Le elaborazioni di seguito riportate includono lo storico delle misure.

	<p>LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</p> <p>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE MUNICIPIO</p>	<p>LM6 7FX 2D E 70</p> <p>Data: 27/10/17</p> <p>Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6</p> <p>TreEsse Engineering S.r.l.</p>
---	---	--



TABULATI

<p>Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO</p> <p>Tipo Strumento Piezometro a Tubo Aperto</p> <p>Nome Tubo Piezometrico \ \ MU_PZ3</p> <p>Data posa in opera 08/03/2011</p> <p>Data lettura di zero 21/03/2011</p>	<p>Ultima misura 290 in data 26/10/2017</p>
--	---

Letture n°	DATA	MU_PZ3	
		Boccaf. [m s.l.m.]	Cella [m s.l.m.]
		4,595	-20,605
		Quota [m.s.l.m.]	Spostam. [mm]
238	03/10/2016 9.00	0,98	130,00
239	14/10/2016 10.00	0,97	120,00
240	19/10/2016 10.00	0,99	140,00
241	08/11/2016 10.00	0,96	110,00
242	16/11/2016 11.30	0,94	90,00
243	21/11/2016 12.30	0,95	100,00
244	30/11/2016 12.30	0,96	110,00
245	07/12/2016 12.00	0,97	120,00
246	14/12/2016 12.00	1,00	150,00
247	21/12/2016 12.00	0,98	130,00
248	05/01/2017 10.00	0,96	110,00
249	09/01/2017 11.30	0,95	100,00
250	19/01/2017 12.00	0,99	140,00
251	26/01/2017 11.00	0,81	-40,00
252	30/01/2017 11.00	0,75	-100,00
253	03/02/2017 10.00	0,70	-150,00
254	08/02/2017 10.00	0,64	-210,00
255	16/02/2017 10.00	0,57	-280,00
256	23/02/2017 10.00	0,54	-310,00
257	02/03/2017 10.00	0,31	-540,00
258	06/03/2017 10.00	0,30	-550,00
259	13/03/2017 10.00	0,27	-570,00
260	20/03/2017 10.00	0,27	-580,00
261	31/03/2017 10.00	0,23	-620,00
262	04/04/2017 10.00	0,22	-630,00
263	07/04/2017 10.00	0,25	-600,00
264	12/04/2017 10.00	0,23	-610,00
265	26/04/2017 10.00	0,19	-660,00
266	02/05/2017 10.00	0,18	-670,00
267	08/05/2017 11.00	0,17	-680,00
268	16/05/2017 11.00	0,15	-700,00
269	23/05/2017 11.00	0,15	-690,00
270	01/06/2017 11.00	0,15	-700,00
271	09/06/2017 11.00	0,14	-710,00
272	16/06/2017 11.00	0,15	-690,00
273	22/06/2017 11.00	0,18	-670,00
274	27/06/2017 9.30	0,15	-700,00
275	04/07/2017 9.30	0,15	-690,00
276	11/07/2017 10.00	0,14	-710,00
277	18/07/2017 10.00	0,15	-700,00
278	25/07/2017 11.00	0,14	-710,00
279	03/08/2017 11.00	0,15	-690,00
280	08/08/2017 10.00	0,11	-740,00
281	24/08/2017 10.00	0,18	-670,00
282	30/08/2017 9.30	0,17	-680,00
283	07/09/2017 10.30	0,19	-650,00
284	14/09/2017 10.30	0,21	-640,00
285	19/09/2017 10.30	0,23	-610,00
286	26/09/2017 10.30	0,23	-620,00
287	03/10/2017 10.30	0,26	-590,00
288	10/10/2017 10.30	0,22	-630,00
289	19/10/2017 11.30	0,19	-650,00
290	26/10/2017 12.30	0,15	-690,00




SCHEMA UBICAZIONE


STAZIONE MUNICIPIO



\\ MU_PZ3



Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO
Tipo Strumento Piezometro a Tubo Aperto
Nome Tubo Piezometrico \\ MU_PZ3
Data posa in opera 08/03/2011
Data lettura di zero 21/03/2011

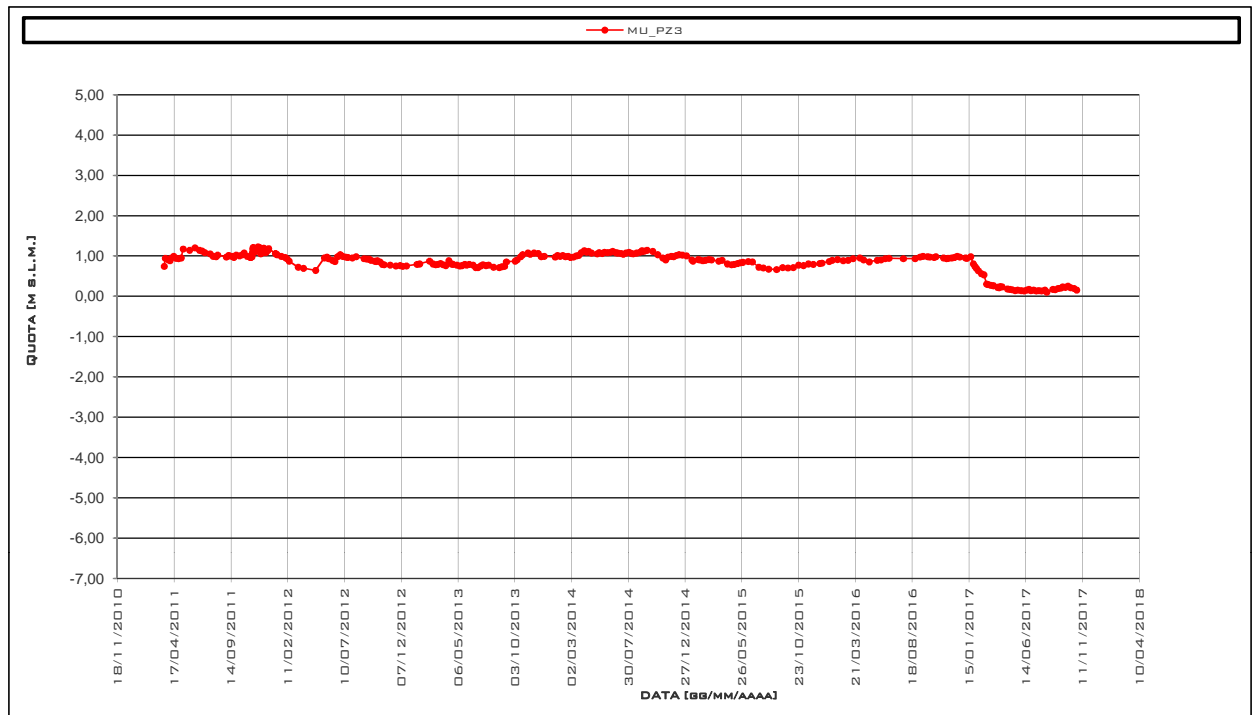

Piezometro

MU_PZ4



Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 - Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X


Congruenza progettuale

C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza

NOTE

Le elaborazioni di seguito riportate includono lo storico delle misure.

	<p>LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</p> <p>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE MUNICIPIO</p>	<p>LM6 7FX 2D E 70</p> <p>Data: 27/10/17</p> <p>Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6</p> <p>TreEsse Engineering S.r.l.</p>
---	---	--



TABULATI

<p>Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO</p> <p>Tipo Strumento Piezometro a Tubo Aperto</p> <p>Nome Tubo Piezometrico \ \ MU_PZ4</p> <p>Data posa in opera 09/03/2011</p> <p>Data lettura di zero 21/03/2011</p>	<p>Ultima misura 318 in data 26/10/2017</p>
--	---

Letture n°	DATA	MU_PZ4	
		Boccaf. [m s.l.m.]	Cella [m s.l.m.]
		11,913	-11,887
		Quota [m.s.l.m.]	Spostam. [mm]
266	03/10/2016 9.00	0,87	-1340,00
267	14/10/2016 10.00	0,84	-1370,00
268	19/10/2016 10.00	0,86	-1350,00
269	08/11/2016 10.00	0,90	-1310,00
270	16/11/2016 11.30	0,87	-1340,00
271	21/11/2016 12.30	0,89	-1320,00
272	30/11/2016 12.30	0,88	-1330,00
273	07/12/2016 12.00	0,78	-1430,00
274	14/12/2016 12.00	0,87	-1340,00
275	21/12/2016 12.00	0,90	-1310,00
276	05/01/2017 10.00	0,95	-1260,00
277	09/01/2017 11.30	0,97	-1240,00
278	19/01/2017 12.00	0,94	-1270,00
279	26/01/2017 11.00	0,76	-1450,00
280	30/01/2017 11.00	0,72	-1490,00
281	03/02/2017 10.00	0,64	-1570,00
282	08/02/2017 10.00	0,59	-1620,00
283	16/02/2017 10.00	0,55	-1660,00
284	23/02/2017 10.00	0,53	-1680,00
285	02/03/2017 10.00	0,49	-1720,00
286	06/03/2017 10.00	0,52	-1690,00
287	13/03/2017 10.00	0,50	-1710,00
288	20/03/2017 10.00	0,48	-1730,00
289	31/03/2017 10.00	0,51	-1700,00
290	04/04/2017 10.00	0,50	-1710,00
291	07/04/2017 10.00	0,51	-1700,00
292	12/04/2017 10.00	0,49	-1720,00
293	26/04/2017 10.00	0,45	-1760,00
294	02/05/2017 10.00	0,43	-1780,00
295	08/05/2017 11.00	0,40	-1810,00
296	16/05/2017 11.00	0,38	-1830,00
297	23/05/2017 11.00	0,39	-1820,00
298	01/06/2017 11.00	0,37	-1840,00
299	09/06/2017 11.00	0,34	-1870,00
300	16/06/2017 11.00	0,36	-1850,00
301	22/06/2017 11.00	0,41	-1800,00
302	27/06/2017 9.30	0,43	-1780,00
303	04/07/2017 9.30	0,46	-1750,00
304	11/07/2017 10.00	0,44	-1770,00
305	18/07/2017 10.00	0,46	-1750,00
306	25/07/2017 11.00	0,45	-1760,00
307	03/08/2017 11.00	0,44	-1770,00
308	08/08/2017 10.00	0,40	-1810,00
309	24/08/2017 10.00	0,43	-1780,00
310	30/08/2017 9.30	0,45	-1760,00
311	07/09/2017 10.30	0,48	-1730,00
312	14/09/2017 10.30	0,49	-1720,00
313	19/09/2017 10.30	0,51	-1700,00
314	26/09/2017 10.30	0,48	-1730,00
315	03/10/2017 10.30	0,50	-1710,00
316	10/10/2017 10.30	0,47	-1740,00
317	19/10/2017 11.30	0,45	-1760,00
318	26/10/2017 12.30	0,43	-1780,00




SCHEMA UBICAZIONE


STAZIONE MUNICIPIO




\\ MU_PZ4



Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO
Tipo Strumento Piezometro a Tubo Aperto
Nome Tubo Piezometrico \\ \\ MU_PZ4
Data posa in opera 09/03/2011
Data lettura di zero 21/03/2011

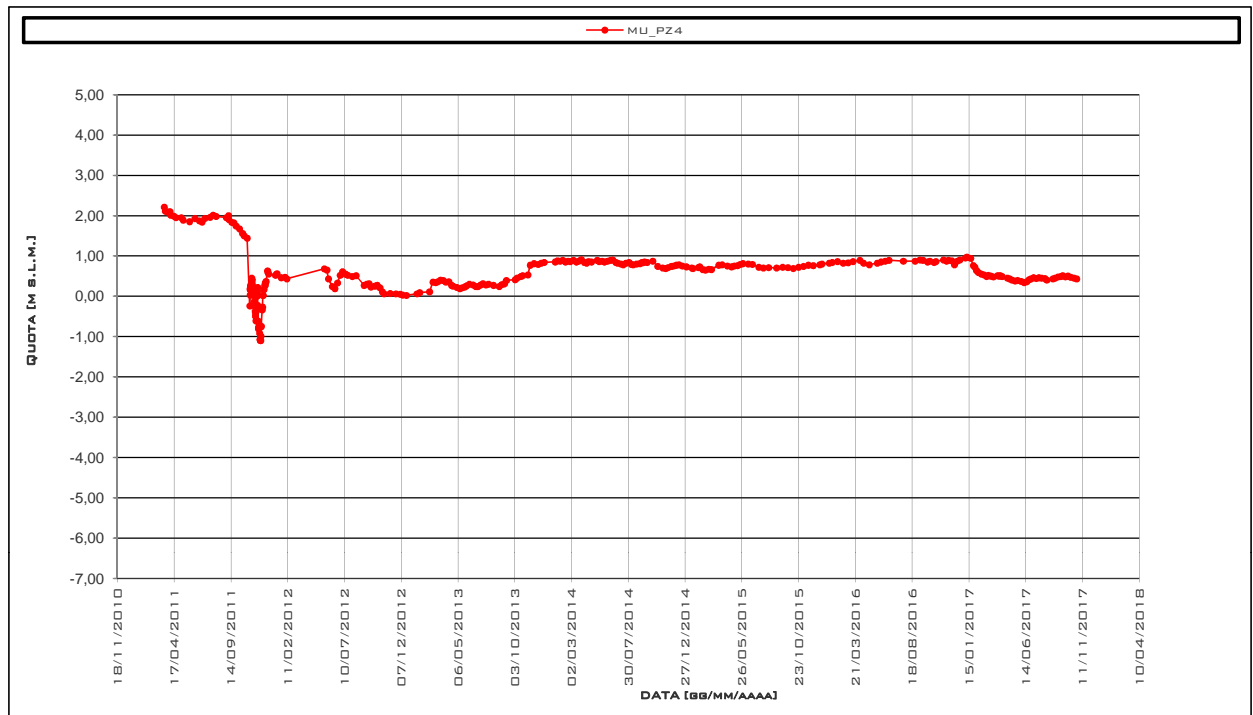

Piezometro MU_PZ5

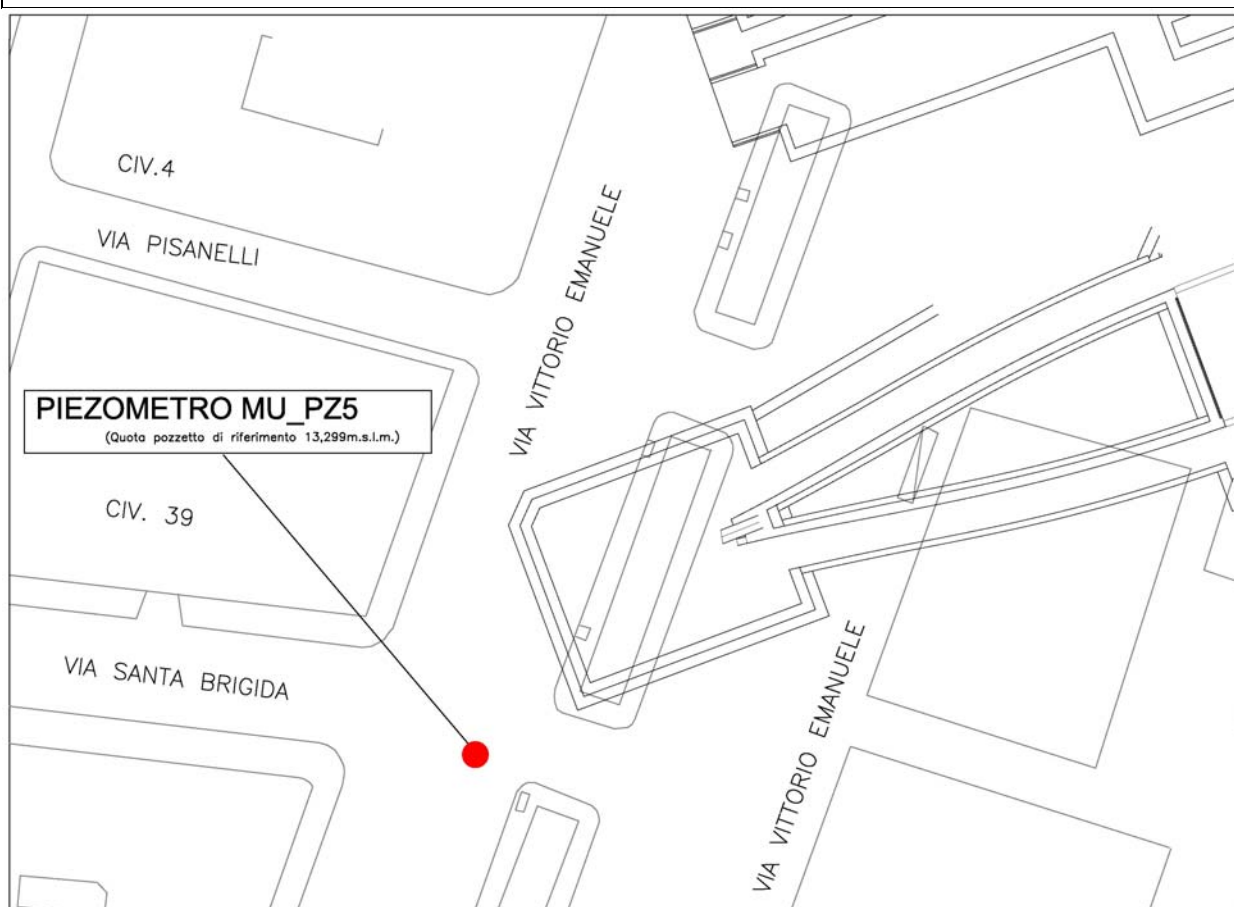

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X


Congruenza progettuale

C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza

NOTE

Le elaborazioni di seguito riportate includono lo storico delle misure.

	<p>LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</p> <p>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE MUNICIPIO</p>	<p>LM6 7FX 2D E 70</p> <p>Data: 27/10/17</p> <p>Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6</p> <p>TreEsse Engineering S.r.l.</p>
---	---	--



TABULATI

<p>Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO</p> <p>Tipo Strumento Piezometro a Tubo Aperto</p> <p>Nome Tubo Piezometrico \ \ MU_PZ5</p> <p>Data posa in opera 10/03/2011</p> <p>Data lettura di zero 21/03/2011</p>	<p>Ultima misura 313 in data 26/10/2017</p>
--	---

Letture n°	DATA	MU_PZ5	
		Boccaf. [m s.l.m.]	Cella [m s.l.m.]
		13,299	-4,401
		Quota [m.s.l.m.]	Spostam. [mm]
261	03/10/2016 9.00	-0,41	-2570,00
262	14/10/2016 10.00	-0,42	-2580,00
263	19/10/2016 10.00	-0,39	-2550,00
264	08/11/2016 10.00	-0,37	-2530,00
265	16/11/2016 11.30	-0,40	-2560,00
266	21/11/2016 12.30	-0,38	-2540,00
267	30/11/2016 12.30	-0,36	-2520,00
268	07/12/2016 12.00	-0,26	-2420,00
269	14/12/2016 12.00	-0,30	-2460,00
270	21/12/2016 12.00	-0,33	-2490,00
271	05/01/2017 10.00	-0,36	-2520,00
272	09/01/2017 11.30	-0,34	-2500,00
273	19/01/2017 12.00	-0,37	-2530,00
274	26/01/2017 11.00	-0,51	-2670,00
275	30/01/2017 11.00	-0,56	-2720,00
276	03/02/2017 10.00	-0,62	-2780,00
277	08/02/2017 10.00	-0,66	-2820,00
278	16/02/2017 10.00	-0,71	-2870,00
279	23/02/2017 10.00	-0,74	-2900,00
280	02/03/2017 10.00	-0,92	-3080,00
281	06/03/2017 10.00	-0,88	-3040,00
282	13/03/2017 10.00	-0,96	-3120,00
283	20/03/2017 10.00	-0,99	-3150,00
284	31/03/2017 10.00	-1,04	-3200,00
285	04/04/2017 10.00	-1,00	-3160,00
286	07/04/2017 10.00	-0,98	-3140,00
287	12/04/2017 10.00	-1,01	-3170,00
288	26/04/2017 10.00	-1,08	-3240,00
289	02/05/2017 10.00	-1,10	-3260,00
290	08/05/2017 11.00	-1,12	-3280,00
291	16/05/2017 11.00	-1,14	-3300,00
292	23/05/2017 11.00	-1,11	-3270,00
293	01/06/2017 11.00	-1,12	-3280,00
294	09/06/2017 11.00	-1,14	-3300,00
295	16/06/2017 11.00	-1,12	-3280,00
296	22/06/2017 11.00	-1,08	-3240,00
297	27/06/2017 9.30	-1,10	-3260,00
298	04/07/2017 9.30	-1,39	-3550,00
299	11/07/2017 10.00	-1,30	-3460,00
300	18/07/2017 10.00	-1,29	-3450,00
301	25/07/2017 11.00	-1,31	-3470,00
302	03/08/2017 11.00	-1,30	-3460,00
303	08/08/2017 10.00	-1,34	-3500,00
304	24/08/2017 10.00	-1,32	-3480,00
305	30/08/2017 9.30	-1,28	-3440,00
306	07/09/2017 10.30	-1,26	-3420,00
307	14/09/2017 10.30	-1,25	-3410,00
308	19/09/2017 10.30	-1,22	-3380,00
309	26/09/2017 10.30	-1,24	-3400,00
310	03/10/2017 10.30	-1,22	-3380,00
311	10/10/2017 10.30	-1,23	-3390,00
312	19/10/2017 11.30	-1,25	-3410,00
313	26/10/2017 12.30	-1,29	-3450,00



SCHEMA UBICAZIONE


STAZIONE MUNICIPIO




\\ MU_PZ5



Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO
Tipo Strumento Piezometro a Tubo Aperto
Nome Tubo Piezometrico \\ \\ MU_PZ5
Data posa in opera 10/03/2011
Data lettura di zero 21/03/2011

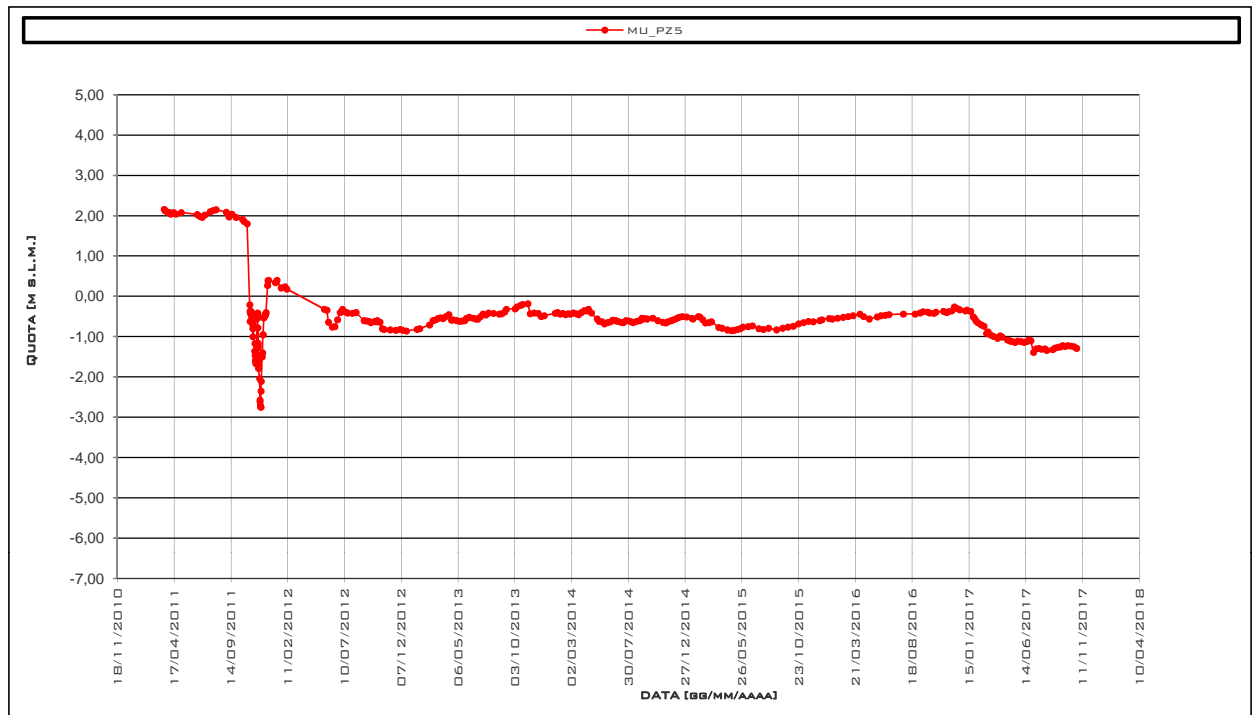

Piezometro MU_PZ6

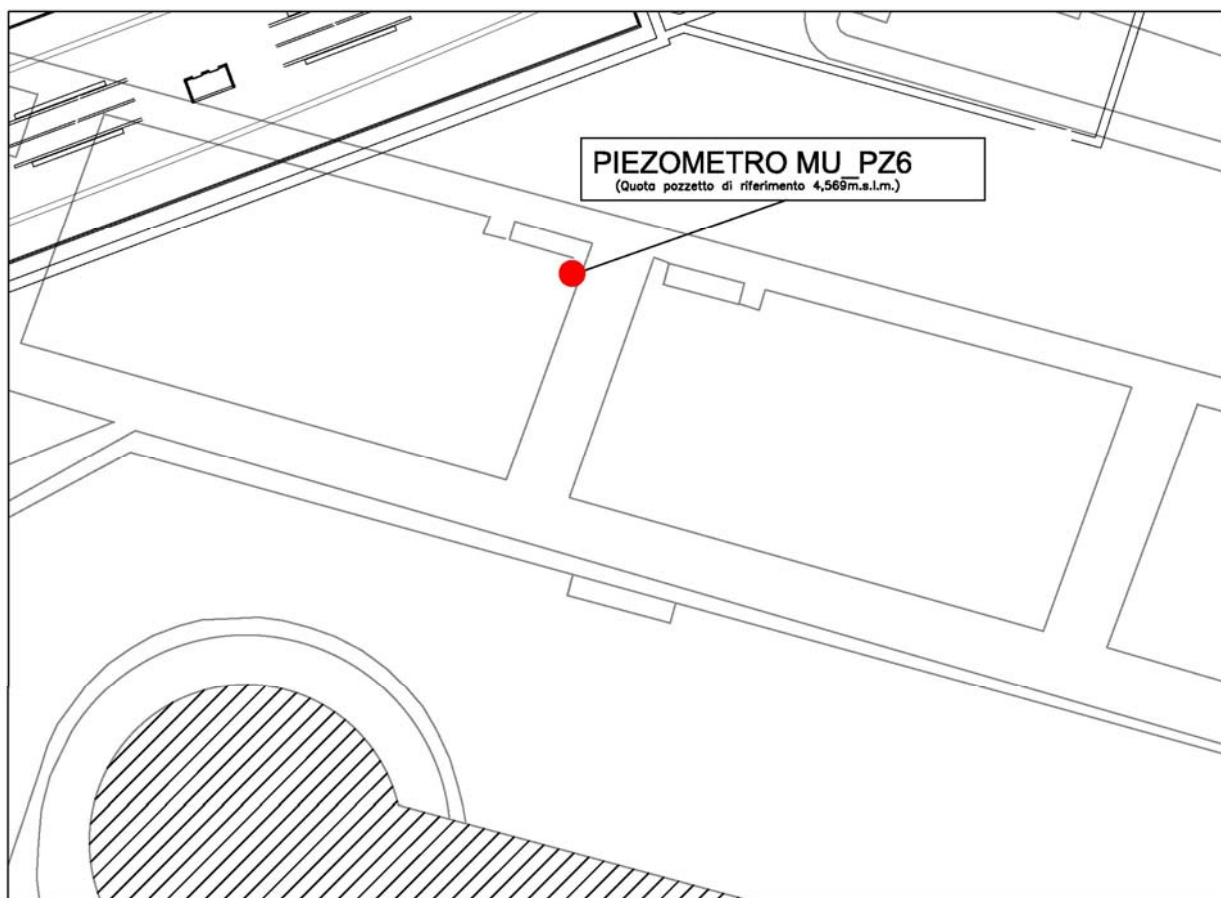

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X


Congruenza progettuale

C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza

NOTE

Le elaborazioni di seguito riportate includono lo storico delle misure.

	<p>LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO</p> <p>REPORT DELLE MISURE - STAZIONE MUNICIPIO</p>	<p>LM6 7FX 2D E 70</p> <p>Data: 27/10/17</p> <p>Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6</p> <p>TreEsse Engineering S.r.l.</p>
---	---	--



TABULATI

<p>Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO</p> <p>Tipo Strumento Piezometro a Tubo Aperto</p> <p>Nome Tubo Piezometrico \ \ MU_PZ6</p> <p>Data posa in opera 11/03/2011</p> <p>Data lettura di zero 24/03/2011</p>	<p>Ultima misura 285 in data 26/10/2017</p>
--	---

Letture n°	DATA	MU_PZ6	
		Boccaf. [m s.l.m.]	Cella [m s.l.m.]
		4,569	-8,431
		Quota [m.s.l.m.]	Spostam. [mm]
233	27/09/2016 9.00	-0,74	-2010,00
234	03/10/2016 9.00	-0,76	-2030,00
235	14/10/2016 10.00	-0,77	-2040,00
236	19/10/2016 10.00	-0,80	-2070,00
237	08/11/2016 10.00	-0,74	-2010,00
238	16/11/2016 11.30	-0,84	-2110,00
239	21/11/2016 12.30	-0,83	-2100,00
240	30/11/2016 12.30	-0,85	-2120,00
241	07/12/2016 12.00	-0,83	-2100,00
242	14/12/2016 12.00	-0,86	-2130,00
243	21/12/2016 12.00	-0,89	-2160,00
244	05/01/2017 10.00	-0,85	-2120,00
245	09/01/2017 11.30	-0,87	-2140,00
246	19/01/2017 12.00	-0,81	-2080,00
247	26/01/2017 11.00	-0,96	-2230,00
248	30/01/2017 11.00	-1,02	-2290,00
249	03/02/2017 10.00	-1,09	-2360,00
250	08/02/2017 10.00	-1,14	-2410,00
251	16/02/2017 10.00	-1,19	-2460,00
252	23/02/2017 10.00	-1,23	-2500,00
253	02/03/2017 10.00	-1,39	-2660,00
254	06/03/2017 10.00	-1,51	-2780,00
255	13/03/2017 10.00	-1,60	-2870,00
256	20/03/2017 10.00	-1,64	-2910,00
257	31/03/2017 10.00	-1,73	-3000,00
258	04/04/2017 10.00	-1,77	-3040,00
259	07/04/2017 10.00	-1,82	-3090,00
260	12/04/2017 10.00	-1,83	-3100,00
261	26/04/2017 10.00	-1,92	-3190,00
262	02/05/2017 10.00	-1,95	-3220,00
263	08/05/2017 11.00	-1,96	-3230,00
264	16/05/2017 11.00	-1,99	-3260,00
265	23/05/2017 11.00	-1,98	-3250,00
266	01/06/2017 11.00	-1,96	-3230,00
267	09/06/2017 11.00	-1,99	-3260,00
268	16/06/2017 11.00	-1,97	-3240,00
269	22/06/2017 11.00	-1,95	-3220,00
270	27/06/2017 9.30	-1,93	-3200,00
271	04/07/2017 9.30	-1,91	-3180,00
272	11/07/2017 10.00	-1,92	-3190,00
273	18/07/2017 10.00	-1,90	-3170,00
274	25/07/2017 11.00	-1,91	-3180,00
275	03/08/2017 11.00	-1,89	-3160,00
276	08/08/2017 10.00	-1,93	-3200,00
277	30/08/2017 9.30	-1,94	-3210,00
278	07/09/2017 10.30	-1,93	-3200,00
279	14/09/2017 10.30	-1,92	-3190,00
280	19/09/2017 10.30	-1,90	-3170,00
281	26/09/2017 10.30	-1,93	-3200,00
282	03/10/2017 10.30	-1,91	-3180,00
283	10/10/2017 10.30	-1,94	-3210,00
284	19/10/2017 11.30	-1,97	-3240,00
285	26/10/2017 12.30	-2,03	-3300,00



SCHEMA UBICAZIONE


STAZIONE MUNICIPIO



\\ MU_PZ6



Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO
Tipo Strumento Piezometro a Tubo Aperto
Nome Tubo Piezometrico \\ \\ MU_PZ6
Data posa in opera 11/03/2011
Data lettura di zero 24/03/2011

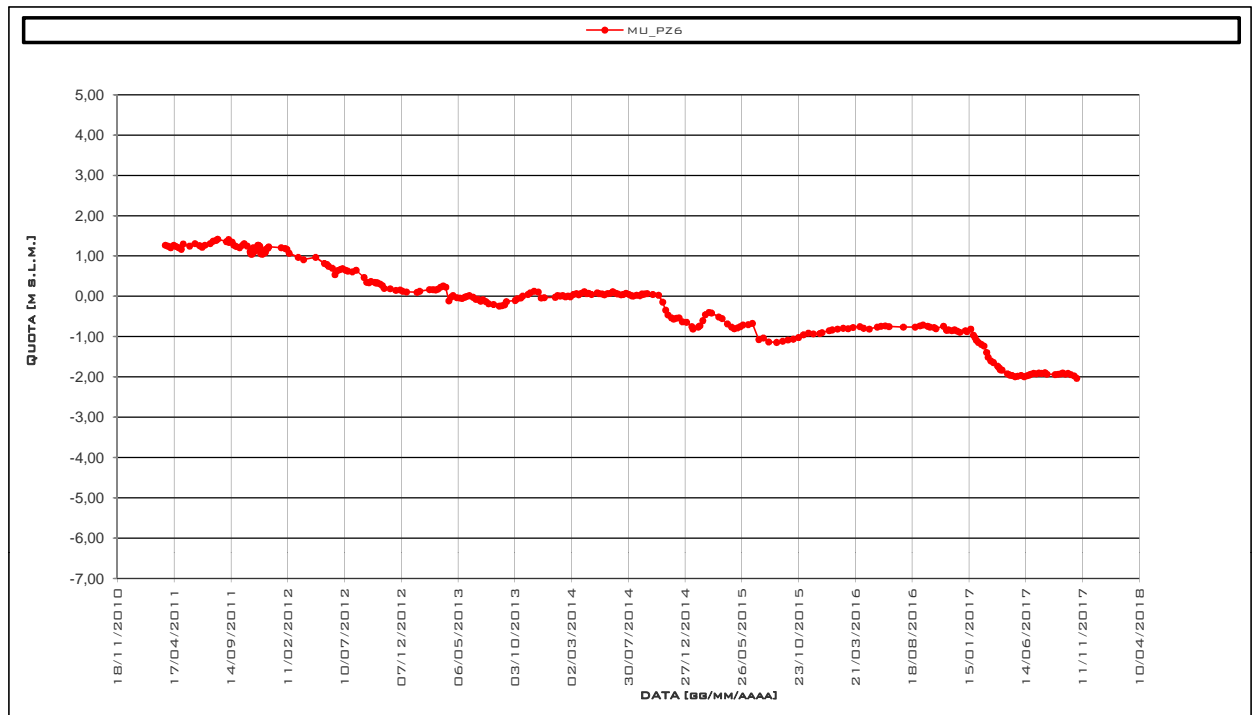

Ansaldo STS A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO REPORT DELLE MISURE - STAZIONE MUNICIPIO	LM6 7FX 2D E 70 Data: 27/10/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	--	---

10. MISURE TOPOGRAFICHE - CAPISALDI

I capisaldi previsti per il monitoraggio topografico a P.C. saranno tutti del tipo “CSB”(chiodo topografico), per quelli ricadenti nelle aree soggette a passaggio di mezzi, di tipo “CSA” (basetta topografica posta all’interno di un pozzetto carrabile). I capisaldi a p.c. posti a tergo degli edifici monitorati sono collocati in corrispondenza delle staffe livellometriche installate sugli edifici in modo da offrire una facile interpolazione fra i dati derivanti dalla subsidenza del terreno con quella delle interferenze. La misurazione verrà effettuata tramite livello elettronico.

Ansaldo STS A Hitachi Group Company	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO ESECUTIVO OPERE CIVILI - MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO REPORT DELLE MISURE - STAZIONE MUNICIPIO	LM6 7FX 2D E 70 Data: 27/10/17 Metropolitana di Napoli A.T.I. LM6 TreEsse Engineering S.r.l.
---	--	---

Tabella riepilogativa per i capisaldi installati in cantiere

NOME	TIPOLOGIA STRUM.	DATA INSTALLAZIONE	DISPONIBILITA' LETTURA			NOTE
			DATA LETTURA DI ZERO	PERIODO INTERRUZIONE	DATA FINE ATTIVITA'	
MU_CS01_39	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS02_39	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS03_39	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS04_39	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS05_39	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS06_39	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS07_39	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS08_39	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS09_39	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS10_39	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS11_39	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS12_4	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS13_4	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS14_4	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS15_4	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS16_4	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS17_4	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS18_4	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS19_4	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS20_45	CAPOSALDO	05/04/11	05/04/11			(*)
MU_CS21_45	CAPOSALDO	05/04/11	05/04/11			(*)
MU_CS22_45	CAPOSALDO	05/04/11	05/04/11			(*)
MU_CS23_45	CAPOSALDO	05/04/11	05/04/11			(*)
MU_CS24_45	CAPOSALDO	05/04/11	05/04/11			(*)
MU_CS25_45	CAPOSALDO	05/04/11	05/04/11			(*)
MU_CS26_45	CAPOSALDO	05/04/11	05/04/11			(*)
MU_CS27_45	CAPOSALDO	05/04/11	05/04/11			(*)
MU_CS28_45	CAPOSALDO	05/04/11	05/04/11			(*)

(*) I dati topografici rilevati e distribuiti dall'ATI, relativi al periodo di pertinenza del presente report, non contengono misure per lo strumento.

Capisaldi MU_CS01 - 28

Affidabilità strumentale
A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X

Congruenza progettuale
C.T. ATI LM6 – C.T. Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza

NOTE

Al periodo di pertinenza del presente report, l'ATI non ha trasmesso alcuna misura per gli strumenti.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report DIC 12-GEN 2013 con codifica: LM6 7FX 2D E 18

METROPOLITANA LINEA 6 - RESOCONTO MANUTENZIONE TREESSE ENGINEERING S.R.L.



SETTEMBRE 2017

STAZIONE ARCO MIRELLI

COD.STAZIONE	COD. STRUM.	TIPOLOGIA STRUM.	METRI da p.c.	18/9	19/9	20/9	21/9	22/9	ESITO	TOT MESE	TOTALE
AM	AM_PZ1_P	PIEZ. CASAGRANDE	28							0	13
AM	AM_PZ2_S	PIEZ. CASAGRANDE	10							0	13
AM	AM_PZ2_P	PIEZ. CASAGRANDE	28							0	13
AM	AM_PZ4_P	PIEZ. CASAGRANDE	28							0	1
AM	AM_PZ4_S	PIEZ. CASAGRANDE	10							0	1
AM	AM_PZ5_S	PIEZ. CASAGRANDE	10							0	12
AM	AM_PZ5_P	PIEZ. CASAGRANDE	28							0	15
AM	AM_PZ6_S	PIEZ. CASAGRANDE	10							0	11
AM	AM_PZ6_P	PIEZ. CASAGRANDE	28							0	13
AM	AM_PZ7_S	PIEZ. CASAGRANDE	10					1	P	1	12
AM	AM_PZ7_P	PIEZ. CASAGRANDE	28					1	P	1	12
AM	AM_EI1/ES1	ESTENSO-INCLINOMETRO	50/50							0	10
AM	AM_EI3 bis/ES3 bis	ESTENSO-INCLINOMETRO	50/50							0	8
AM	AM_IN1_1	INCLINOMETRO	41/41					1	P	1	12
AM	AM_IN2_1	INCLINOMETRO	49/49				1		P	1	9
AM	AM_IN_P5_1	INCLINOMETRO	39/39							0	6
AM	AM_IN_P17_1	INCLINOMETRO	38/38				1		P	1	13
AM	AM_IN_P18	INCLINOMETRO	40/40				1		P	1	14
AM	AM_IN_P31_1	INCLINOMETRO	31/31							0	4
AM	AM_IN_P32_1	INCLINOMETRO	38/38							0	4
AM	AM_IN_P61_1	INCLINOMETRO	37/37							0	7
AM	AM_IN_P62_1	INCLINOMETRO	36/36							0	9
AM	AM_IN_P76	INCLINOMETRO	39/39							0	10
AM	AM_IN_P77	INCLINOMETRO	40/40							0	6
AM	AM_IN_P87	INCLINOMETRO	32/42							0	5
AM	AM_IN_P104	INCLINOMETRO	40/40							0	13
AM	AM_IN_P105	INCLINOMETRO	40/40							0	14
AM	AM_IN1	INCLINOMETRO	0/50							0	0
AM	AM_IN2	INCLINOMETRO	0/50							0	0
AM	AM_IN_P5	INCLINOMETRO	0/40							0	0
AM	AM_IN_P17	INCLINOMETRO	29/40							0	1
AM	AM_IN_P31	INCLINOMETRO	0/35							0	0
AM	AM_IN_P32	INCLINOMETRO	40/40							0	1
AM	AM_IN_P61	INCLINOMETRO	0/40							0	0
AM	AM_IN_P62	INCLINOMETRO	4/40							0	0
AM	AM_EI2/ ES2	ESTENSO-INCLINOMETRO	0/50							0	0
AM	AM_PZ8 (KOLLHOFF)	PIEZ. TUBO APERTO	25							0	0
AM	AM_PZ9 (KOLLHOFF)	PIEZ. TUBO APERTO	25							0	0
AM	AM_PZ10 (KOLLHOFF)	PIEZ. TUBO APERTO	25							0	0
AM	AM_PZ1_S	PIEZ. CASAGRANDE	10							0	1
AM	AM_PZ1_P	PIEZ. CASAGRANDE	28							0	1
AM	AM_PZ1_S	PIEZ. CASAGRANDE	10							0	4
AM	AM_PZ11_S	PIEZ. CASAGRANDE	28							0	2
AM	AM_PZ11_P	PIEZ. CASAGRANDE	36							0	2
AM	AM_PZ12_S	PIEZ. CASAGRANDE	24							0	4
AM	AM_PZ12_P	PIEZ. CASAGRANDE	32							0	4
AM	AM_PZ13_S	PIEZ. CASAGRANDE	27							0	3
AM	AM_PZ13_P	PIEZ. CASAGRANDE	34							0	3
AM	AM_PZ14_S	PIEZ. CASAGRANDE	27							0	4
AM	AM_PZ14_P	PIEZ. CASAGRANDE	35							0	5
AM	AM_PZ15_S	PIEZ. CASAGRANDE	23							0	4
AM	AM_PZ15_P	PIEZ. CASAGRANDE	30							0	4
AM	AM_PZ16_S	PIEZ. CASAGRANDE	23							0	3
AM	AM_PZ16_P	PIEZ. CASAGRANDE	30							0	3

METROPOLITANA LINEA 6 - RESOCONTO MANUTENZIONE TREESSE ENGINEERING S.R.L.

AM	AM_PZ17_S	PIEZ. CASAGRANDE	25							0	3
AM	AM_PZ17_P	PIEZ. CASAGRANDE	30							0	3
AM	AM_PZ18_S	PIEZ. CASAGRANDE	29							0	3
AM	AM_PZ18_P	PIEZ. CASAGRANDE	31							0	3
AM	AM_PZ19_S	PIEZ. CASAGRANDE	28							0	3
AM	AM_PZ19_P	PIEZ. CASAGRANDE	35							0	3
AM	AM_PZ20_S	PIEZ. CASAGRANDE	29							0	3
AM	AM_PZ20_P	PIEZ. CASAGRANDE	34							0	3
AM	AM_PZ21_S	PIEZ. CASAGRANDE	29							0	0
AM	AM_PZ21_P	PIEZ. CASAGRANDE	32							0	0
AM	AM_PZ22_S	PIEZ. CASAGRANDE	29							0	0
AM	AM_PZ22_P	PIEZ. CASAGRANDE	32							0	0
AM	AM_PZ23_S	PIEZ. CASAGRANDE	29							0	0
AM	AM_PZ23_P	PIEZ. CASAGRANDE	32							0	0
AM	AM_PZ24_S	PIEZ. CASAGRANDE	30							0	0
AM	AM_PZ24_P	PIEZ. CASAGRANDE	29							0	0
AM	AM_IN_P6	INCLINOMETRO	3/44							0	1
AM	AM_IN_P88	INCLINOMETRO	08/36							0	1

Note:

Gli strumenti AM_EI3 bis/ES3 bis (ESTENSO-INCLINOMETRO) e AM_EI1/AM_ES1 (ESTENSO-INCLINOMETRO) risultano leggibili con la sonda inclinometrica ma con la sonda estensimetrica. Pertanto nel programma di monitoraggio verranno eseguite le sole letture inclinometriche.

STAZIONE MUNICIPIO

COD.STAZIONE	COD. STRUM.	TIPOLOGIA STRUM.	METRI da p.c.	18/9	19/9	20/9	21/9	22/9	ESITO	TOT MESE	TOTALE
MU	MU_PZ1	PIEZ. TUBO APERTO	16,5							0	6
MU	MU_PZ2	PIEZ. TUBO APERTO	25,5							0	10
MU	MU_PZ3	PIEZ. TUBO APERTO	25,20							0	9
MU	MU_PZ4	PIEZ. TUBO APERTO	23,80							0	13
MU	MU_PZ5	PIEZ. TUBO APERTO	17,70							0	14
MU	MU_PZ6	PIEZ. TUBO APERTO	13							0	12
MU	MU_EI1/ES1	ESTENSO-INCLINOMETRO	35/35							0	8
MU	MU_EI2/ES2	ESTENSO-INCLINOMETRO	34/34							0	7
MU	MU_EI3/ES3	ESTENSO-INCLINOMETRO	34/34							0	6
MU	MU_EI4/ES4	ESTENSO-INCLINOMETRO	35/35							0	5

CAMERE DI VENTILAZIONE

TORRETTA

COD.STAZIONE	COD. STRUM.	TIPOLOGIA STRUM.	METRI da p.c.	18/9	19/9	20/9	21/9	22/9	ESITO	TOT MESE	TOTALE
CDV_TOR	CDV_TOR_EI1/ES1	ESTENSO-INCLINOMETRO	31/31							0	3
CDV_TOR	CDV_TOR_EI2/ES2	ESTENSO-INCLINOMETRO	27/27							0	3
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ1_P	PIEZ. CASAGRANDE	30			1			P	1	5
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ1_S	PIEZ. CASAGRANDE	21			1			P	1	5
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ2_P	PIEZ. CASAGRANDE	30			1			P	1	4
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ2_S	PIEZ. CASAGRANDE	21			1			P	1	4
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ3_P	PIEZ. CASAGRANDE	30							0	4
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ3_S	PIEZ. CASAGRANDE	21							0	4
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ4_P	PIEZ. CASAGRANDE	30							0	4
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ4_S	PIEZ. CASAGRANDE	21							0	4
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ5_P	PIEZ. CASAGRANDE	35							0	4

METROPOLITANA LINEA 6 - RESOCONTO MANUTENZIONE TREESSE ENGINEERING S.R.L.

S.MARIA IN PORTICO

COD.STAZIONE	COD. STRUM.	TIPOLOGIA STRUM.	METRI da p.c.	18/9	19/9	20/9	21/9	22/9	ESITO	TOT MESE	TOTALE
CDV_SMP	CDV_SMP_EI1/ES1	ESTENSO-INCLINOMETRO	30/30							0	1
CDV_SMP	CDV_SMP_PZ1_P	PIEZ. CASAGRANDE	30	1					P	1	2
CDV_SMP	CDV_SMP_PZ1_S	PIEZ. CASAGRANDE	21	1					P	1	2
CDV_SMP	CDV_SMP_PZ2_P	PIEZ. CASAGRANDE	30							0	2
CDV_SMP	CDV_SMP_PZ2_S	PIEZ. CASAGRANDE	21	1					P	1	2
CDV_SMP	CDV_SMP_PZ3_P	PIEZ. CASAGRANDE	30		1				P	1	2
CDV_SMP	CDV_SMP_PZ3_S	PIEZ. CASAGRANDE	21		1				P	1	2

VITTORIA

COD.STAZIONE	COD. STRUM.	TIPOLOGIA STRUM.	METRI da p.c.	18/9	19/9	20/9	21/9	22/9	ESITO	TOT MESE	TOTALE
CDV_VIT	CDV_VIT_PZ1	PIEZ. CASAGRANDE	24							0	2
CDV_VIT	CDV_VIT_PZ2	PIEZ. CASAGRANDE	24	1					P	1	6

LEGENDA

	IN ROSSO STRUMENTO FUORI USO (per il quale è inutile programmare attività di manutenzione e monitoraggio)
	IN VERDE STRUMENTO A FUNZIONALITA' RIDOTTA
	IN ARANCIO STRUMENTO SOSTITUITO
P	ESITO POSITIVO
N	ESITO NEGATIVO
Video	VIDEOISPEZIONE ESEGUITA

NOTE

Gli strumenti sottoposti a manutenzione nel periodo indicato, dopo il trattamento di spurgo, lavaggio a pressione, verifica dell'accessibilità tubi di misura, hanno migliorato la loro funzionalità. Superando le prove con esito positivo.

Per i piezometri tipo Casagrande sotto riportati, si evince la scarsa comunicazione fra i tubi di misura, che indica un ridotto ricircolo dell'acqua all'interno della cella. Dalla risposta strumentale ottenuta durante le fasi di manutenzione, si suppone un funzionamento assimilabile più a piezometri tubo aperto che non a celle tipo Casagrande, ciò potrebbe comportare tempi di risposta più lunghi. Tuttavia questi strumenti continuano a fornire misure correlabili con gli altri strumenti funzionanti, continueranno ad essere regolarmente inseriti nel programma di monitoraggio e di manutenzione.
