



**NOTE GENERALI :**

NEI PUNTI PIU' RIPIDI E PIU' LUNGI DELLA SCALINATA SONO PREVISTE TAVOLATI DI LEGNO DOTATI DI LISTELLI FERMACADUTA PER LO SPOSTAMENTO DEI MATERIALI TRAMITE CARRIOLE ELETTRICHE

UTILIZZO DI UN SERBATOIO MOBILE DI ACQUA PER LA RIMOZIONE DEI DEPOSITI SUPERFICIALI SUI PARAMENTI MURARI MEDIANTE LAVAGGIO DELLE SUPERFICIE

**CAMPO BASE 1**



NELLE AREE POSTE ALL'INIZIO E AL TERMINE DELLA SCALINATA SONO PREVISTI CAMPI BASE OLTRE CHE APPOSITE AREE DI STOCCAGGIO DI MATERIALI E RIFIUTI, NEL RISPETTO DEGLI INGRESSI CHE SI AFFACCIANO LUNGO LA VIA.

**AREE STOCCAGGIO INTERMEDIO**



DOPO LA DEMOLIZIONE DEI GRADINI DI ACCESSO ALLE ABITAZIONI RIPRISTINARE GLI STESSI IN MANIERA PROVVISORIA CON TAVOLATI DI LEGNO E SABBIA TIPOLOGICO PER GARANTIRE L'ACCESSO AI FABBRICATI IN CONDIZIONI DI DISLIVELLO SIGNIFICATIVO

**INQUADRAMENTO INIZIO SECONDO TRATTO**




**CAMPO INTERMEDIO**



QUANDO LA VIA OGGETTO DI INTERVENTO SI INTERROMPE PER L'ATTRAVERSAMENTO DI UNA STRADA DI INTENSO TRAFFICO E' NECESSARIO INSTALLARE UN CAMPO OPERATIVO E ISOLARE L'AREA DI LAVORO, NON OCCUPANDO E INTERRUPELLO LA VIABILITA' ESISTENTE

**CAMPO BASE 2**



NELLE AREE POSTE ALL'INIZIO E AL TERMINE DELLA SCALINATA SONO PREVISTI CAMPI BASE OLTRE CHE APPOSITE AREE DI STOCCAGGIO DI MATERIALI E RIFIUTI, NEL RISPETTO DEGLI INGRESSI CHE SI AFFACCIANO LUNGO LA VIA.

lato valle del percorso


LEGENDA			DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	
<b>DELIMITAZIONI</b>	<b>MACCHINE DI CANTIERE</b>	<b>APPRETTAMENTI ED OPERE PROVVISORIALI</b>	<b>LAVORI STRADALI E PAVIMENTAZIONI</b>	<b>LAVORI PARAMENTI MURARI</b>
Delimitazione intervento	Gru mobile	Passerelle	Pulizia di pozzi di ispezione	Esecuzione di prelievo di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio e saggio stratigrafico
Del. di c. con pannelli di rete metallica su elementi di calcestruzzo	Bobcat	Parapetto	Pulitura ad acqua e/o con mezzi meccanici e manuali	Spicconatura accurata di intonaci degradati e non compatibili con il supporto
Del. di c. in rete plastificata in pvc (su supporto generico)	Carrello elevatore con conducente a bordo	Punto luce	Rimozione di strati di sciatto e graffi mediante idrosabbiatrice	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione
Del. di c. in rete antipolvere (su supporto generico)	Traspallet manuale	Estintore	Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profili di ferro	Disinfestazione di arbusti mediante recisione delle parti aeree e infiltrazioni di biocida
Del. di c. con New-Jersey in plastica zavorrabile	Cariola elettrica con retromarcia	Cassetta del pronto soccorso/pacchetto di medicazione	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso	Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profili di ferro (compresi di chiodi, staffe ecc)
Delimitazione transito provvisorio composto da colonnina e catenella	Betoniera a bicchiere	Punto di ancoraggio su linee vita classe C	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di conglomerato cementizio	Operazioni di rimozione di stuccature vecchie e microstuccature nuove
Trasenna modulare con pannello rifrangente	Sega circolare su banco	Punto di ancoraggio su goliare classe A	Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietrastra	Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici (ad es. graffi)
Quadrangolare con pannello rifrangente			Smontaggio e sostituzione di vecchi cordoni in pietrastra non riutilizzabili	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione e consolidamento dei giunti
<b>ACCESSI E BARACCAMENTI</b>	<b>UTENZE E LINEE ESISTENTI</b>	<b>AREE OPERATIVE</b>	Rimozione di basoli eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo	Ripresa di muratura mediante sostituzione parziale di materiale con metodo scuci-cuci
Cartello di cantiere e struttura di sostegno	Quadro elettrico principale di cantiere (ASC)	Area stoccaggio materiali	Scavo e piano di posa	Revisione e restauro di paramento murario
Box di cantiere (n° 1)	Quadro elettrico secondario di cantiere	Area stoccaggio opere provvisionali	Posa in opera di vecchie basole rimosse	Protezione superficiale della pietra con stesura di scialbo pigmentato o idrossido di calcio
Bagno chimico portatile (n°3)	Gruppo elettrogeno	Area in fase di lavorazione	Nuova pavimentazione in lastre di pietra dura	Nuovo intonaco con malta composta da grassello di calce e polvere di tufo
Serbatoio per il lavaggio delle mani	Punto di approvvigionamento idrico	Area di deposito dei manufatti all'interno dell'area di cantiere	Disinfestazione preventiva	Restauro delle superfici in piperno
	Punto di approvvigionamento elettrico	Area pedonale interna al cantiere	Operazioni di rimozione di stuccature vecchie e microstuccature nuove	Risanamento delle copertine in calcestruzzo
	Cavi elettrici di cantiere			Realizzazione di nuove copertine in malta idraulica e in laterizio
				Realizzazione di nuove copertine in laterizio

**NOTE GENERALI :**


NEI PUNTI PIU' RIPIDI E PIU' LUNGI DELLA SCALINATA SONO PREVISTE TAVOLATI DI LEGNO DOTATI DI LISTELLI FERMACADUTA PER LO SPOSTAMENTO DEI MATERIALI TRAMITE CARRIOLE ELETTRICHE. UTILIZZO DI UN SERBATOIO MOBILE DI ACQUA PER LA RIMOZIONE DEI DEPOSITI SUPERFICIALI SUI PARAMENTI MURARI MEDIANTE LAVAGGIO DELLE SUPERFICIE.

lato monte del percorso  
lato valle del percorso

**SEZIONE LONGITUDINALE**

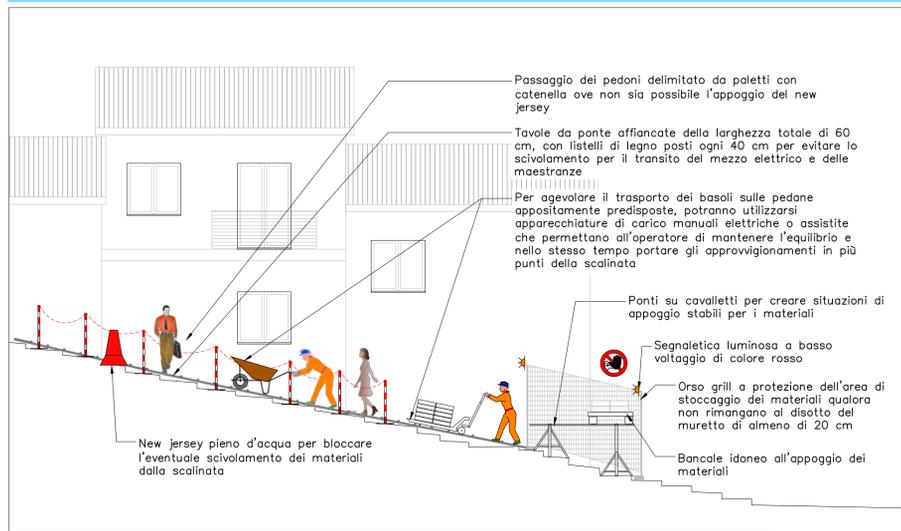


**SEZIONE LONGITUDINALE**

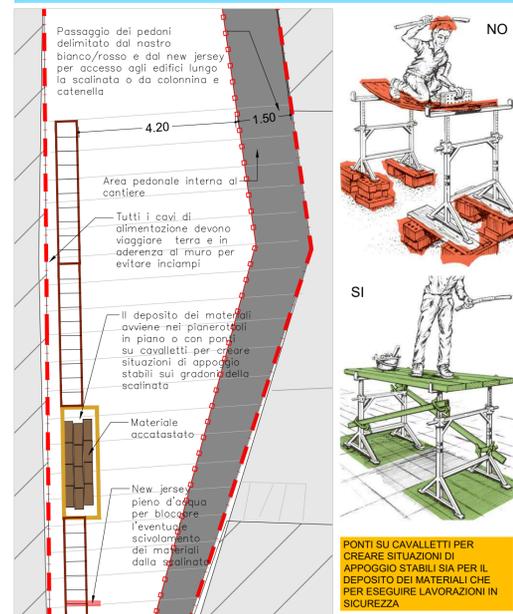


NEL CASO DI LAVORAZIONI IN CUI SIA PREVISTO L'USO DEL TRABATTELLO, SARA' POSSIBILE UTILIZZARE TRABATELLI CON I PIEDINI REGOLABILI DA POSIZIONARE LUNGO LE SCALINATE, IN TAL CASO ANDRA' SEMPRE GARANTITO IL PASSAGGIO AI RESIDENTI E GARANTI GLI ACCESSI ALLE ABITAZIONI PRIVATE.

**TIPOLOGICO MONTAGGIO O MANUTENZIONE DEI PARAPETTI**

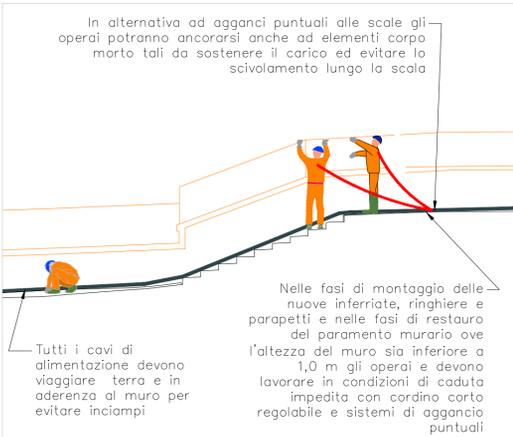

**SITUAZIONE TIPO PER LAVORAZIONI IN PROSSIMITA' DEGLI ACCESSI ALLA SCALINATA - INIZIO E FINE CANTIERE, INTERRUZIONE STRADALE**

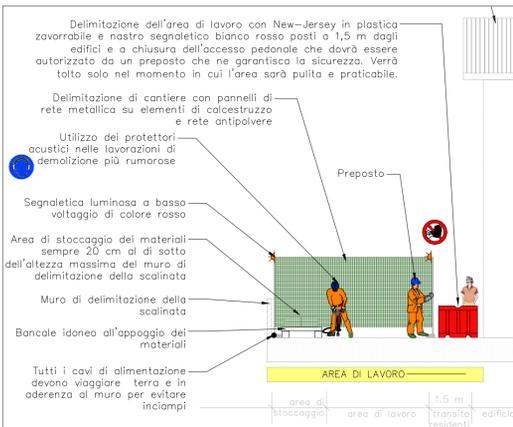

COMMITTENTE  
**COMUNE DI NAPOLI**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
arch. Francesca Spera

**CITTÀ VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE**

MANDATARIA:  
**sab**  
gruppo esp

Via Plevatola, 15  
08129 - Perugia  
info@sabeng.it www.sabst.eu

MANDANTI:  
B5 S.r.l.  
Via Sant'Arma dei Lombardi, 16  
80134 - Napoli - info@b5st.it

Studio Ing. Alberto Capitanucci

Arch. Pierpaolo Papi  
Arch. Francesco Pecorari  
Arch. Sergio Tucci  
Arch. Francesco Fucelli  
Arch. Luca Persichini

Ing. Marco Adriani  
Ing. Vincenzo Pajia  
Ing. Catiuscia Maiggi  
Ing. Barbara Bottausci

ELABORATO  
**Scurezza**  
Planimetria di cantiere

N° ELAB. **05-GZE001/01** NO. DOC. COD. COBA. CODE OPER. CNAP.001-01-01.19.ESE

SCALA \_\_\_\_\_ SCALE \_\_\_\_\_

02				
01	ESECUTIVO	BONCI	PAPI	ADRIANI
00	ESECUTIVO	BONCI	PAPI	ADRIANI
REV.				

NO. UNITA' DI MISURA / Unit of Measure m
