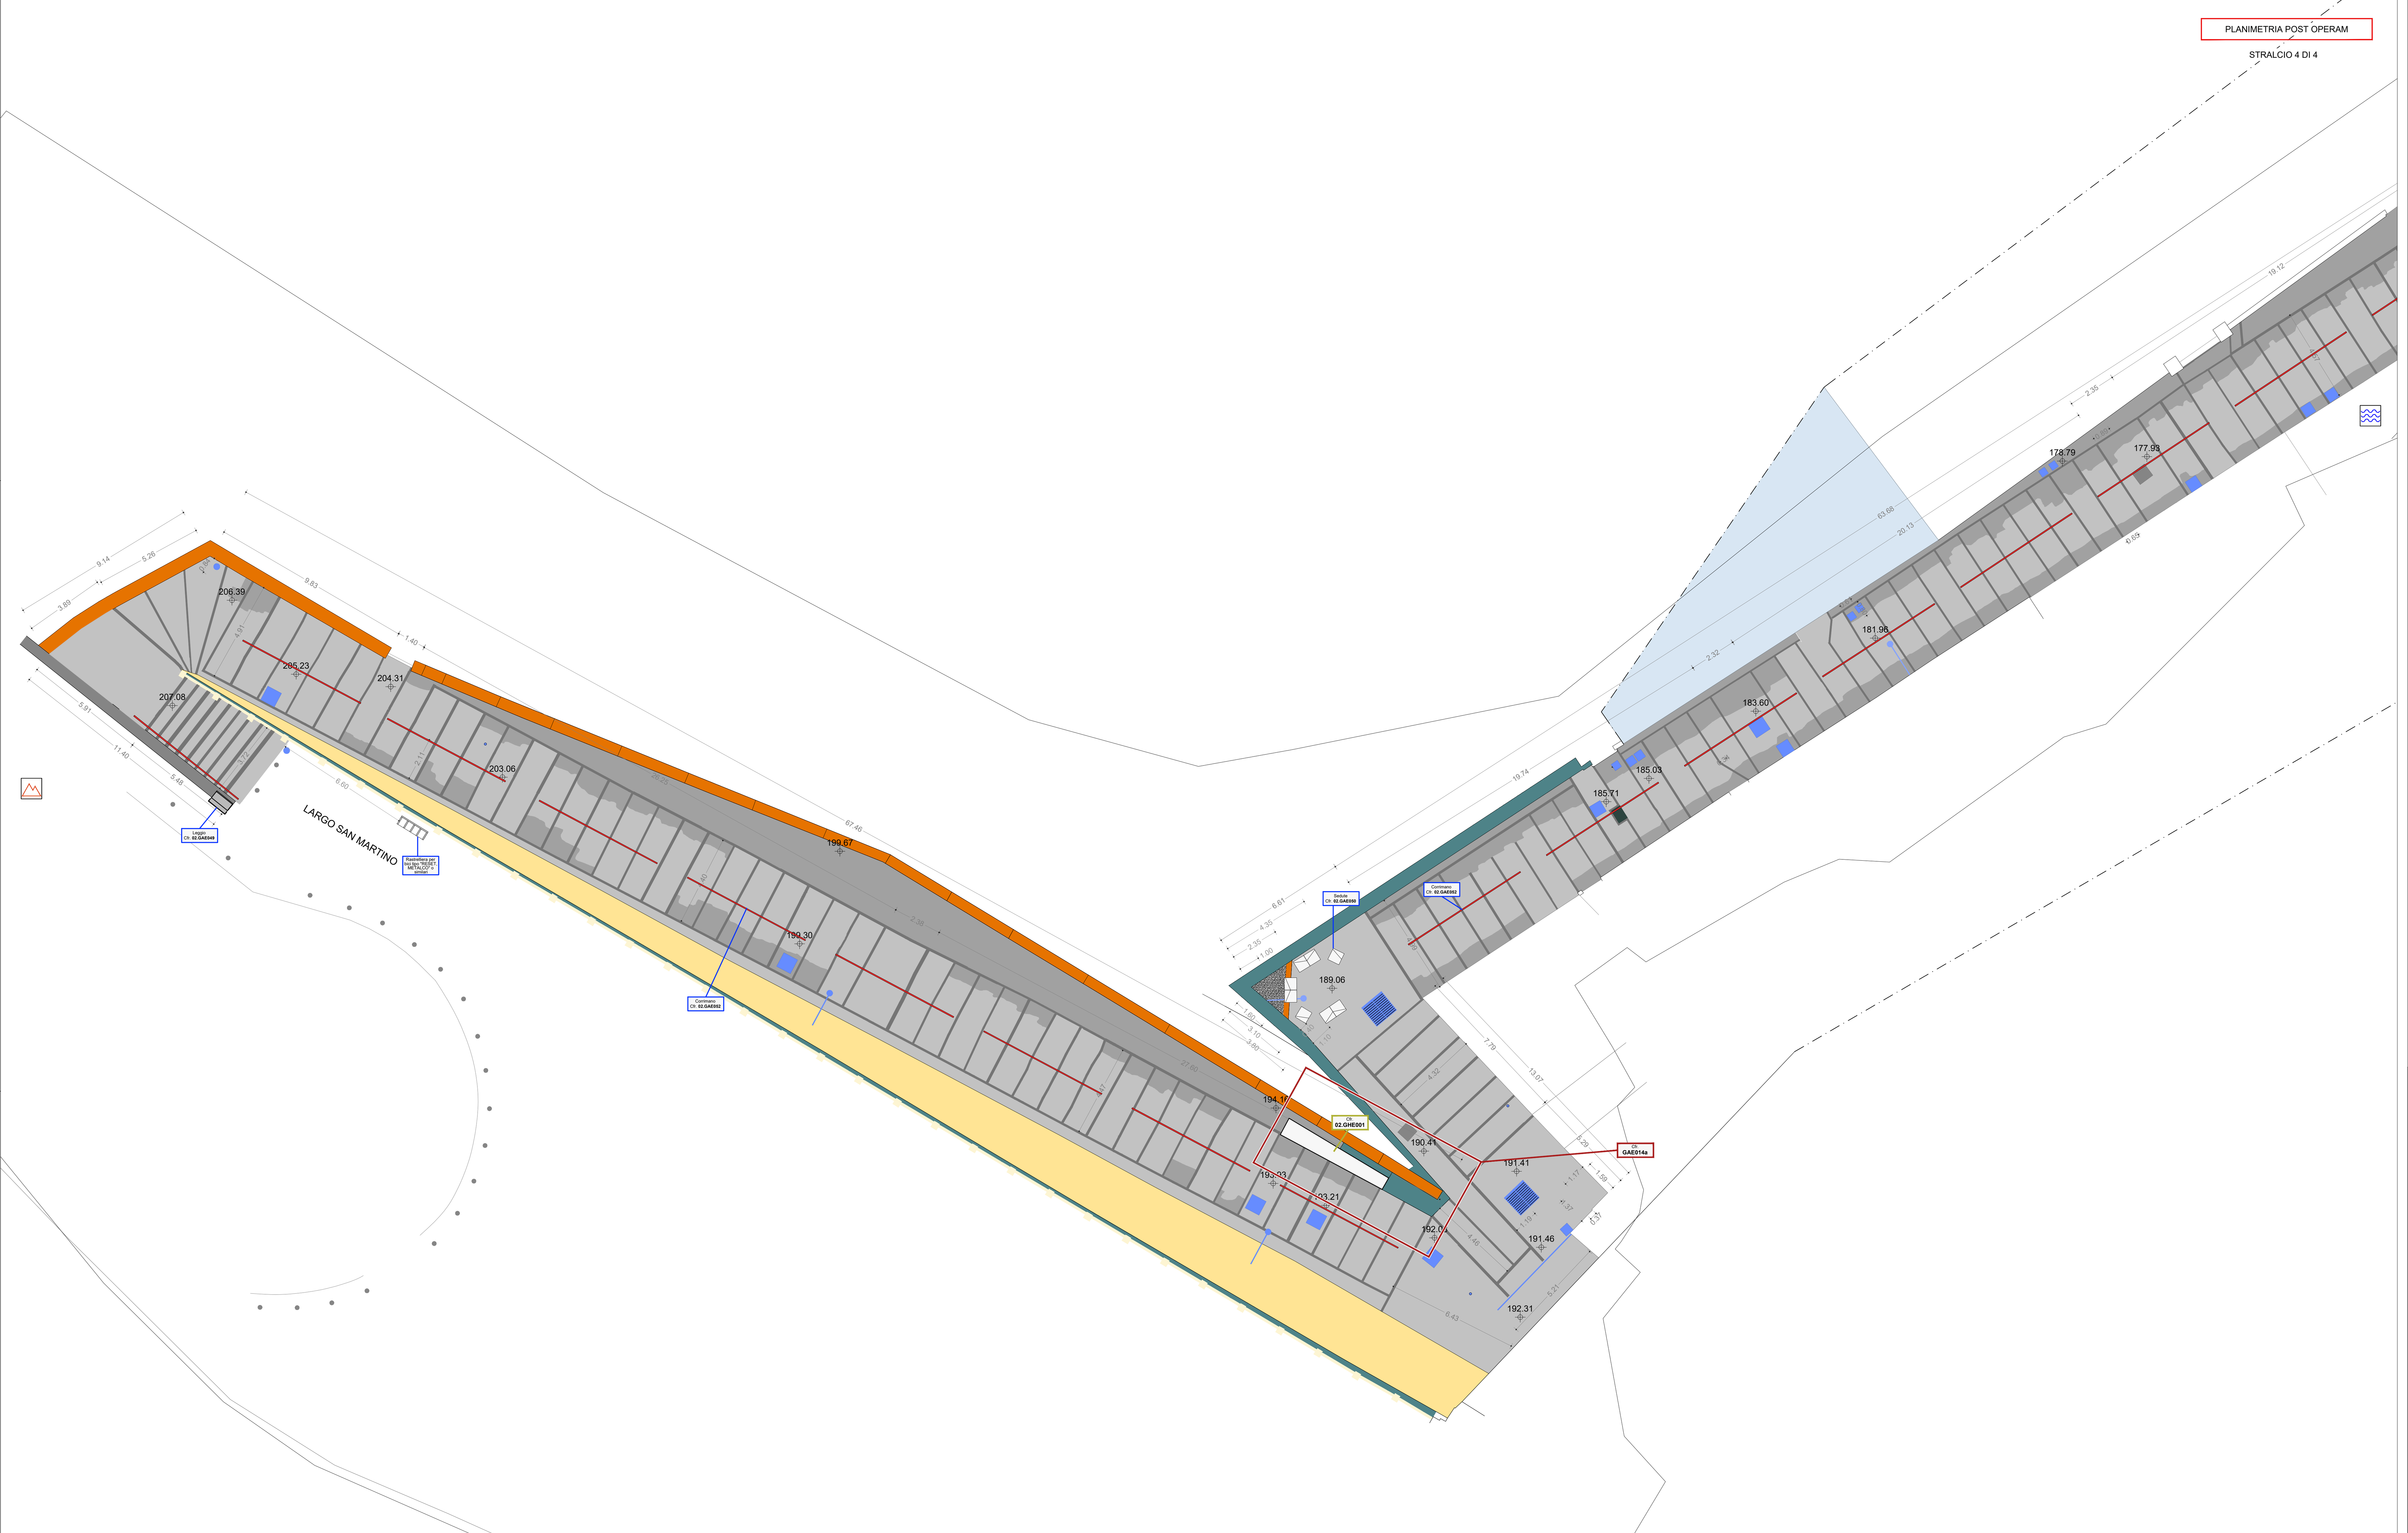

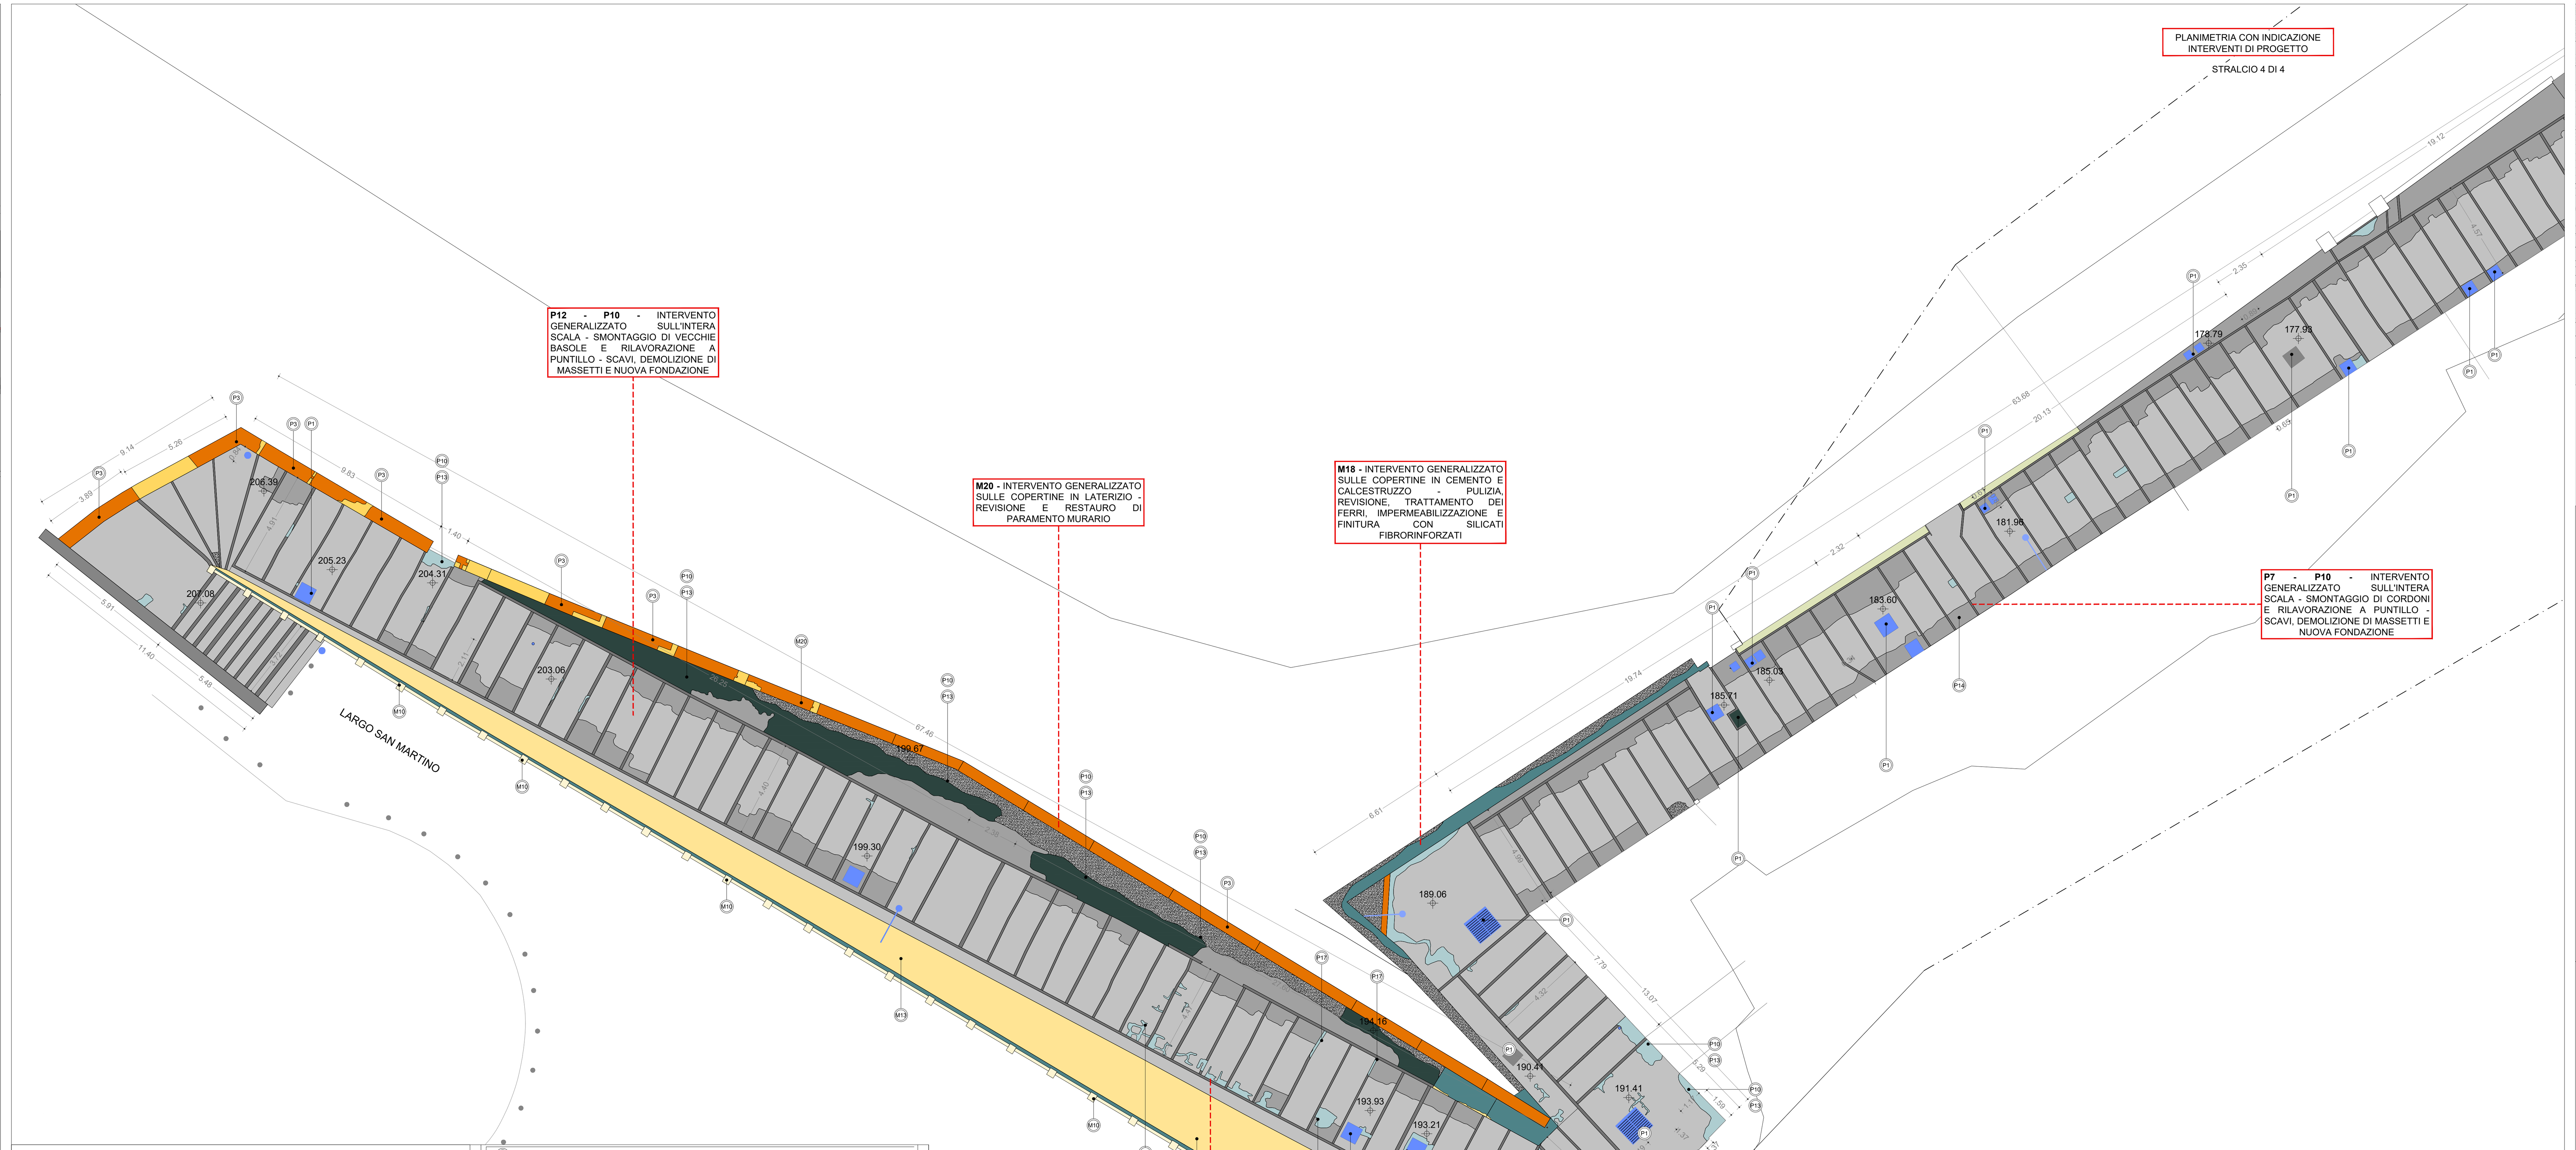

LEGENDA INTERVENTI

LAVORI STRADALI - PAVIMENTAZIONI

Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord. Tariffa
P1	Pulizia di pozzetti di ispezione	U.05.010.070.b
P2	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrice	R.02.015.040.a
P3	Rimozione di strati di scialbo e graffiti mediante idrosabbiatrice	AP_21
P4	Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro	U.05.010.052.a
P5	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso	U.05.010.020.a
P6	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di conglomerato cementizio	R.02.06.050.a
P7	Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietrarsa	A.11.010.450.a
P8	Demolizione di elementi di rampe e gradini in pietra vulcanica da sostituire	AP_05
P9	Rilavorazione a puntillo di vecchie basole eseguite in opera	U.05.060.075.a
P10	• Demolizione di massi, massetto in calcestruzzo • Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici • Scavo a sezione aperta eseguito a mano • Compattazione del piano di posa della fondazione stradale • Strato di fondazione in misto granulare • Posa in opera di malta di allettamento per pavimentazioni in pietra	R.02.060.022.b E.01.010.010.a E.01.020.010.a U.05.020.020.a U.05.020.080.a AP_01
P11	• Scavo a sezione obbligata • Rinfianco con sabbia e sabbiarella nell'adeguata granulometria	E.01.020.020.a U.04.010.010.b
P12	• Rimozione di vecchie basole, ripresa a scalpello sulla faccia e negli assetti	U.05.060.065.a
P13	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti	U.05.060.060.c
P14	Disinfezione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi lungo i margini stradali	AP_25
P15	Operazioni di rimozione di stuccature o sostanze inidonee applicate a precedenti interventi	AP_22
P16	Basamento di sostegno per pali di illuminazione pubblica per altezza f.t. fino a 7600 mm.	AP_30
P17	Nuovi cordoni in pietrarsa	U.05.030.030.d

PARAMENTI MURARI

Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord. Tariffa
MI1	Esecuzione di prelievo di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio	AP_33
MI2	Tassello stratigrafico eseguito da un restauratore specializzato	A.00.010.104.a
M1	Spicconatura accurata di intonaci degradati e non compatibili con il supporto	R.02.040.010.a.CAM
M2	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione	AP_28
M3	Rimozione meccanica di stuccature inidonee	AP_31
M4	Disinfezione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi	AP_25
M5	Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro	U.05.010.052.a
M6	Rimozione di eventuali chiodi, zanche, staffe ed elementi metallici senza qualità, adottando ogni accorgimento necessario a salvaguardare l'integrità dei conci	AP_23
M7	Operazioni di rimozione di stuccature o sostanze inidonee applicate a precedenti interventi	AP_22
M8	Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne	A.11.010.015.b
M9	Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina	AP_29
M10	Rimozione dei graffiti e di sostanze sovrammesse di varia natura, applicazione per mezzo di supportanti	AP_20
M11	INTERVENTO LOCALIZZATO **Consolidamento murature:** Ripresa di murature con mattoni di tufo Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura Tiranti di ancoraggio Iniezioni di miscele cementizie per tiranti Ricostruzione di muratura antica per una profondità di 50 cm Protezione delle creste murarie mediante la formazione di bauletto con pezzame lapideo e malta idraulica	R.05.030.010.a E.02.060.040.a E.02.060.080.c E.02.060.070.c A.06.020.130.a AP_26
M12	Consolidamento dei giunti: rimozione delle malte decoese, eliminazione dei residui e polvere mediante leggero idrolavaggio, ricostruzione della malta nei giunti con malta di calce idraulica, sabbia e pozzolana, stilatura dei giunti	A.06.020.190.a
M13	Ripresa di muratura mediante sostituzione parziale di materiale con metodo scuci-cuci	R.03.030.010.a
M14	Revisione e restauro di paramento murario: scarnitura delle vecchie malte ammalorate, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione o integrazione dei blocchi non recuperabili, stuccatura delle connessure con malta idraulica e inerti appropriati alla malta originaria, spazzolatura finale	AP_02
M15	Stesura di scialbo pigmentato o idrossido di calcio (acqua di calce) applicata a pennello	AP_24
M16	Regolarizzazione di superfici da intonacare Intonaco grezzo rustico a malta grossa composta da grassello di calce e polvere di tufo	R.03.060.030.a.CAM AP_03
M17	Restauro delle superfici in tufo: • Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina	AP_29
M18	Risanamento delle copertine in calcestruzzo: • pulitura superficiale del calcestruzzo mediante sabbiatura e/o spazzolatura • trattamento dei ferri di armatura con prodotto passivante • regolarizzazione delle superfici • impermeabilizzazione eseguita con malta bicomponente elastica • finitura in opera di rivestimento ai silicati fibrorinforzati	R.05.040.040.a R.05.040.050.a R.05.060.030.a.CAM E.12.060.035.b E.21.030.050.b
M19	A - Realizzazione di nuove copertine in pezzame di tufo B - Strato di copertura in battuto di cocciopesto	AP_26 AP_27
M20	Risanamento delle copertine in laterizio in mattoni pieni	R.03.030.030.c
M21	Revisione e restauro copertine in tufo	-
M22	Nuove inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate	E.19.010.070.c.CAM

ARREDO

Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord. Tariffa
A1	Simbolo per Green Line	E.19.010.040.a AP_06
A2	Seduta	E.19.010.040.a/ AP_15
A3	Totem	E.19.010.040.a/ AP_08/AP_09/AP_10
A4	Fioriere	E.19.010.040.a/ AP_43/AP_47/AP_48/V.02.020.095.b.CAM/V.02.020.095.a.CAM/AP_48
A5	Pensiline	E.19.010.040.a/ AP_11/AP_12
A6	Leggio	E.19.010.040.a/ AP_39
A7	Corrimano	E.19.010.040.a/ AP_35

DE DEMOLIZIONI

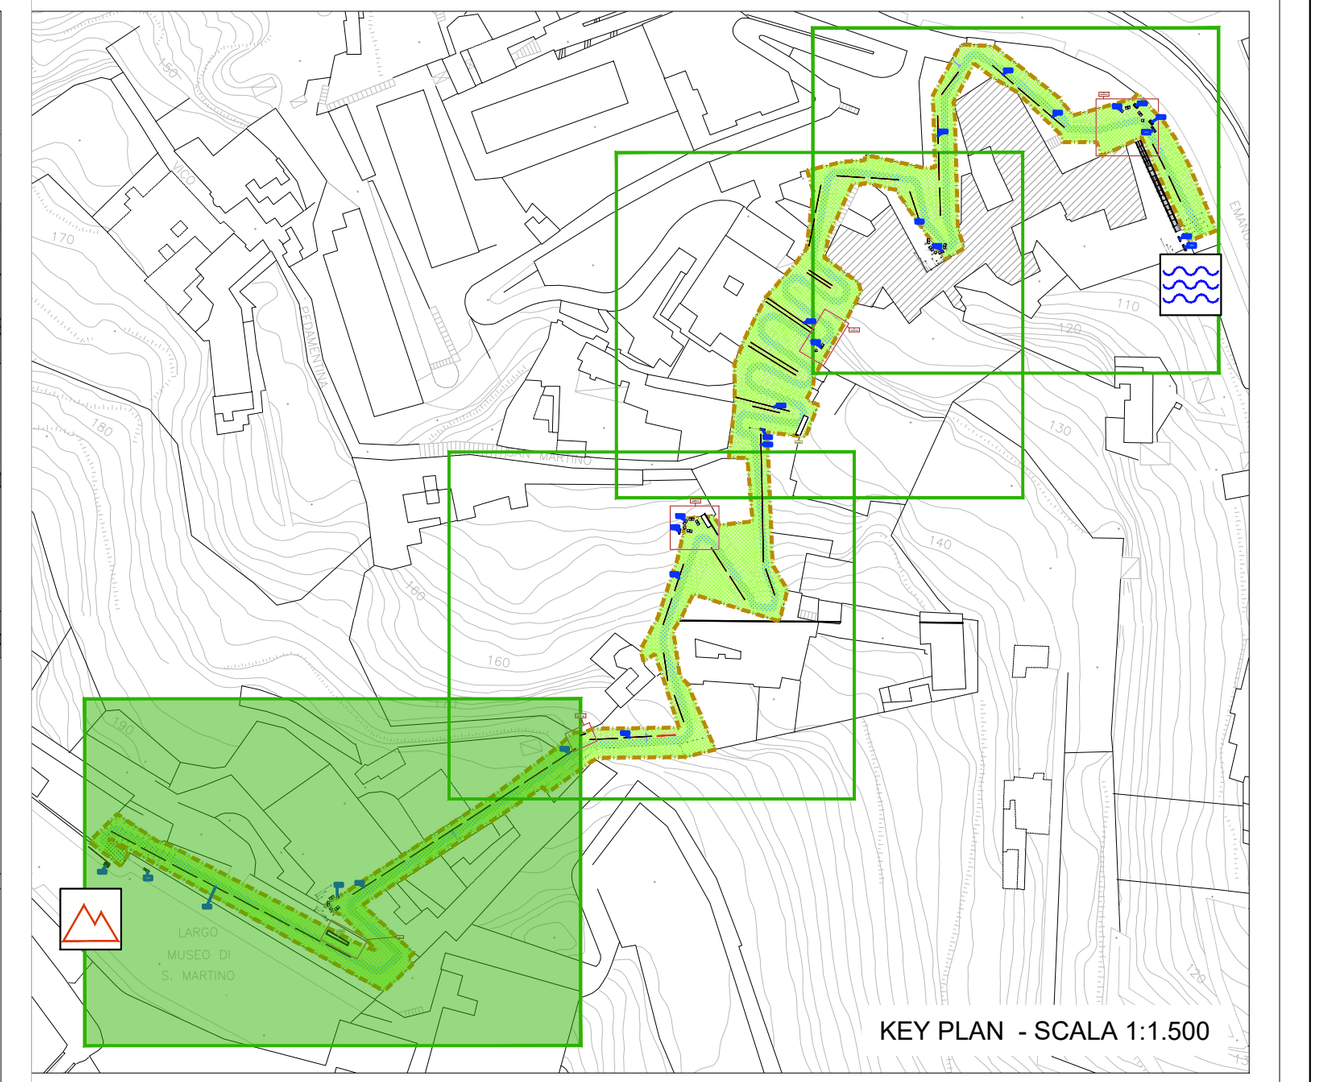



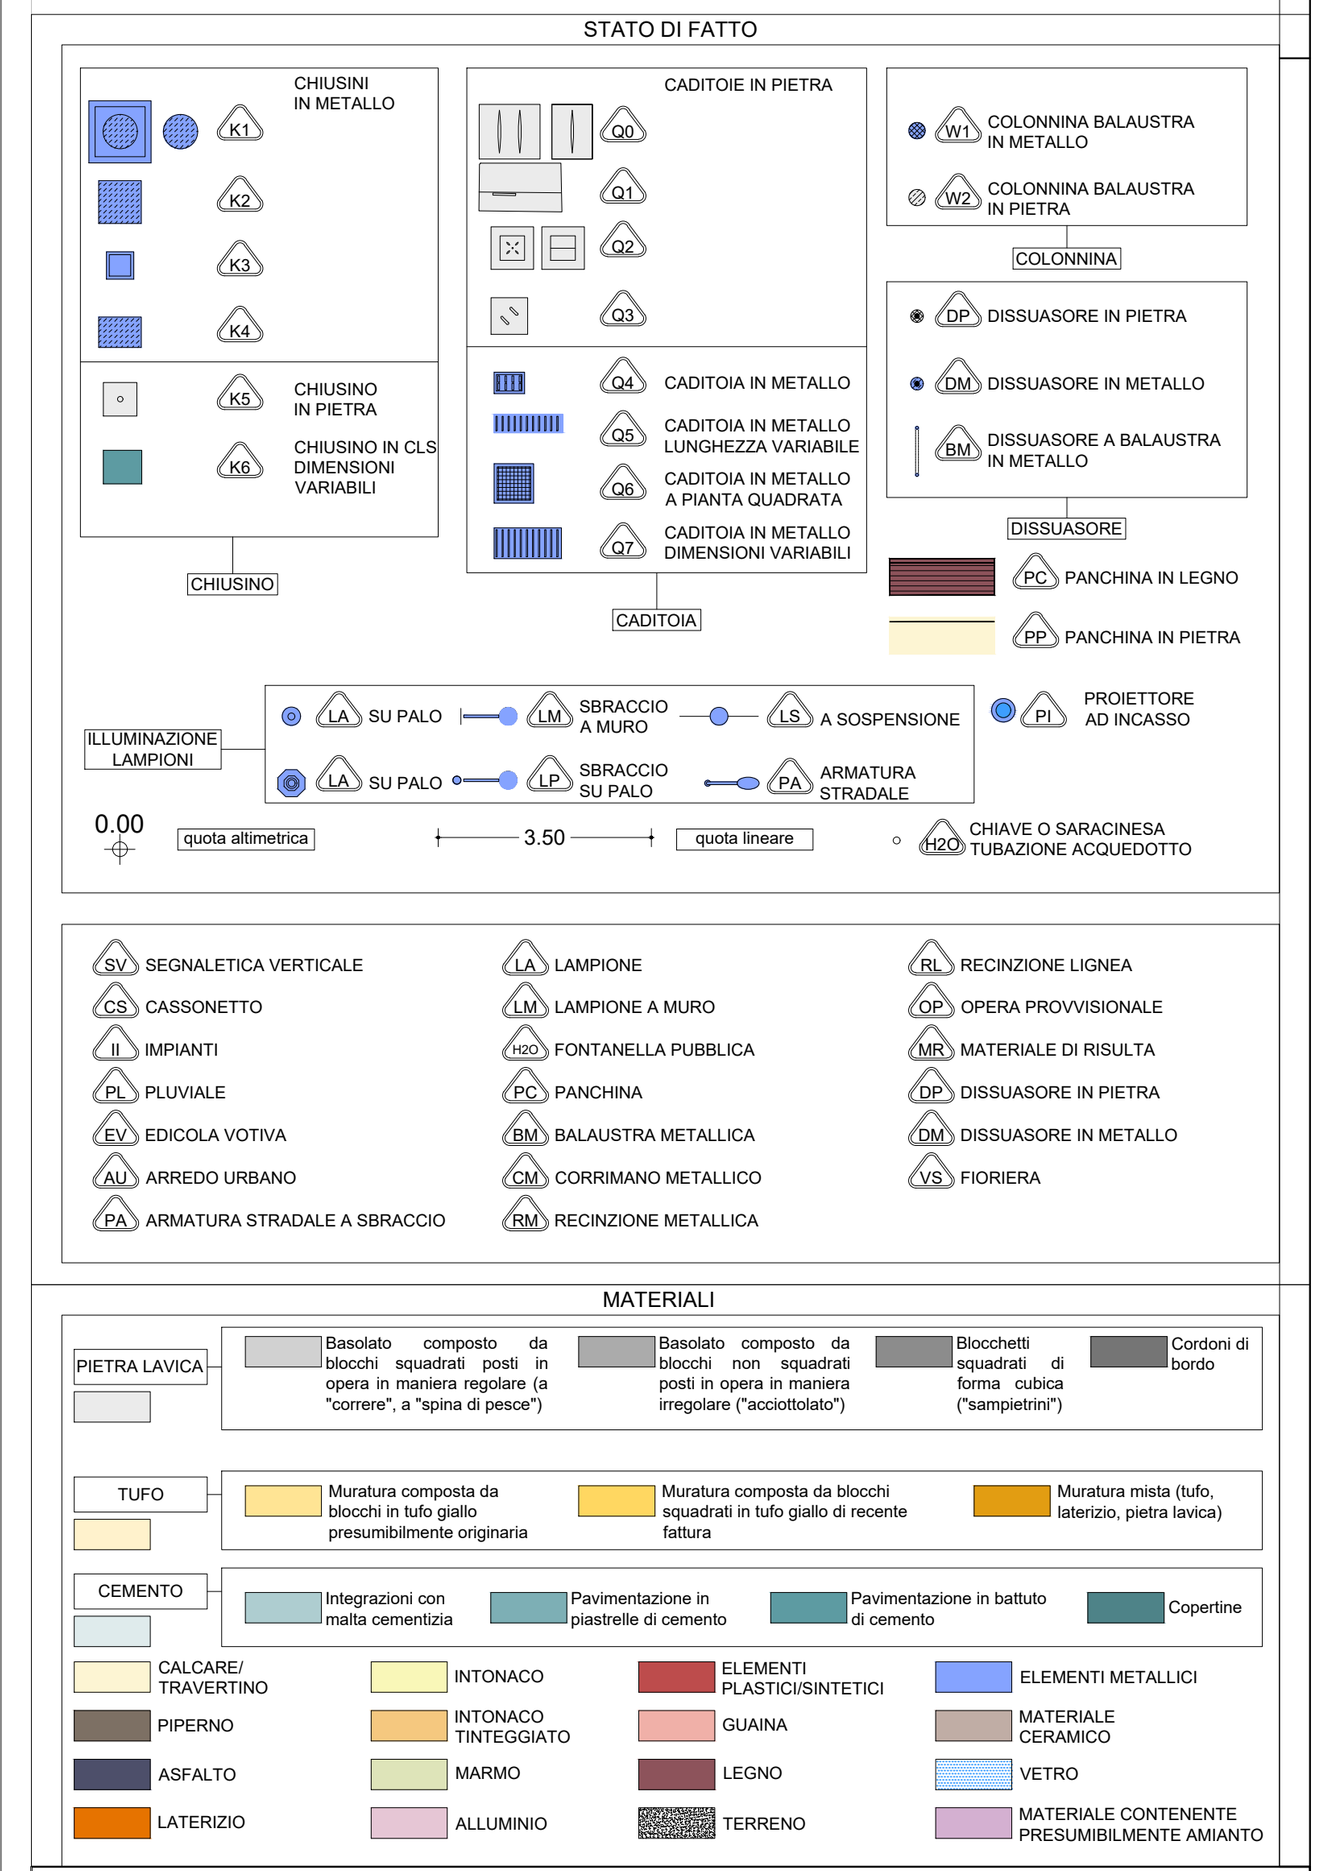

COMMITTENTE

COMUNE DI NAPOLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Francesca Spera

PROGETTO ESECUTIVO / PEDAMENTINA

CITTÀ VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA – Sezione A N° A1703 – DOTTORE INGEGNERE MARCO ADRIANI
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI – ARCHITETTO PIERPAOLO PAPI – 6554
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA – Sezione A N° A2085 – DOTTORE INGEGNERE VINCENZO PUJIA

MANDATARIA:
sab gruppo esc
Via Pievaiola, 15
06128 Perugia
info@sabeng.it www.sabsrl.eu

Arch. Pierpaolo Papi
Arch. Francesco Pecorari
Arch. Sergio Tucci
Arch. Francesco Fucelli
Arch. Luca Persichini

Ing. Marco Adriani
Ing. Vincenzo Pujia
Ing. Catiuscia Maiggi
Ing. Barbara Bottausci

MANDANTI:
B5 S.r.l.
Via Sant'Anna dei Lombardi, 16
80134 - Napoli - info@b5srl.it

Arch. Francesca Brancaccio Ph.D
(Amministratore Unico e Direttore Tecnico)
Ing. Ugo Brancaccio
(Direttore tecnico)

Studio Ing. Alberto Capitanucci
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA – Sezione A N° A949 – DOTTORE INGEGNERE ALBERTO CAPITANUCCI

ELABORATO
Architettura - Progetto
Scala Pedamentina
Stralcio planimetrico 4 di 4

N° ELAB. / NO. DOC.	COD. COMM. / CODE ORDER	SCALA / SCALE
GAE014/00	CNAP.001-01-02.20.ESE	1:100

REV.	EMESSO PER / ISSUED TO	RED. / COMP.	CONTR. / CHK'D	APPR. / APPR'D	DATA / DATE
03					
02					
01					
00	ESECUTIVO	PECORARI	PAPI	ADRIANI	GIUGNO 2021

NOME FILE / File name CNAP.001GAE01100-1400.dwg
UNITA' DI MISURA / Unit of Measure m
