Comune di Napoli

Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica relativa all'intervento di "Estensione della rete ciclabile cittadina: ambito Nord-Occidentale"

Cronoprogramma

ID	Task Mode	Task Name	Duration
1		**REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE**	**196 days**
2		PROGETTO DEFINITIVO + PROGETTO ESECUTIVO 40 GG	0 days
3		**ALLESTIMENTO CAMPO BASE**	**6 days**
4		allestimento cantiere base e aree di stoccaggio	6 days
5		**PIAZZALE TECCHIO**	**18 days**
6		Scarifica pavimentazione (usura, binder, base)	3 days
7		Impianto semaforico	6 days
8		abbattimento barriere architettoniche	3 days
9		Usura in conglomerato bituminoso colorato per piste ciclabili	3 days
10		Colorazione pista ciclabile	2 days
11		Segnaletica orizzontale	2 days
12		Segnaletica verticale	3 days
13		Rastrelliera parcheggio bici (150 posti)	1 day
14		**VIALE GIULIO CESARE**	**21 days**
15		Scarifica pavimentazione (usura, binder, base)	5 days
16		Impianto semaforico	5 days
17		abbattimento barriere architettoniche	5 days
18		Cordoli pista ciclabile	3 days
19		Realizzazione nuova pavimentazione	3 days
20		Segnaletica orizzontale	2 days
21		Segnaletica verticale	3 days
22		**PIAZZA ITALIA**	**14 days**
23		Demolizione pavimentazione esistente in cubetti di pietra e rimozione dissuasori	3 days
24		Realizzazione sottofondo nuova pavimentazione	4 days
25		Realizzazione nuova pavimentazione	6 days
26		Cordoli pista ciclabile	3 days
27		Segnaletica orizzontale	2 days
28		Segnaletica verticale	2 days
29		**VIALE TRAIANO**	**39 days**
30		Scarifica pavimentazione (usura, binder, base)	8 days
31		Abbattimento barriere architettoniche	5 days
32		Impianto semaforico per bici	5 days
33		Rimozione cordolo spartitraffico	7 days
34		Rifacimento cordoli dissestati	14 days
35		Cordoli pista ciclabile	7 days
36		Rifacimento zanelle dissestate	17 days
37		Realizzazione nuova pavimentazione	8 days
38		Pavimentazione marciapiedi (binder + usura in asfalto colato)	8 days
39		Segnaletica orizzontale	2 days
40		Segnaletica verticale	3 days
41		Nuova vegetazione	6 days
42		**VIA ANTONINO PIO**	**34 days**
43		Scarifica pavimentazione (usura, binder, base)	7 days
44		Abbattimento barriere architettoniche	5 days
45		Impianto semaforico per bici	5 days
46		Rifacimento cordoli dissestati	17 days
47		Cordoli pista ciclabile in sede propria	7 days
48		Rifacimento zanelle dissestate	17 days
49		Realizzazione nuova pavimentazione	8 days
50		Pavimentazione marciapiedi (binder + usura in asfalto colato)	8 days
51		Segnaletica orizzontale	2 days
52		Segnaletica verticale	3 days
53		Rastrelliera per bici	1 day
54		**VIA ADRIANO**	**33 days**
55		Scarifica pavimentazione (usura, binder, base)	7 days
56		Impianto semaforico per bici	5 days
57		Rifacimento cordoli dissestati	14 days
58		Cordoli pista ciclabile	7 days
59		Rifacimento zanelle dissestate	17 days
60		Realizzazione nuova pavimentazione	8 days
61		Pavimentazione marciapiedi (binder + usura in asfalto colato)	8 days
62		Segnaletica orizzontale	2 days
63		Segnaletica verticale	3 days
64		**VIA SERVIO TULLIO**	**30 days**
65		Scarifica pavimentazione (usura, binder, base)	7 days
66		Impianto semaforico per bici	5 days
67		Rifacimento cordoli dissestati	14 days
68		Cordoli pista ciclabile in sede propria	7 days
69		Rifacimento zanelle dissestate	14 days
70		Realizzazione nuova pavimentazione	7 days
71		Pavimentazione marciapiedi (binder + usura in asfalto colato)	7 days
72		Segnaletica orizzontale	2 days
73		Segnaletica verticale	3 days
74		Rastrelliera per parcheggio bici	1 day
75		**VIA MARIO GIGANTE**	**17 days**
76		Scarifica pavimentazione (usura, binder, base)	3 days
77		Rifacimento cordoli dissestati	8 days
78		Rifacimento zanelle dissestate	8 days
79		Abbattimento barriere architettoniche	5 days
80		Usura in conglomerato bituminoso colorato per piste ciclabili	3 days
81		Segnaletica orizzontale	2 days
82		Segnaletica verticale	3 days
83		**VIA TERRACINA**	**11 days**
84		Scarifica pavimentazione (usura, binder, base)	3 days
85		Abbattimento barriere architettoniche	5 days
86		Usura in conglomerato bituminoso colorato per piste ciclabili	3 days
87		Segnaletica orizzontale	2 days
88		Segnaletica verticale	3 days
89		**VIA CASSIODORO**	**36 days**
90		Scarifica pavimentazione (usura, binder, base)	7 days
91		Usura in conglomerato bituminoso colorato per piste ciclabili	5 days
92		Impianto semaforico per bici	5 days
93		Rimozione cordolo spartitraffico	7 days
94		Rifacimento cordoli dissestati	16 days
95		Cordoli pista ciclabile	7 days
96		Rifacimento zanelle dissestate	17 days
97		Realizzazione nuova pavimentazione	9 days
98		Pavimentazione marciapiedi (binder + usura in asfalto colato)	9 days
99		Segnaletica orizzontale	2 days
100		Segnaletica verticale	3 days
101		**VIA CLAUDIO**	**15 days**
102		Scarifica pavimentazione (usura, binder, base)	3 days
103		Cordoli pista ciclabile	6 days
104		Usura in conglomerato bituminoso colorato per piste ciclabili	3 days
105		Segnaletica orizzontale	2 days
106		Segnaletica verticale	3 days
107		**VIALE J.F.KENNEDY**	**20 days**
108		Scarifica pavimentazione (usura, binder, base)	3 days
109		Impianto semaforico	7 days
110		abbattimento barriere architettoniche	7 days
111		Cordoli pista ciclabile	3 days
112		Usura in conglomerato bituminoso colorato per piste ciclabili	4 days
113		Segnaletica orizzontale	2 days
114		Segnaletica verticale	3 days
115		**VIA DIOCLEZIANO**	**11 days**
116		Impianto semaforico	5 days
117		abbattimento barriere architettoniche	6 days
118		Segnaletica orizzontale e ripristini	2 days
119		Segnaletica verticale	3 days

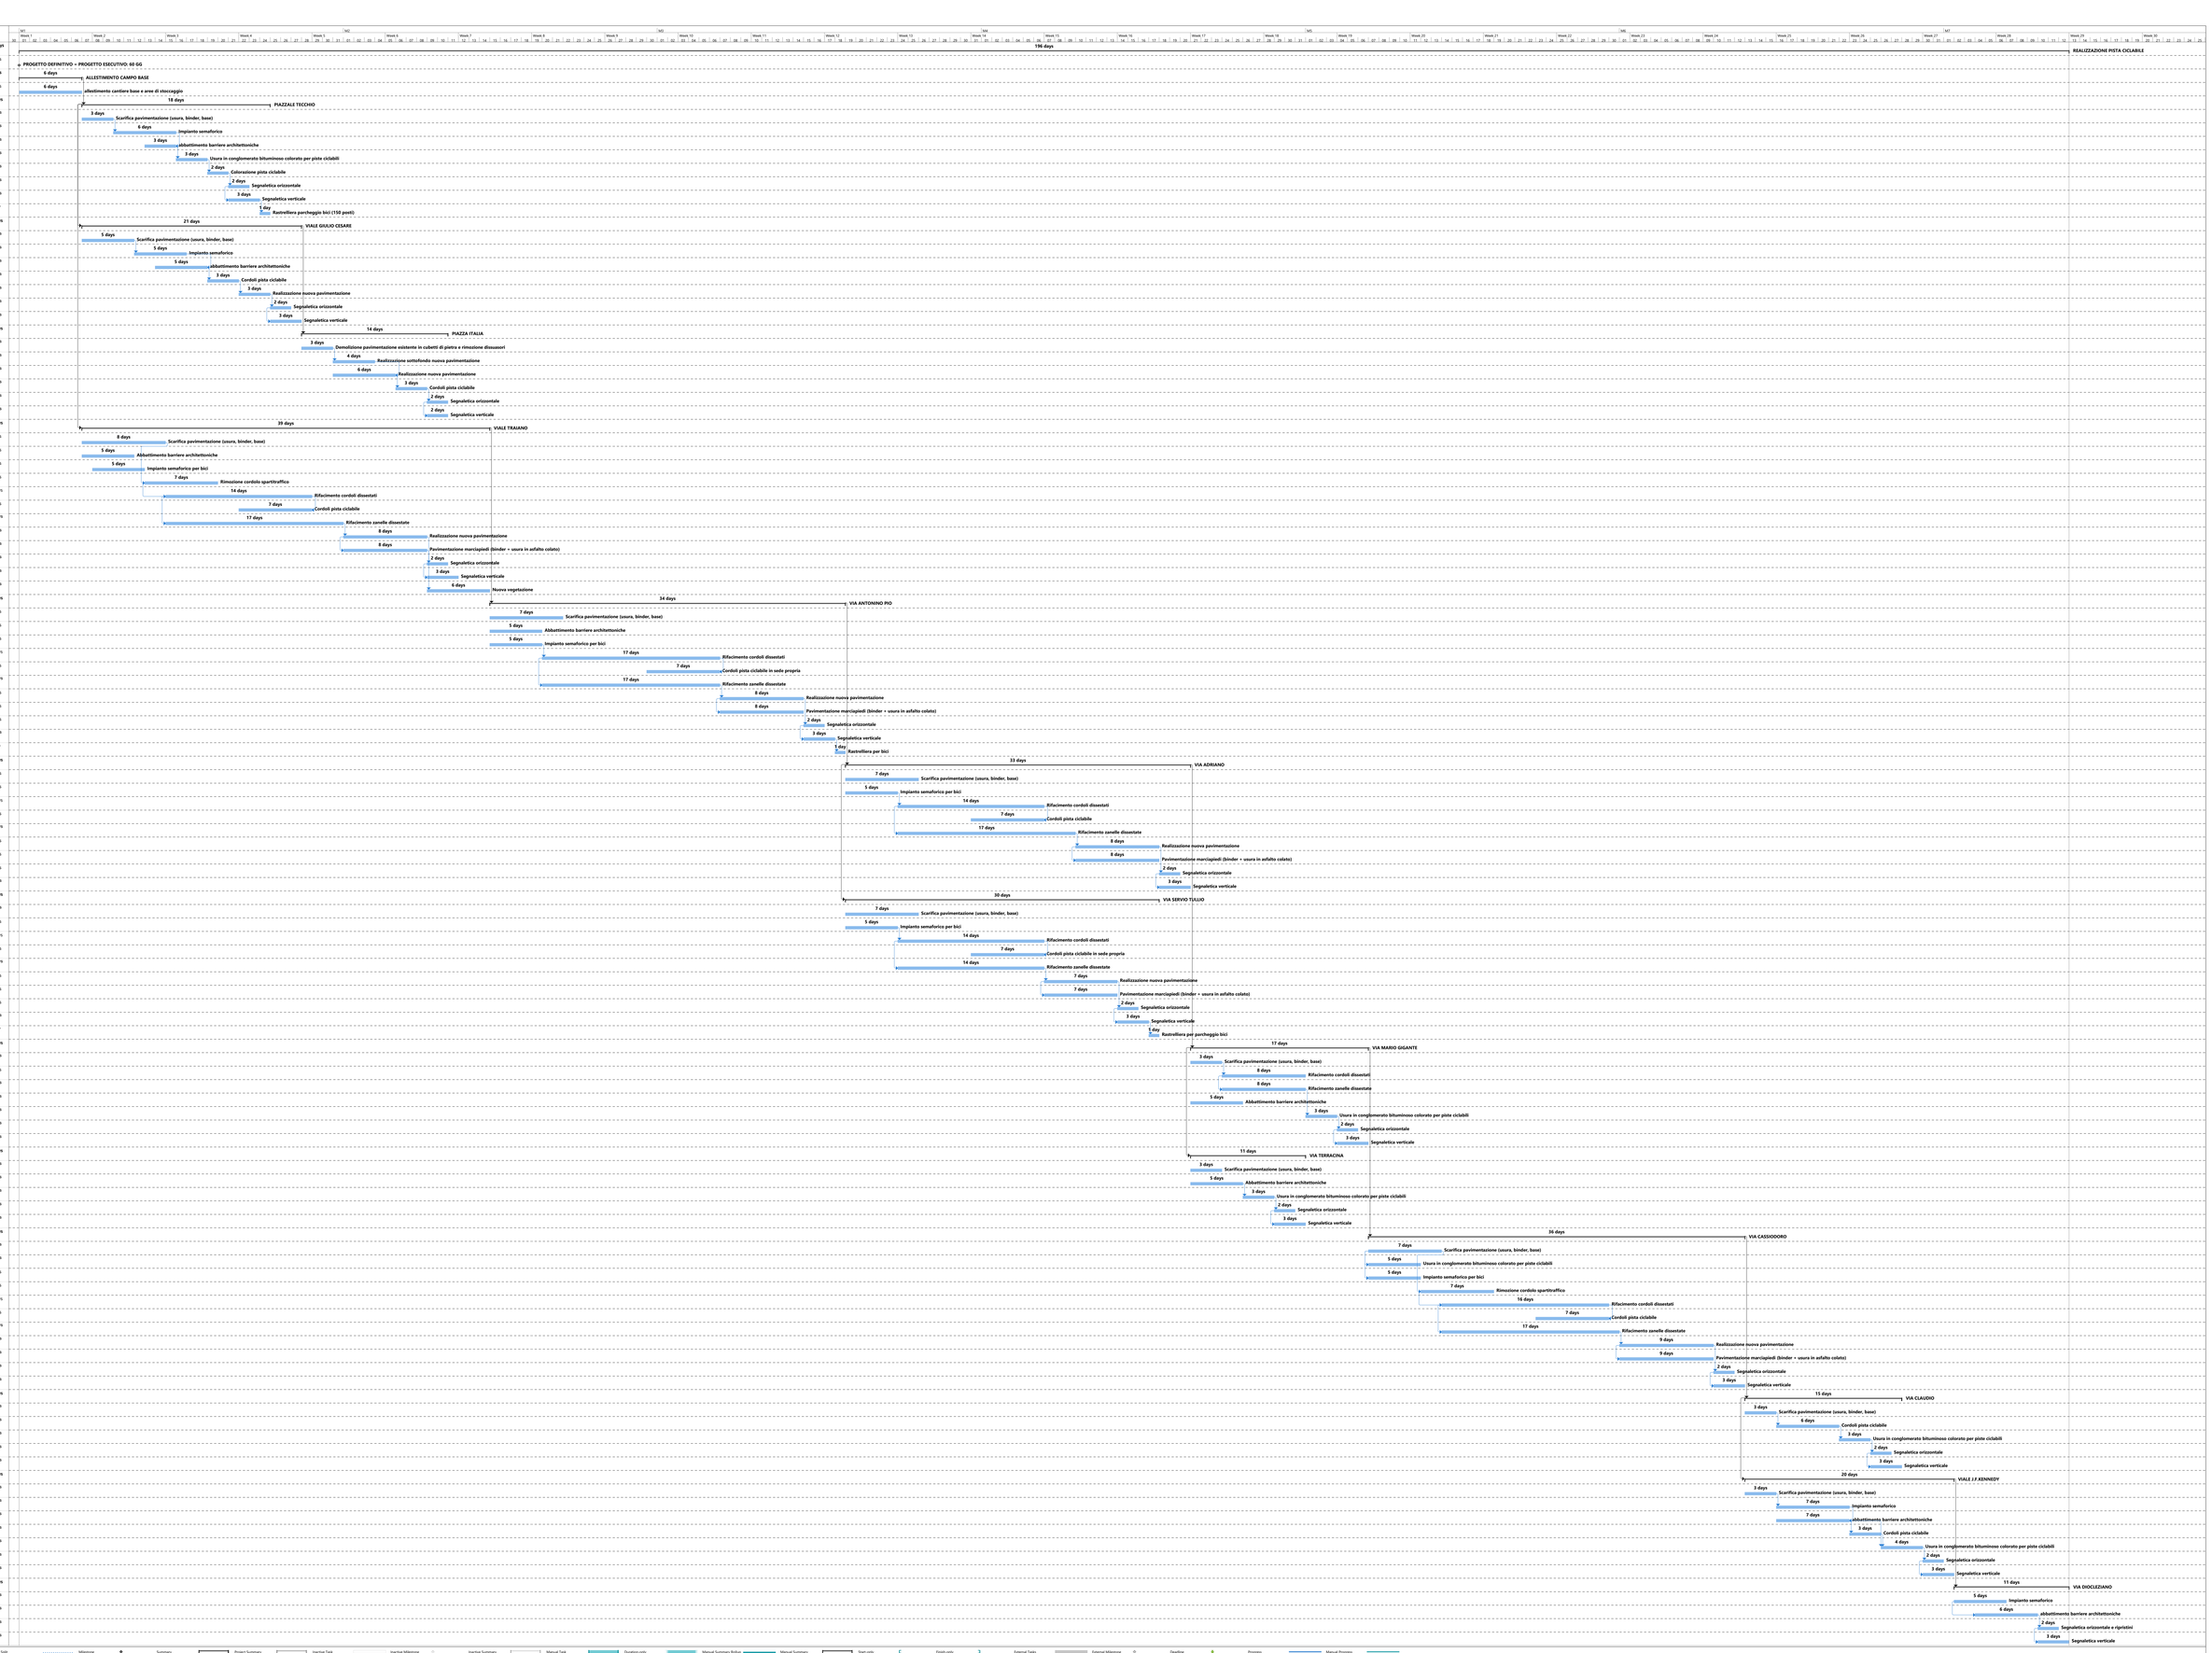

Project: cronoapoli ciclabile
Date: 27/04/23

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone | Deadline | Progress | Manual Progress
